

CONCESIÓN ALTO MAGDALENA S.A.S



**CONTRATO DE CONCESIÓN BAJO ESQUEMA DE APP N°. 003 DE 2014.
PROYECTO GIRARDOT – HONDA – PUERTO SALGAR**

MEMORIA TÉCNICA

JUNIO 2021

TABLA DE CONTENIDO

	Pág.
INTRODUCCION	9
OBJETIVO.....	10
1 CUADRO DE RELACION DE OBRAS EJECUTADAS.....	11
<u>1.1 OBRAS EJECUTADAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO.....</u>	<u>11</u>
1.1.1 UNIDAD FUNCIONAL NO 1 (VARIANTE FLANDES - GIRARDOT).....	11
1.1.2 UNIDAD FUNCIONAL NO 2 (GIRARDOT – GUATAQUÍ).....	15
1.1.3 UNIDAD FUNCIONAL NO. 3 (GUATAQUÍ- CAMBAO).....	21
1.1.4 UNIDAD FUNCIONAL NO 4 (CAMBAO-PTO BOGOTÁ).....	27
1.1.5 UNIDAD FUNCIONAL NO 5 (HONDA - DORADA).....	32
1.1.6 CUADRO DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES:.....	39
<u>1.2 OBRAS EJECUTADAS FASE DE CONSTRUCCION</u>	<u>39</u>
<u>1.3 CONTROL DE CALIDAD</u>	<u>39</u>
2 INFORMES TECNICOS	40
<u>2.1 TRASLADO DE REDES.....</u>	<u>40</u>
2.1.1 REDES ELECTRICAS	40
2.1.2 REDES HUMEDAS	40
2.1.3 REDES DE HIDROCARBUROS	41
2.1.4 REDES DE FIBRA OPTICA.....	42
2.1.5 AVANCE TRASLADO REDES ELÉCTRICAS EN JUNIO 2021	43
2.1.6 AVANCE TRASLADO REDES HÚMEDAS EN Junio 2021	45
2.1.7 TRASLADO REDES ELÉCTRICAS PENDIENTES POR EJECUTAR.....	45
2.1.8 TRASLADO REDES húmedas PENDIENTES POR EJECUTAR	45
2.1.9 REDES POR TRAMOS A INTERVENIR POR UNIDAD FUNCIONAL.....	45
2.1.10 ACTAS DE OBRA EJECUTADA.....	52
<u>2.2 MANEJO Y GESTION AMBIENTAL</u>	<u>53</u>
2.2.1 LICENCIAS AMBIENTALES	53
2.2.2 CAMBIOS MENORES	55
2.2.3 PERMISOS DE APROVECHAMIENTO FORESTAL	58
2.2.4 LEVANTAMIENTO DE VEDAS.....	61
2.2.5 PAGAS	62
2.2.6 PERMISOS DE OCUPACION DE CAUCES	62

2.2.7	ARQUEOLOGIA.....	63
2.2.8	CRUCE AEREO SOBRE EL RIO MAGDALENA.....	64
2.2.9	SUSTRACCIÓN DMI LAGUNA DE COCO Y CUCHILLA DE SAN ANTONIO	65
2.2.10	ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS	65
2.2.11	CAPACITACIONES Y/O CHARLAS	65
2.2.12	PROVEEDORES.....	66
2.2.13	APROVECHAMIENTO FORESTAL.....	67
2.2.14	Compensaciones AMBIENTALES	72
2.2.15	rehabilitacion ecologica.....	79
2.2.16	SUBCUENTA COMPENSACIONES AMBIENTALES	82
2.2.17	TRÁMITES ESPECIALES.....	82
2.2.18	RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA DEL ÁREA AMBIENTAL	86
2.2.19	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO – PAGA O&m.....	93
2.3	GESTION SOCIAL	104
2.3.1	PROGRAMA DE ATENCION AL USUARIO.....	104
2.3.2	PUNTOS DE ATENCION AL USUARIO.....	105
2.3.3	ATENCION A QUEJAS Y RECLAMOS (PQRS)	105
2.3.4	OFICINAS MOVILES DE ATENCIÓN AL USUARIO	106
2.3.5	CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA.....	106
2.3.6	CORREO ELECTRÓNICO, PAGINA WEB Y CALL CENTER	107
2.3.7	PROGRAMA DE EDUCACION Y CAPACITACION AL PERSONAL VINCULADO AL PROYECTO	108
2.3.8	PROGRAMA DE VINCULACION DE MANO DE OBRA	108
2.3.9	CONTRATACION DE PERSONAL.....	109
2.3.10	RECEPCION DE HOJAS DE VIDA	110
2.3.11	REUNIONES DE SOCIALIZACION	111
2.3.12	PROGRAMA DE INFORMACION Y PARTICIPACION COMUNITARIA.....	116
2.3.13	PROGRAMA DE APOYO A LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL.....	132
2.3.14	PROGRAMA DE CAPACITACION, EDUCACION Y CONCIENTIZACION DE LA COMUNIDAD	139
2.3.15	PROGRAMA DE CULTURA VIAL	139
2.3.16	PROGRAMA DE ARQUEOLOGIA PREVENTIVA.....	141
2.3.17	PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIOPREDIAL	147
2.3.18	Plan de COMPENSACIONES SOCIO ECONÓMICAS	153
2.3.19	FICHAS APROBADAS POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.....	155
2.3.20	INFORME DE APLICACIÓN DE COMPENSACIONES SOCIOECONÓMICAS	155
2.3.21	ACTAS DE VECINDAD.....	157
2.4	AVANCE GESTIÓN PREDIAL	158
2.4.1	AVANCE INSUMOS PEDIALES	159
2.4.2	AVANCE AVALÚOS COMERCIALES CORPORATIVOS.....	165
2.4.3	INFORME AVANCE DE GESTIÓN (eer) DEL PROYECTO	169
2.4.4	PREDIOS EN PROCESO DE ADQUISICIÓN	176
2.4.5	PREDIOS DISPONIBLES CON PERMISOS DE INTERVENCIÓN VOLUNTARIA Y ADQUISICIÓN PREDIAL	177
2.4.6	DISPONIBILIDAD PARA CONSTRUCCIÓN	177
2.4.7	PREDIOS EN EXPROPIACIÓN JUDICIAL O ADMINISTRATIVA.	178
2.4.8	GESTION DEL COMPONENTE SOCIAL	196

2.4.9	CARGUE DE INFORMACIÓN A LA PLATAFORMA OLYMPUS	197
2.4.10	CONSUMO PRESUPUESTAL SUBCUENTA	199
2.4.11	Saldo y rendimientos de la subcuenta predial:	204
2.4.12	PREDIOS pagos en su totalidad CERTIFICADOS POR FIDUCIA:	205
2.4.13	VALOR ESTIMADO DE ADQUISICIÓN PREDIAL	205
2.5	GESTIÓN DE SEGURIDAD SST.....	207
2.5.1	LISTADO DE PERSONAL	207
2.5.2	REVISIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL	207
2.5.3	INDUCCIONES	207
2.5.4	EXAMENES MÉDICOS	208
2.5.5	CHARLAS SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	208
2.5.6	CAPACITACIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	216
2.5.7	INDICADORES DE SST	217
2.5.8	ESTADÍSTICAS DE ACCIDENTALIDAD LABORAL	221
2.5.9	ENTREGA DE DOTACIÓN, EPP Y ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	223
2.5.10	MEDIDAS ADELANTADAS POR EL CONCESIONARIO PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID 19.....	224
2.5.11	INSPECCIONES DE ELEMENTOS DE EMERGENCIA	233
2.5.12	INSPECCIONES DE SEGURIDAD VIAL.....	237
2.5.13	CONTROL DE RIESGO VIAL.....	238
2.5.14	INSPECCIONES DE VEHÍCULOS DE OPERACIÓN	238
2.5.15	Mejora continua.....	238
2.5.16	Realización de pausas activas.....	238
2.5.17	Pruebas de alcoholimetría.....	239
2.6	OPERACIONES.....	239
2.6.1	ASPECTOS DE OPERACIÓN	239
2.6.2	ACCIDENTES	240
2.6.3	REGISTROS DE EVENTOS O INCIDENTES	248
2.6.4	SERVICIO DE GRUA.....	248
2.6.5	SERVICIO DE CARRO TALLER	251
2.6.6	CARGAS EXTRA - DIMENSIONADAS Y/O EXTRA – PESADAS	255
3	CONCLUSIONES.....	261
3.1	Ambito Social:.....	261
3.2	Ambito Predial:.....	261
3.3	Ambito SST.....	262
4	ANEXOS	263

ÍNDICE DE GRÁFICOS

	Pág.
Grafica 1 PQRS Recibidas / Abiertas.....	105
Grafica 2 Llamadas a la línea de Atención al Usuario.....	107
Grafica 3 Atenciones por medio de correo electrónico	107
Grafica 4 Relación Personal vinculado del AID con el personal del AII	109
Grafica 5 Relación MONC contratada con la MOC	110
Grafica 6 Accidentalidad acumulada a mes de Junio 2021	245
Grafica 7 Accidentalidad Vs Mortalidad acumulada	246
Grafica 8 Accidentalidad Mensual por Unidad Funcional acumulada a junio de 2021...	247
Grafica 9 Servicio Grúas acumulado a Mayo 2021	248
Grafica 10 Servicio Carro Taller acumulado a Junio de 2021.....	252
Grafica 11 Total de Servicios por Mes acumulado a Junio 2021	255

ÍNDICE DE TABLAS

	Pág.
Tabla 1. Unidad funcional 1 Variante Flandes – Girardot.....	12
Tabla 2. Indicadores Unidad Funcional 1	12
Tabla 3. Unidad funcional 2 Girardot – Guataquí	16
Tabla 4. Indicadores Unidad funcional 2	16
Tabla 5. Unidad funcional 3 Guataquí – Cambao.....	22
Tabla 6. Indicadores Unidad funcional 3	22
Tabla 7. Unidad funcional 4 Cambao – Puerto Bogotá.....	27
Tabla 8. Indicadores Unidad Funcional 4	28
Tabla 9. Unidad funcional 5 Honda – Dorada	33
Tabla 10. Indicadores Unidad funcional 5	33
Tabla 11. Cumplimiento de Indicadores de Mantenimiento Junio 2021.....	39
Tabla 12 Traslado redes Eléctricas.....	40
Tabla 13 Traslado de redes Húmedas.	40
Tabla 14 Traslado de redes de Hidrocarburos.	41
Tabla 15 Traslado de redes de Fibra Optica.	42
Tabla 16 Traslado de Redes Electricas Pendientes UF3	45
Tabla 17 Trazabilidad de comunicaciones de Cartas Enviadas.	51
Tabla 18 Actas de Obra Y Procesos de Aprobación.....	52
Tabla 19 Licencias Ambientales	53
Tabla 20 Entrega Informes de Cumplimiento Ambiental ICA	53
Tabla 21 Autos de Control y Seguimiento – ANLA.....	54
Tabla 22 Cambios menores Licencias Ambientales.....	55
Tabla 23 Permisos de Aprovechamiento	58
Tabla 24 Levantamiento de Vedas	61
Tabla 25 PAGAS	62
Tabla 26 Permisos de Ocupación de Cauces	62
Tabla 27 Arqueología por Unidad Funcional.....	63
Tabla 28 Cruce aéreo y obras fluviales por Unidad Funcional	64

Tabla 29. Capacitaciones y/o charlas personal de la concesión	65
Tabla 30. Cantidades Adquiridas material pétreo UF 4.2 y 5.2	66
Tabla 31. Volumen agua en bloque UF 4.2 y 5.2.	66
Tabla 32. Volumen de los residuos líquidos generados	66
Tabla 33 Aprovechamiento forestal	67
Tabla 34 Compensaciones ambientales	72
Tabla 35 Rehabilitación Ecológica	79
Tabla 36 Cumplimiento de informes semestrales por permisos de levantamiento de veda	80
Tabla 37 Trazabilidad Cormagdalena	82
Tabla 38 Relación correspondencia saliente.....	86
Tabla 39 Relación correspondencia recibida	89
Tabla 40 Conformación Grupo de Trabajo Ambiental	93
Tabla 41 Requerimientos legales.....	94
Tabla 42 Cumplimiento de Requerimientos Legales	95
Tabla 43 Materiales de construcción mantenimiento rutinario.....	96
Tabla 44 Indicador – Señalización de frentes de obra y sitios temporales	96
Tabla 45 Manejo de Materiales Sobrantes.....	96
Tabla 46. Estado de la gestión de los residuos sólidos domiciliarios	97
Tabla 47. Reporte de residuos sólidos generados áreas contractuales	98
Tabla 48. Reporte volumen de agua en bloque áreas contractuales.	98
Tabla 49. Reporte volumen de agua consumo humano de áreas contractuales.	99
Tabla 50. Residuos líquidos sistemas sépticos.....	99
Tabla 51 Reporte de Fauna	101
Tabla 52 Indicadores – Protección de Fauna.....	102
Tabla 53. Maquinaria y equipo de operación y mantenimiento.....	103
Tabla 54 Personal del Programa de Atención al Usuario.	105
Tabla 55 Relación a PQRS	105
Tabla 56 Capacitaciones por Unidad Funcional Junio	108
Tabla 57 Consolidado capacitaciones realizadas hasta Mayo 2021.....	108
Tabla 58 Personal Contratado AID y AII a junio 2021	109
Tabla 59 Personal Contratado MOC – MONC Junio 2021	109
Tabla 60 Recepción de hojas de vida en el mes de Abril 2021.	110
Tabla 61 Reuniones informativas alianza SENA.....	111
Tabla 62 Jornada de apoyo proceso de postulación a vacante.....	111
Tabla 63 Consolidado nuevo personal vinculado con corte a Junio 2021	112
Tabla 64 Piezas Comunicativas en Mayo 2021	116
Tabla 65 Piezas Comunicativas entregadas por UF a Junio 2021	117
Tabla 66 Socializaciones en acumulado a Junio 2021	124
Tabla 67 Socializaciones realizadas por UF a Junio 2021	125
Tabla 68 Relación de comunicados dirigidos a instituciones en Junio 2021.....	132
Tabla 69 Solicitudes restitución espacio Público/Capacitaciones a Junio 2021	134
Tabla 70 Reuniones o Gestiones con Autoridades Municipales y/o de Policía a Mayo 2021	136
Tabla 71 Gestiones de recuperación y/o Custodia de Espacio Público a Junio 2021.....	138
Tabla 72 Capacitaciones con la comunidad Junio 2021.....	139
Tabla 73 Consolidado capacitaciones con la comunidad al mes Mayo 2021	139
Tabla 74 Gestiones para la implementación del programa Junio 2021	140

Tabla 75 Actividades Pedagógicas Junio 2021	140
Tabla 76 Actividades de Campañas Trimestrales a Junio 2021	140
Tabla 77 Actividades de Sensibilización peatones Junio 2021.....	140
Tabla 78 Resumen Tramites ante el ICANH enero 2021	142
Tabla 79 Identificación Unidades sociales con factores sociales junio 2021	147
Tabla 80 Gestión inmobiliaria y procesos Unidades Sociales Realineamiento UF 5.1 ...	147
Tabla 81 Gestión con unidades sociales a trasladar La Dorada sector glorieta Norcasia	150
Tabla 82 Visita N° 1 de seguimiento US trasladadas	150
Tabla 83 Unidades Sociales Trasladas	151
Tabla 84 Visitas de cierre a seguimientos.....	152
Tabla 85 Verificación de traslados anticipados UF5.....	152
Tabla 86 Resumen de Actividades Gestión Socio-Predial	153
Tabla 87 Resumen Unidades Funcionales.....	154
Tabla 88 Resumen Fichas Sociales por Unidad Funcional	154
Tabla 89 Acuerdos de reconocimientos elaborados.....	155
Tabla 90 Fichas Sociales aprobadas por la interventoría.....	155
Tabla 91 Pago de compensaciones socioeconómicas	155
Tabla 92 Plan de compensaciones socio económicas	156
Tabla 93 Matriz de Compensaciones Socio-Economicas.....	157
Tabla 94 Relación actas de vecindad junio 2021	158
Tabla 95 Atención de actas de vecindad en junio 2021	158
Tabla 96 Inventario de predios por unidad funcional.....	158
Tabla 97 Avance insumos prediales	159
Tabla 98 Longitud y área requerida de las fichas técnicas prediales aprobadas.....	164
Tabla 99 Estado de avance avalúos Comerciales Corporativos.....	165
Tabla 100 Detalle de avance proceso de adquisición	176
Tabla 101 Permisos de intervención y disponibilidad (adquisición) por unidad funcional	177
Tabla 102 Avance predios expropiables y/o predios problema	178
Tabla 103 Gestión Social.....	196
Tabla 104. Reporte de Olympus	197
Tabla 105. Tabla de predios con acta.....	197
Tabla 106 Tabla resumen Olympus	198
Tabla 107 Saldo de subcuenta predial.....	205
Tabla 108 Rendimientos de la subcuenta predial.....	205
Tabla 109 Predios pagos en su totalidad certificados por la Fiduciaria Banco de Bogotá	205
Tabla 110 Costo estimado de adquisición predial.....	206
Tabla 111 Listado de empresas contratistas.....	207
Tabla 112 Ingresos	207
Tabla 113 Exámenes médicos.....	208
Tabla 114 Programa de Charlas Concesionario	208
Tabla 115 Charla	210
Tabla 116 Capacitaciones	216
Tabla 117 Cobertura de capacitación	218
Tabla 118 Frecuencia de accidentalidad.....	219
Tabla 119 Índice de severidad de accidentes de trabajo.....	220
Tabla 120 Ausentismo	221
Tabla 121 Accidentalidad.....	221

Tabla 122 Inventario de elementos de emergencias.....	234
Tabla 123 Botiquines y camillas.....	236
Tabla 124 Flota de vehiculos	238
Tabla 125 mejoras al SGSST	238
Tabla 126. Base de datos consolidado de Atención Operación Mensual	239
Tabla 127 Consolidado Historico de Accidentalidad a junio 2021	241
Tabla 128 Comportamiento de los servicios de Grúa a junio 2021	249
Tabla 129 Comportamiento de los servicios carro taller Junio 2021.....	252
Tabla 130 Registro de Cargas extra dimensionadas y extrapesadas.....	257

INTRODUCCION

Bajo un esquema de asociación público-Privada en los términos de la Ley 1508 de 2012, se firmó el contrato de Concesión No. 003 de 2014 entre la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA – ANI, entidad concedente adscrita al Ministerio de Transporte, y el CONCESIONARIO ALTO MAGDALENA S.A.S, entidad contratista de orden Privado. El objeto del contrato consistió en el otorgamiento de una concesión vial para que el contratista, por su cuenta y riesgo, realice las intervenciones establecidas en el Apéndice Técnico I – Alcance del Proyecto, siendo responsable del cumplimiento de las obligaciones de resultado que se derivan del mismo y del Contrato; corresponde al concesionario diseñar, construir, mejorar, rehabilitar, mantener, operar y financiar la vía concesionada.

Las vías actuales comprendidas en el Proyecto “Corredor Girardot – Puerto Salgar – Honda” tienen una longitud total estimada origen-destino de 200 kilómetros y en su recorrido atraviesan los departamentos de Cundinamarca, Tolima y Caldas.

El Propósito fundamental del corredor es desarrollar una vía Primaria de altas especificaciones para garantizar la conexión Sur – Norte de la Troncal Central, uniendo los departamentos del centro del país en el sector de Flandes desde la Concesión San Rafael por la margen derecha del río Magdalena en el departamento de Cundinamarca, con el norte del país, en el sector de Puerto Salgar de la Concesión Ruta del Sol.

Una vez entre en servicio el Proyecto, la conexión de la vía Girardot – Honda – Puerto Salgar, beneficiará directamente a los municipios de Flandes, Girardot, Chaguaní, Nariño, Guataquí, Beltrán, San Juan de Río Seco (Cambao), Guaduas (Puerto Bogotá), Honda, La Dorada y Puerto Salgar; asimismo, será una fuente de empleo determinante para la región, además de impactar favorablemente el crecimiento económico y la competitividad, mejorando la conectividad de centros de Producción con los diferentes centros urbanos y de distribución.

La Presente memoria técnica, es un documento contractual el cual se deberá mantener actualizado y a disposición del Interventor y de la ANI en todo momento, publicada en internet o disponible en medio magnético, incluyendo información relacionada con las intervenciones realizadas en el corredor.

A continuación, se Presenta la memoria técnica con actualización al día 30 de junio de 2021, en la cual se incluyen todos los aspectos relacionados con las obras ejecutadas, informes técnicos, descripción de estudios realizados, materiales, ensayos y control de Calidad, accidentes en obra y anexos.

OBJETIVO

OBJETIVO GENERAL

1. Permitir a la Interventoría, a la ANI, y a cualquier usuario interesado, conocer los aspectos técnicos del Proyecto.
2. Generar un documento que permita consultar la trazabilidad del Proyecto desde sus inicios, sirviendo de memoria histórica fundamental en la toma de decisiones a mediano y largo plazo.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Presentar en detalle el avance en la gestión ambiental, gestión social y gestión Predial por parte de la Concesión, que se ha venido adelantando en la Presente fase.
2. Presentar la información general y detallada del avance de estudios y diseños, incluyendo actividades de campo, laboratorio, análisis, resultados y conclusiones, que determinen el estado de avance de los diseños de detalle que se requieren para la fase de construcción.
3. Presentar las actividades de mantenimiento desarrolladas por el Concesionario como parte del mantenimiento para la rehabilitación y puesta en funcionamiento de las estructuras de drenaje existentes tales como alcantarillas, box Coulvert, cunetas, pontones, canales, entre otros.
4. Presentar los reportes de accidentes Presentados hasta el momento.
5. Informar acerca del estado de atención por parte del concesionario, a las observaciones que ha Presentado la interventoría, en lo relacionado con las obras de mantenimiento rutinario, señalización, gestión social, gestión ambiental, entre otros.
6. Informar por parte del Concesionario acerca de las actividades realizadas en el periodo para el cumplimiento de las obligaciones Contractuales en lo relacionado con el mantenimiento Rutinario.

1 CUADRO DE RELACION DE OBRAS EJECUTADAS

1.1 OBRAS EJECUTADAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

En el transcurso del periodo que comprende el presente informe, se realizaron actividades de mantenimiento y conservación como de seguridad vial en cada una de las Unidades Funcionales, encaminadas al cumplimiento de los Indicadores de Mantenimiento según lo establece el contrato de Concesión en su Apéndice Técnico No.2 y No.4.

1.1.1 UNIDAD FUNCIONAL NO 1 (VARIANTE FLANDES - GIRARDOT)

UF No.	I
Sector	Variante Flandes - Girardot
Intervención prevista	Mejoramiento y Construcción
Obras especiales	Construcción Puente sobre río Magdalena en doble calzada
Calzada	Doble
Longitud vía (km)	5,2
Longitud de puentes (m)	560
Pre construcción (meses)	12
Construcción (meses)	24
Duración total (meses)	36
Duración total (años)	3



A continuación, se relaciona las actividades preliminares de Mantenimiento y Recuperación de la Calzada

Tabla 1. Unidad funcional 1 Variante Flandes – Girardot

SUB-SECTOR	ACCESO VEREDA TOPACIO	VEREDA LIMONAR
LONGITUD (KM)	2,7	1,6
ESTADO RECIBO	Vía pavimentada en todos los sectores, la cual se encuentra en mal estado, ancho 5m aproximadamente, márgenes abandonadas, pasivos ambientales en la zona que era utilizada como botadero por la comunidad, sin señalización vertical; sin cunetas existentes, 2 alcantarillas existentes 1 tipo box y 1 tubular, encoles y descoles colmatados.	
ACTIVIDADES REALIZADAS PARA PUESTA A PUNTO	Desmante inicial	
	Retiro de desmante	
	Atención sitios críticos	
	Retiro de basuras de márgenes	
	Remoción de escombros	
	Limpieza Box Culvert	
	Limpieza de alcantarilla existente	
	Limpieza de márgenes	
	Mantenimiento a rutinario	
	Instalación y retiro de señales verticales	
	Iluminación en perfecto estado	
	Instalación de defensas con sus respectivos capta faros	

Actividades realizadas en el presente mes para la unidad funcional 1

Tabla 2. Indicadores Unidad Funcional 1

RESUMEN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO POR UNIDADES FUNCIONALES			
INDICADOR	ACTIVIDAD	UNID.	1
E3-Fisuras	Sello de fisuras	ml	327.30
E6(Bach),E7(Hund)	Parcheo	m3	0.00
E8 - Estado de Márgenes, separador central, Área de Servicio y Corredor del Proyecto	Rocería manual	m2	97,650.00
	Rocería mecanizada	m2	66,890.00
	Limpieza de bermas	ml	0.00
	Limpieza de cicloruta	Km	0.00
	Retiro de material vegetal	m3	0.00
	Instalación de cerca	ml	0.00
	mantenimiento de cerca	ml	0.00
E10 - Drenajes superficiales, longitudinal y transversal	Limpieza cunetas	ml	0.00
	Limpieza zanjas de coronación	ml	0.00
	Limpieza canales	ml	0.00
	Limpieza obras	Und	2.00
	Retiro material de alcantarillas	m3	0.00
E11 - Señalización vertical	Limpieza y lavado señales verticales	Und	0.00
	Instalación de señales verticales	Und	0.00
	Retiro de señales verticales	Und	0.00
	Poda para despeje de señales vertical	ml	0.00
E12 - Señalización Horizontal	Marcas viales	m2	0.00
	Lineas blancas	ml	0.00
	Lineas amarillas	ml	0.00

RESUMEN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO POR UNIDADES FUNCIONALES			
INDICADOR	ACTIVIDAD	UNID.	1
E13 - Barrera y Elementos de Contención	linea logaritmica	Und	0.00
	instalacion de tachas	Und	0.00
	limpieza de captafaros	Und	0.00
	limpieza defensas metalicas	ml	0.00
	Retiro defensas metalicas	ml	0.00
	limpieza de new jersey	ml	0.00
	pintura de new jersey	m2	6.00
	instalacion reflectivos	Und	0.00
	instalacion captafaros	Und	0.00
O4 - Tiempo de atención de incidentes	Retiro de deslizamientos	m3	0.00
	Retiro obstaculos en la vía	m3	0.00
Otras Actividades	Transporte de material	m3	0.00
	Retiro material de margenes	m3	0.00
	Descargue de material de los taludes	m3	0.00
	Limpieza de puente vehicular	Und	5.00
	Instalacion de Bandas Alertadoras	ml	0.00
	Instalacion hitos tubulares	Und	0.00
	Instalacion hitos de arista	Und	0.00
	Instalacion doll	Und	0.00
	Pintura de barandas	ml	0.00
	Estabilización muro contención	m3	0.00
	Retiro de basuras	m3	0.00
	Instalación bordillos	ml	0.00
	Protección talud	m2	0.00

A partir del estado inicial del corredor recibido por parte de la ANI, el concesionario ha implementado un programa de mantenimiento rutinario en el cual se definen las principales actuaciones tendientes a la conservación y mantenimiento de la infraestructura vial, además de brindar adecuadas condiciones de seguridad a los usuarios del corredor y comunidad próxima al proyecto vial. A continuación, se presenta un registro fotográfico de las actividades de mantenimiento vial más importantes y relevantes, ejecutadas durante este periodo de tiempo.

	REGISTRO FOTOGRAFICO		F-08-03
			Versión: 04
			Fecha: 01-04-2016
PROYECTO VIAL GIRARDOT HONDA PUERTO SALGAR		UF No. UF 1	HOJA 3 DE 33
REGISTRO FOTOGRAFICO			
			
FOTOGRAFIA N°:	1	Mantenimiento rutinario	
LUGAR:	PR 04+000 AL PR 05+000 UF1 RN 40TL06		
DESCRIPCION:	Instalación de reflectivos		

	REGISTRO FOTOGRAFICO		F-08-03
			Versión: 04
			Fecha: 01-04-2016
PROYECTO VIAL GIRARDOT HONDA PUERTO SALGAR		UF No. UF 1	HOJA 3 DE 33
REGISTRO FOTOGRAFICO			
			
FOTOGRAFIA N°:	2	Mantenimiento rutinario	
LUGAR:	PR 02+900 UF1 RN 40TL06 PUENTE TOPACIO		
DESCRIPCION:	Limpieza puente vehicular		

	REGISTRO FOTOGRAFICO		F-08-03
			Versión: 04
			Fecha: 01-04-2016
PROYECTO VIAL GIRARDOT HONDA PUERTO SALGAR		UF No. 1	HOJA 4 DE 33
REGISTRO FOTOGRAFICO			
			
FOTOGRAFIA N°:	4	Mantenimiento rutinario	
LUGAR:	PR 00+500 AL PR 01+600 UF1 RN 40TL06		
DESCRIPCION:	Roceria		

1.1.2 UNIDAD FUNCIONAL NO 2 (GIRARDOT – GUATAQUÍ)

UF No.	2
Sector	Girardot - Guataquí
Intervención prevista	Mejoramiento
Obras especiales	-
Calzada	Sencilla
Longitud vía (km)	36,5
Longitud de puentes (m)	90
Pre construcción (meses)	12
Construcción (meses)	24
Duración total (meses)	36
Duración total (años)	3



A continuación, se relaciona las actividades preliminares de Mantenimiento y Recuperación de la Calzada

Tabla 3. Unidad funcional 2 Girardot – Guataquí

SUB-SECTOR	GIRARDOT - NARIÑO	NARIÑO - GUATAQUÍ
LONGITUD (KM)	22	17
ESTADO RECIBO	Vía pavimentada ancho 6 a 6,5m, márgenes abandonadas, pasivos ambientales en entrada a municipios por botaderos irregulares, con escasa señalización vertical en deficiente estado y tramos de señalización horizontal en regular estado; mínimas cunetas existentes, alcantarillas obstruidas, encoles y descoles colmatados	
ACTIVIDADES REALIZADAS PARA PUESTA A PUNTO	Desmante inicial	
	Retiro de desmante	
	Atención sitios críticos	
	Retiro de basuras de márgenes	
	Remoción derrumbes	
	Limpieza drenajes	
	Recuperación de cunetas	
	Desmante de señalización vieja	
	Instalación de señalización nueva	
	Limpieza de márgenes y prevención de derrumbes	
	Emergencia sector "El Buche"	
	Mantenimiento a señalización	
	Mantenimiento Rutinario	

Actividades de Mantenimiento Rutinario correspondientes al presente mes:

Tabla 4. Indicadores Unidad funcional 2

RESUMEN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO POR UNIDADES FUNCIONALES			
INDICADOR	ACTIVIDAD	UNID.	2
E3-Fisuras	Sello de fisuras	ml	1,055.00
E6(Bach),E7(Hund)	Parqueo	m3	90.27
E8 - Estado de Márgenes, separador central, Área de Servicio y Corredor del Proyecto	Rocería manual	m2	458,450.00
	Rocería mecanizada	m2	18,520.00
	Limpieza de bermas	ml	31,010.00
	Limpieza de cicloruta	Km	28.30
	Retiro de material vegetal	m3	4.00
	Instalación de cerca	ml	0.00
	mantenimiento de cerca	ml	0.00
E10 - Drenajes superficiales, longitudinal y transversal	Limpieza cunetas	ml	30,260.00
	Limpieza zanjas de coronación	ml	260.00
	Limpieza canales	ml	0.00
	Limpieza obras	Und	27.00
	Retiro material de alcantarillas	m3	35.00
E11 - Señalización vertical	Limpieza y lavado señales verticales	Und	16.00
	Instalación de señales verticales	Und	8.00
	Retiro de señales verticales	Und	0.00
	Poda para despeje de señales vertical	ml	0.00
E12 - Señalización Horizontal	Marcas viales	m2	0.00
	Lineas blancas	ml	0.00
	Lineas amarillas	ml	0.00
	linea logaritmica	Und	0.00
	instalacion de tachas	Und	0.00

RESUMEN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO POR UNIDADES FUNCIONALES			
INDICADOR	ACTIVIDAD	UNID.	2
E13 - Barrera y Elementos de Contención	limpieza de captafaros	Und	0.00
	limpieza defensas metalicas	ml	80.00
	Retiro defensas metalicas	ml	0.00
	limpieza de new jersey	ml	0.00
	pintura de new jersey	m2	0.00
	instalacion reflectivos	Und	0.00
	instalacion captafaros	Und	0.00
O4 - Tiempo de atención de incidentes	Retiro de deslizamientos	m3	406.00
	Retiro obstaculos en la vía	m3	1.00
Otras Actividades	Transporte de material	m3	0.00
	Retiro material de margenes	m3	0.00
	Descargue de material de los taludes	m3	70.00
	Limpieza de puente vehicular	Und	0.00
	Instalacion de Bandas Alertadoras	ml	0.00
	Instalacion hitos tubulares	Und	37.00
	Instalacion hitos de arista	Und	0.00
	Instalacion doll	Und	0.00
	Pintura de barandas	ml	0.00
	Estabilización muro contención	m3	0.00
	Retiro de basuras	m3	1.00
	Instalación bordillos	ml	0.00
	Protección talud	m2	0.00

REGISTRO FOTOGRAFICO:

A partir del estado inicial del corredor recibido por parte de la ANI, el concesionario ha implementado un programa de mantenimiento rutinario en el cual se definen las principales actuaciones tendientes a la conservación y mantenimiento de la infraestructura vial, además de brindar adecuadas condiciones de seguridad a los usuarios del corredor y comunidad próxima al proyecto vial. A continuación, se presenta un registro fotográfico de las actividades de mantenimiento vial más importantes y relevantes, ejecutadas durante este periodo de tiempo.


	REGISTRO FOTOGRAFICO		F-08-03
			Versión: 04
			Fecha: 01-04-2016
PROYECTO VIAL GIRARDOT HONDA PUERTO SALGAR		UF No. 2	HOJA 5 DE 33
REGISTRO FOTOGRAFICO			
			
pr 19 + 550 uf 2 ruta 4508 4°22'36", -74°50'18", 287.0m 2 jun. 2021 10:59:20 a. m.		pr 19 + 550 uf 2 ruta 4508 Girardot-Nariño, Nariño, Cundinamarca, Colombia 4°22'36", -74°50'18", 290.0m 2 jun. 2021 11:42:07 a. m.	
FOTOGRAFIA N°:	5	Mantenimiento rutinario	
LUGAR:		PR 19+500 UF2 RN 4508 EJE	
DESCRIPCION:		Instalación de hitos tubulares	

	REGISTRO FOTOGRAFICO		F-08-03
			Versión: 04
			Fecha: 01-04-2016
PROYECTO VIAL GIRARDOT HONDA PUERTO SALGAR		UF No. 2	HOJA 5 DE 33
REGISTRO FOTOGRAFICO			
			
29 jun. 2021 11:35:51 a. m. Ruta 4508 uf 2 17+600 eje Número de índice: 172		29 jun. 2021 11:36:34 a. m. Ruta 4508 uf 2 17+600 eje Número de índice: 173	
FOTOGRAFIA N°:	6	Mantenimiento rutinario	
LUGAR:		PR 17+600 UF2 RN 4508 EJE	
DESCRIPCION:		Demarcación vial	

	REGISTRO FOTOGRAFICO		F-08-03
			Versión: 04
			Fecha: 01-04-2016
PROYECTO VIAL GIRARDOT HONDA PUERTO SALGAR		UF No. 2	HOJA 6 DE 33
REGISTRO FOTOGRAFICO			
			
FOTOGRAFIA N°:	7	Mantenimiento rutinario	
LUGAR:		PR 25+530 UF2 RN 4508	
DESCRIPCION:		Limpieza de berma y cuneta	

	REGISTRO FOTOGRAFICO		F-08-03
			Versión: 04
			Fecha: 01-04-2016
PROYECTO VIAL GIRARDOT HONDA PUERTO SALGAR		UF No. 2	HOJA 7 DE 33
REGISTRO FOTOGRAFICO			
			
FOTOGRAFIA N°:	9	Mantenimiento rutinario	
LUGAR:		PR 30+800 UF2 RN 4508	
DESCRIPCION:		Limpieza de alcantarilla	

	REGISTRO FOTOGRAFICO		F-08-03
			Versión: 04
			Fecha: 01-04-2016
PROYECTO VIAL GIRARDOT HONDA PUERTO SALGAR		UF No. 2	HOJA 8 DE 33
REGISTRO FOTOGRAFICO			
			
FOTOGRAFIA N°:		11	Mantenimiento rutinario
LUGAR:		PR 06+010 EJE 1 UF1 RN 40TL06	
DESCRIPCION:		Cambio de señal vertical	

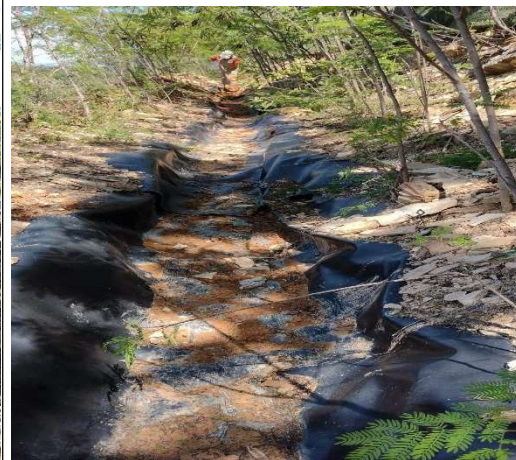	REGISTRO FOTOGRAFICO		F-08-03
			Versión: 04
			Fecha: 01-04-2016
PROYECTO VIAL GIRARDOT HONDA PUERTO SALGAR		UF No. 2	HOJA 9 DE 33
REGISTRO FOTOGRAFICO			
			
FOTOGRAFIA N°:	13	Mantenimiento rutinario	
LUGAR:		PR 05+550 AL PR 05+700 UF2 RN 4508	
DESCRIPCION:		Limpieza zanja de coronación	

	REGISTRO FOTOGRAFICO		F-08-03
			Versión: 04
			Fecha: 01-04-2016
PROYECTO VIAL GIRARDOT HONDA PUERTO SALGAR		UF No. 2	HOJA 10 DE 33
REGISTRO FOTOGRAFICO			
			
23 jun. 2021 16:11:21		23 jun. 2021 16:14:22	
FOTOGRAFIA N°:	16	Mantenimiento rutinario	
LUGAR:	PR 05+200 AL PR 15+500 UF2 RN 4508		
DESCRIPCION:	Limpieza de cicloruta		

1.1.3 UNIDAD FUNCIONAL NO. 3 (GUATAQUÍ- CAMBAO).

UF No.	3
Sector	Guataquí - Cambao
Intervención prevista	Mejoramiento
Obras especiales	-
Calzada	Sencilla
Longitud vía (km)	51
Longitud de puentes (m)	940
Pre construcción (meses)	12
Construcción (meses)	36
Duración total (meses)	48
Duración total (años)	4



A continuación, se relaciona las actividades preliminares de Mantenimiento y Recuperación de la Calzada referentes a la unidad funcional 3

Tabla 5. Unidad funcional 3 Guataquí – Cambao

SUB-SECTOR	GUATAQUÍ - PAQUILO	PAQUILO - BELTRAN	BELTRAN - CAMBAO
LONGITUD (KM)	16	20	13
ESTADO RECIBO	Vía pavimentada ancho 6 a 6,5m, márgenes abandonadas, pasivos ambientales en entrada a municipios por botaderos irregulares, con escasa señalización vertical en deficiente estado y tramos de señalización horizontal en regular estado; mínimas cunetas existentes, alcantarillas obstruidas, encoles y descoles colmatados. En el tramo Beltrán - Cambao presentaba pérdida de rodadura en la gran mayoría del sector.		
ACTIVIDADES REALIZADAS PARA PUESTA A PUNTO	Desmante inicial		
	Retiro de desmante		
	Atención sitios críticos		
	Retiro de basuras de márgenes		
	Remoción derrumbes		
	Limpieza drenajes		
	Desmante de señalización vieja		
	Instalación de señalización nueva		
	Retiro de basura de márgenes		
	Bacheo con asfaltita		
	Limpieza de márgenes y prevención de derrumbes		
	Mantenimiento rutinario		

Actividades de Mantenimiento Rutinario correspondientes al periodo englobado en este informe:


Tabla 6. Indicadores Unidad funcional 3

RESUMEN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO POR UNIDADES FUNCIONALES			
INDICADOR	ACTIVIDAD	UNID.	3
E3-Fisuras	Sello de fisuras	ml	1,046.60
E6(Bach),E7(Hund)	Parcheo	m3	65.61
E8 - Estado de Márgenes, separador central, Área de Servicio y Corredor del Proyecto	Rocería manual	m2	449,510.00
	Rocería mecanizada	m2	0.00
	Limpieza de bermas	ml	10,220.00
	Limpieza de cicloruta	Km	0.00
	Retiro de material vegetal	m3	3.00
	Instalación de cerca	ml	430.00
	mantenimiento de cerca	ml	0.00
E10 - Drenajes superficiales, longitudinal y transversal	Limpieza cunetas	ml	13,320.00
	Limpieza zanjas de coronación	ml	0.00
	Limpieza canales	ml	150.00
	Limpieza obras	Und	21.00
	Retiro material de alcantarillas	m3	77.00
E11 - Señalización vertical	Limpieza y lavado señales verticales	Und	0.00
	Instalación de señales verticales	Und	3.00
	Retiro de señales verticales	Und	0.00
	Poda para despeje de señales vertical	ml	242.00
E12 - Señalización Horizontal	Marcas viales	m2	211.00
	Lineas blancas	ml	9,820.00

RESUMEN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO POR UNIDADES FUNCIONALES			
INDICADOR	ACTIVIDAD	UNID.	3
	Lineas amarillas	ml	5,635.00
	linea logaritmica	Und	13.50
	instalacion de tachas	Und	0.00
E13 - Barrera y Elementos de Contención	limpieza de captafaros	Und	0.00
	limpieza defensas metalicas	ml	0.00
	Retiro defensas metalicas	ml	0.00
	limpieza de new jersey	ml	100.00
	pintura de new jersey	m2	4.00
	instalacion reflectivos	Und	0.00
	instalacion captafaros	Und	0.00
O4 - Tiempo de atención de incidentes	Retiro de deslizamientos	m3	129.00
	Retiro obstaculos en la vía	m3	0.00
Otras Actividades	Transporte de material	m3	3.00
	Retiro material de margenes	m3	91.00
	Descargue de material de los taludes	m3	0.00
	Limpieza de puente vehicular	Und	1.00
	Instalacion de Bandas Alertadoras	ml	0.00
	Instalacion hitos tubulares	Und	30.00
	Instalacion hitos de arista	Und	0.00
	Instalacion doll	Und	0.00
	Pintura de barandas	ml	0.00
	Estabilización muro contención	m3	0.00
	Retiro de basuras	m3	0.00
	Instalación bordillos	ml	0.00
	Protección talud	m2	70.00

REGISTRO FOTOGRAFICO:

A partir del estado inicial del corredor recibido por parte de la ANI, el concesionario ha implementado un programa de mantenimiento rutinario en el cual se definen las principales actuaciones tendientes a la conservación y mantenimiento de la infraestructura vial, además de brindar adecuadas condiciones de seguridad a los usuarios del corredor y comunidad próxima al proyecto vial. A continuación, se presenta un registro fotográfico de las actividades de mantenimiento vial más importantes y relevantes, ejecutadas durante este periodo de tiempo.

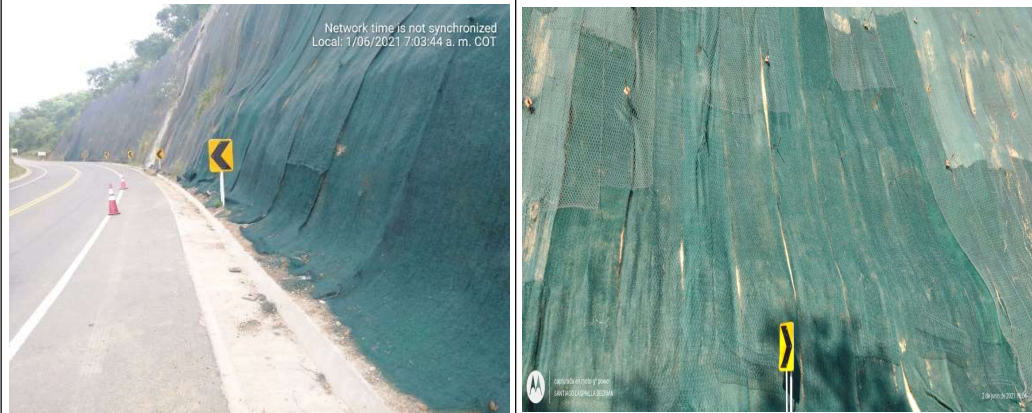	REGISTRO FOTOGRAFICO		F-08-03
			Versión: 04
			Fecha: 01-04-2016
PROYECTO VIAL GIRARDOT HONDA PUERTO SALGAR		UF No. 3	HOJA 11 DE 33
REGISTRO FOTOGRAFICO			
			
FOTOGRAFIA N°:	17	Mantenimiento rutinario	
LUGAR:	PR 85+710 UF3 RN 4508		
DESCRIPCION:	Instalación malla triple torsión		

	REGISTRO FOTOGRAFICO		F-08-03
			Versión: 04
			Fecha: 01-04-2016
PROYECTO VIAL GIRARDOT HONDA PUERTO SALGAR		UF No. 3	HOJA 11 DE 33
REGISTRO FOTOGRAFICO			
			
FOTOGRAFIA N°:	18	Mantenimiento rutinario	
LUGAR:	PR 71+320 AL PR 71+420 UF3 RN 4508		
DESCRIPCION:	Limpieza de andenes		

	REGISTRO FOTOGRAFICO		F-08-03
			Versión: 04
			Fecha: 01-04-2016
PROYECTO VIAL GIRARDOT HONDA PUERTO SALGAR		UF No. 3	HOJA 13 DE 33
REGISTRO FOTOGRAFICO			
			
8 jun. 2021 2:26:33 p. m. Cambao-Guataquí Gramalotal Beltrán Cundinamarca M2 accesos uf 3 pr 70+980 Número de índice: 13		8 jun. 2021 2:51:38 p. m. Cambao-Guataquí Gramalotal Beltrán Cundinamarca M2 accesos uf 3 pr 70+980 Número de índice: 14	
FOTOGRAFIA N°:	21	Mantenimiento rutinario	
LUGAR:		PR 70+980 UF3 RN 4508	
DESCRIPCION:		Marcas viales	

	REGISTRO FOTOGRAFICO		F-08-03
			Versión: 04
			Fecha: 01-04-2016
PROYECTO VIAL GIRARDOT HONDA PUERTO SALGAR		UF No. 3	HOJA 13 DE 33
REGISTRO FOTOGRAFICO			
			
PR73+900 UF3 ☀ °C 10/6/2021		PR73+900 UF3 ☀ °C 10/6/2021	
FOTOGRAFIA N°:	22	Mantenimiento rutinario	
LUGAR:		PR 73+900 UF3 RN 4508	
DESCRIPCION:		Sello de fisuras	

	REGISTRO FOTOGRAFICO		F-08-03
			Versión: 04
			Fecha: 01-04-2016
PROYECTO VIAL GIRARDOT HONDA PUERTO SALGAR		UF No. 3	HOJA 14 DE 33
REGISTRO FOTOGRAFICO			
			
FOTOGRAFIA N°:	23	Mantenimiento rutinario	
LUGAR:	UF3 RN 4508 PEAGE GUATAQUI		
DESCRIPCION:	Balizaje peaje		

	REGISTRO FOTOGRAFICO		F-08-03
			Versión: 04
			Fecha: 01-04-2016
PROYECTO VIAL GIRARDOT HONDA PUERTO SALGAR		UF No. 3	HOJA 14 DE 33
REGISTRO FOTOGRAFICO			
			
FOTOGRAFIA N°:	24	Mantenimiento rutinario	
LUGAR:	PR 42+725 UF3 RN 4508		
DESCRIPCION:	Reparación de new jersey		

1.1.4 UNIDAD FUNCIONAL NO 4 (CAMBAO-PTO BOGOTÁ)

UF No.	4	
Sector	Cambio - Pto Bogotá	
Intervención prevista	Construcción y Mantenimiento	
Obras especiales	-	
Calzada	Sencilla	
Longitud vía (km)	44,8	
Longitud de puentes (m)	300	
Pre construcción (meses)	12	
Construcción (meses)	24	
Duración total (meses)	36	
Duración total (años)	3	

En la siguiente tabla se relaciona las actividades preliminares de Mantenimiento y Recuperación del corredor vial perteneciente a la unidad funcional 4.

Tabla 7. Unidad funcional 4 Cambio – Puerto Bogotá

SUB-SECTOR	CAMBIO - CRUCE RIO SECO	CRUCE RÍO SECO - HONDA
LONGITUD (KM)	38	5,8
ESTADO RECIBO	Vía sin pavimentar, ancho 4 a 6,5m, con tramos de 1 Km de plan 2500, márgenes abandonadas, con escasa señalización vertical en deficiente estado y tramos de señalización horizontal en regular estado (excepto tramos plan 2500), mínimas cunetas existentes, alcantarillas obstruidas, encoles y descoles colmatados, derrumbes permanentes y tránsito restringido a vehículos de carga superiores a 3 toneladas	Vía nacional pavimentada con póliza vigente
ACTIVIDADES REALIZADAS PARA PUESTA A PUNTO	Desmante inicial	
	Retiro de desmante	
	Retiro de basuras de márgenes	
	Remoción derrumbes	
	Limpieza drenajes	
	Accesos a puentes	Desmante de señalización vieja
		Reemplazo de señalización nueva
		Seguimiento tramo con pólizas
	Mantenimiento Rutinario	

Actividades de Mantenimiento Rutinario correspondientes al mes cubierto con este informe:

Tabla 8. Indicadores Unidad Funcional 4

RESUMEN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO POR UNIDADES FUNCIONALES			
INDICADOR	ACTIVIDAD	UNID.	4
E3-Fisuras	Sello de fisuras	ml	996.00
E6(Bach),E7(Hund)	Parcheo	m3	0.00
E8 - Estado de Márgenes, separador central, Área de Servicio y Corredor del Proyecto	Rocería manual	m2	440,620.00
	Rocería mecanizada	m2	0.00
	Limpieza de bermas	ml	3,190.00
	Limpieza de cicloruta	Km	0.00
	Retiro de material vegetal	m3	53.00
	Instalación de cerca	ml	25.00
	mantenimiento de cerca	ml	200.00
E10 - Drenajes superficiales, longitudinal y transversal	Limpieza cunetas	ml	7,490.00
	Limpieza zanjas de coronación	ml	260.00
	Limpieza canales	ml	160.00
	Limpieza obras	Und	14.00
	Retiro material de alcantarillas	m3	0.00
E11 - Señalización vertical	Limpieza y lavado señales verticales	Und	602.00
	Instalación de señales verticales	Und	7.00
	Retiro de señales verticales	Und	1.00
	Poda para despeje de señales vertical	ml	110.00
E12 - Señalización Horizontal	Marcas viales	m2	13.00
	Lineas blancas	ml	2,930.00
	Lineas amarillas	ml	1,750.00
	linea logaritmica	Und	0.00
	instalacion de tachas	Und	293.00
E13 - Barrera y Elementos de Contención	limpieza de captafaros	Und	478.00
	limpieza defensas metalicas	ml	2,432.28
	Retiro defensas metalicas	ml	0.00
	limpieza de new jersey	ml	200.00
	pintura de new jersey	m2	0.00
	instalacion reflectivos	Und	0.00
	instalacion captafaros	Und	53.00
O4 - Tiempo de atención de incidentes	Retiro de deslizamientos	m3	0.00
	Retiro obstaculos en la vía	m3	0.00
Otras Actividades	Transporte de material	m3	119.00
	Retiro material de margenes	m3	91.00
	Descargue de material de los taludes	m3	0.00
	Limpieza de puente vehicular	Und	5.00
	Instalacion de Bandas Alertadoras	ml	0.00
	Instalacion hitos tubulares	Und	1.00
	Instalacion hitos de arista	Und	0.00
	Instalacion doll	Und	1.00
	Pintura de barandas	ml	0.00
	Estabilización muro contención	m3	460.00
	Retiro de basuras	m3	5.50
	Instalación bordillos	ml	7.20
	Protección talud	m2	0.00

REGISTRO FOTOGRAFICO:


A partir del estado inicial del corredor recibido por parte de la ANI, el concesionario ha implementado un programa de mantenimiento rutinario en el cual se definen las principales actuaciones tendientes a la conservación y mantenimiento de la infraestructura vial, además de brindar adecuadas condiciones de seguridad a los usuarios del corredor y comunidad próxima al proyecto vial. A continuación, se presenta un registro fotográfico de las actividades de mantenimiento vial más importantes y relevantes, ejecutadas durante este mes.

	REGISTRO FOTOGRAFICO		F-08-03
			Versión: 04
			Fecha: 01-04-2016
PROYECTO VIAL GIRARDOT HONDA PUERTO SALGAR		UF No. 4	HOJA 17 DE 33
REGISTRO FOTOGRAFICO			
			
FOTOGRAFIA N°:		29	Mantenimiento rutinario
LUGAR:		PR 07+000 AL PR 15+000 UF4 RN 4509	
DESCRIPCION:		Instalación de tachas	

	REGISTRO FOTOGRAFICO		F-08-03
			Versión: 04
			Fecha: 01-04-2016
PROYECTO VIAL GIRARDOT HONDA PUERTO SALGAR		UF No. 4	HOJA 17 DE 33
REGISTRO FOTOGRAFICO			
			
FOTOGRAFIA N°:	30	Mantenimiento rutinario	

LUGAR:	PR 18+150 AL PR 17+350 UF4 RN 4509
DESCRIPCION:	Limpieza defensa metálica

	REGISTRO FOTOGRAFICO		F-08-03
			Versión: 04
			Fecha: 01-04-2016
PROYECTO VIAL GIRARDOT HONDA PUERTO SALGAR		UF No. 4	HOJA 19 DE 33
REGISTRO FOTOGRAFICO			
			
FOTOGRAFIA N°:	33	Mantenimiento rutinario	
LUGAR:		PR 34+790 UF4 RN 4509	
DESCRIPCION:		instalación señales verticales	

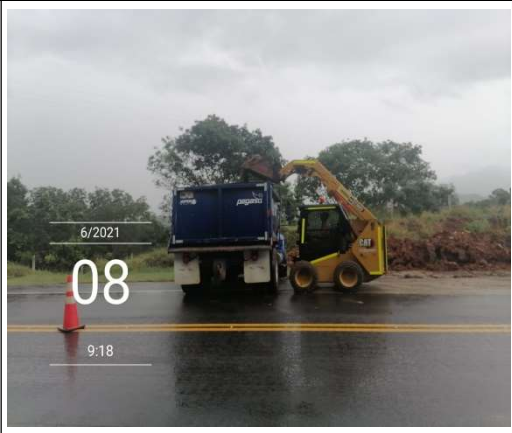	REGISTRO FOTOGRAFICO		F-08-03
			Versión: 04
			Fecha: 01-04-2016
PROYECTO VIAL GIRARDOT HONDA PUERTO SALGAR		UF No. 4	HOJA 19 DE 33
REGISTRO FOTOGRAFICO			
			
FOTOGRAFIA N°:	34	Mantenimiento rutinario	
LUGAR:		PR 12+920 UF4 RN 4509	
DESCRIPCION:		Retiro de material de zona lateral	

	REGISTRO FOTOGRAFICO		F-08-03
			Versión: 04
			Fecha: 01-04-2016
PROYECTO VIAL GIRARDOT HONDA PUERTO SALGAR		UF No. 4	HOJA 21 DE 33
REGISTRO FOTOGRAFICO			
 18 jun. 2021 8:20:51 a. m. Puerto Bogotá Guaduas Cundinamarca		 18 jun. 2021 8:27:41 a. m. 17-25 Calle 7 Honda Tolima	
FOTOGRAFIA N°:	38	Mantenimiento rutinario	
LUGAR:	UF4 RN 5008 GLORIETA PUERTO BOGOTA		
DESCRIPCION:	instalación doll		

	REGISTRO FOTOGRAFICO		F-08-03
			Versión: 04
			Fecha: 01-04-2016
PROYECTO VIAL GIRARDOT HONDA PUERTO SALGAR		UF No. 4	HOJA 22 DE 33
REGISTRO FOTOGRAFICO			
 23 jun. 2021 8:06:38 a. m. ML pr 17+800 uf 4 Número de índice: 123		 23 jun. 2021 9:42:39 a. m. ML pr 17+800 uf 4 Número de índice: 125	
FOTOGRAFIA N°:	40	Mantenimiento rutinario	
LUGAR:	PR 17+800 UF4 RN 4509		
DESCRIPCION:	Demarcación vial		

	REGISTRO FOTOGRAFICO		F-08-03
			Versión: 04
			Fecha: 01-04-2016
PROYECTO VIAL GIRARDOT HONDA PUERTO SALGAR		UF No. 4	HOJA 23 DE 33
REGISTRO FOTOGRAFICO			
			
FOTOGRAFIA N°:	42	Atención puntos críticos	
LUGAR:		PR 36+600 UF4 RN 4509	
DESCRIPCION:		Obra de estabilización quebrada cimarrona	

1.1.5 UNIDAD FUNCIONAL NO 5 (HONDA - DORADA)

UF No.	5
Sector	Honda - La Dorada
Intervención prevista	Rehabilitación, Mantenimiento y Construcción
Obras especiales	Construcción Nuevo puente en Puerto Salgar
Calzada	Sencilla
Longitud vía (km)	50,7
Longitud de puentes (m)	1880
Pre construcción (meses)	12
Construcción (meses)	36
Duración total (meses)	48
Duración total (años)	4



Se relaciona las actividades preliminares de Mantenimiento y Recuperación de la Calzada referentes a la unidad funcional 5

Tabla 9. Unidad funcional 5 Honda – Dorada

SUB-SECTOR	Ruta 45 Tramo 10 Honda - La Dorada	Ruta 45CLA Variante La Dorada	Accesos y nuevo Puente de Honda	Variante Purnio – El Korán
LONGITUD (KM)	30	3,6	0,7	16,6
ESTADO RECIBO	Vía nacional ancho 9 a 11 metros, con mantenimiento, pasivos ambientales en entrada a municipios por botaderos irregulares, con señalización vertical y horizontal borrada, cunetas existentes	Vía nacional pavimentada, tramo con daño de acueducto póliga existente en tramo de rígido en la variante a La Dorada		Sin construir
ACTIVIDADES REALIZADAS PARA PUESTA A PUNTO	Atención sitios críticos			
	Retiro de basuras de márgenes			
	Remoción de derrumbes			
	Limpieza de drenajes			
	Desmonte de señalización vieja			
	Instalación de señalización nueva			
	Limpieza de márgenes y prevención			
	Mantenimiento a señalización			
	Mantenimiento rutinario			

Actividades de Mantenimiento Rutinario correspondientes al presente mes:

Tabla 10. Indicadores Unidad funcional 5

RESUMEN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO POR UNIDADES FUNCIONALES			
INDICADOR	ACTIVIDAD	UNID	TOTAL
E3-Fisuras	Sello de fisuras	ml	0.00
E6(Bach),E7(Hund)	Parcheo	m3	0.00
E8 - Estado de Márgenes, separador central, Área de Servicio y Corredor del Proyecto	Rocería manual	m2	764,930.00
	Rocería mecanizada	m2	107,050.00
	Limpieza de bermas	ml	2,110.00
	Limpieza de cicloruta	Km	0.00
	Retiro de material vegetal	m3	9.00
	Instalación de cerca	ml	0.00
	mantenimiento de cerca	ml	0.00
	Limpieza cunetas	ml	9,660.00
E10 - Drenajes superficiales, longitudinal y transversal	Limpieza zanjas de coronación	ml	90.00
	Limpieza canales	ml	320.00
	Limpieza obras	Und	10.00
	Retiro material de alcantarillas	m3	0.00
E11 - Señalización vertical	Limpieza y lavado señales verticales	Und	679.00

RESUMEN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO POR UNIDADES FUNCIONALES			
INDICADOR	ACTIVIDAD	UNID	TOTAL
	Instalación de señales verticales	Und	2.00
	Retiro de señales verticales	Und	0.00
	Poda para despeje de señales vertical	ml	3,500.00
E12 - Señalización Horizontal	Marcas viales	m2	12.50
	Lineas blancas	ml	0.00
	Lineas amarillas	ml	0.00
	linea logaritmica	Und	0.00
	instalacion de tachas	Und	0.00
	limpieza de captafaros	Und	579.00
E13 - Barrera y Elementos de Contención	limpieza defensas metalicas	ml	3,898.00
	Retiro defensas metalicas	ml	32.00
	limpieza de new jersey	ml	0.00
	pintura de new jersey	m2	10.00
	instalacion reflectivos	Und	62.00
	instalacion captafaros	Und	239.00
O4 - Tiempo de atención de incidentes	Retiro de deslizamientos	m3	0.00
	Retiro obstaculos en la vía	m3	0.00
Otras Actividades	Transporte de material	m3	0.00
	Retiro material de margenes	m3	0.00
	Descargue de material de los taludes	m3	0.00
	Limpieza de puente vehicular	Und	7.00
	Instalacion de Bandas Alertadoras	ml	3.00
	Instalacion hitos tubulares	Und	19.00
	Instalacion hitos de arista	Und	1.00
	Instalacion doll	Und	0.00
	Pintura de barandas	ml	130.00
	Estabilización muro contención	m3	0.00
	Retiro de basuras	m3	2.50
	Instalación bordillos	ml	0.00
	Protección talud	m2	0.00

REGISTRO FOTOGRAFICO

A partir del estado inicial del corredor recibido por parte de la ANI, el concesionario ha implementado un programa de mantenimiento rutinario en el cual se definen las principales actuaciones tendientes a la conservación y mantenimiento de la infraestructura vial, además de brindar adecuadas condiciones de seguridad a los usuarios del corredor y comunidad próxima al proyecto vial. A continuación, se presenta un registro fotográfico de las actividades de mantenimiento vial más importantes y relevantes, ejecutadas durante este mes.

	REGISTRO FOTOGRAFICO		F-08-03
			Versión: 04
			Fecha: 01-04-2016
PROYECTO VIAL GIRARDOT HONDA PUERTO SALGAR		UF No. 5.1	HOJA 24 DE 33
REGISTRO FOTOGRAFICO			
			
FOTOGRAFIA N°:	43	Mantenimiento rutinario	
LUGAR:	PR 00+291 AL PR 00+304 UF5.1 RN 50CN04		
DESCRIPCION:	Pintura de baranda		

	REGISTRO FOTOGRAFICO		F-08-03
			Versión: 04
			Fecha: 01-04-2016
PROYECTO VIAL GIRARDOT HONDA PUERTO SALGAR		UF No. 5.1	HOJA 25 DE 33
REGISTRO FOTOGRAFICO			
			
FOTOGRAFIA N°:	45	Mantenimiento rutinario	
LUGAR:	PR 02+150 AL PR 03+200 UF5.1 RN 50CN04		
DESCRIPCION:	Roceria		

	REGISTRO FOTOGRAFICO		F-08-03
			Versión: 04
			Fecha: 01-04-2016
PROYECTO VIAL GIRARDOT HONDA PUERTO SALGAR		UF No. 5.2	HOJA 26 DE 33
REGISTRO FOTOGRAFICO			
			
FOTOGRAFIA N°:	47	Mantenimiento rutinario	
LUGAR:		PR 01+600 UF5.2 RN 4510	
DESCRIPCION:		Limpieza de cuneta	

	REGISTRO FOTOGRAFICO		F-08-03
			Versión: 04
			Fecha: 01-04-2016
PROYECTO VIAL GIRARDOT HONDA PUERTO SALGAR		UF No. 5.2	HOJA 26 DE 33
REGISTRO FOTOGRAFICO			
			
FOTOGRAFIA N°:	48	Mantenimiento rutinario	
LUGAR:		PR 04+410 AL PR 04+480 UF5.2 RN 4510	
DESCRIPCION:		Recolección de basuras	

	REGISTRO FOTOGRAFICO		F-08-03
			Versión: 04
			Fecha: 01-04-2016
PROYECTO VIAL GIRARDOT HONDA PUERTO SALGAR		UF No. 5.2	HOJA 27 DE 33
REGISTRO FOTOGRAFICO			
 8 jun. 2021 2:23:33 p. m.		 8 jun. 2021 3:26:24 p. m.	
FOTOGRAFIA N°:	50	Mantenimiento rutinario	
LUGAR:	PR 00+600 AL PR 08+800 MD UF5.2 RN 4510		
DESCRIPCION:	Retiro de material vegetal		

	REGISTRO FOTOGRAFICO		F-08-03
			Versión: 04
			Fecha: 01-04-2016
PROYECTO VIAL GIRARDOT HONDA PUERTO SALGAR		UF No. 5.2	HOJA 28 DE 33
REGISTRO FOTOGRAFICO			
			
FOTOGRAFIA N°:	52	Mantenimiento rutinario PR 32+900 UF5.2 RN 4510 Instalación bandas alertadoras	
LUGAR:			
DESCRIPCION:			

	REGISTRO FOTOGRAFICO		F-08-03
			Versión: 04
			Fecha: 01-04-2016
PROYECTO VIAL GIRARDOT HONDA PUERTO SALGAR		UF No. 5.4	HOJA 30 DE 33
REGISTRO FOTOGRAFICO			
			
FOTOGRAFIA N°:	56	Mantenimiento rutinario	
LUGAR:	UF5.4 RN 45CLB peaje brisas		
DESCRIPCION:	instalación y reposición tachones		

	REGISTRO FOTOGRAFICO		F-08-03
			Versión: 04
			Fecha: 01-04-2016
PROYECTO VIAL GIRARDOT HONDA PUERTO SALGAR		UF No. 5.4	HOJA 32 DE 33
REGISTRO FOTOGRAFICO			
			
FOTOGRAFIA N°:	59	Mantenimiento rutinario	
LUGAR:	PRM 06+290 AL PR 06+770 UF5.4 RN 45CLB		
DESCRIPCION:	Limpieza de alcantarillas		

1.1.6 CUADRO DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES:

Tabla 11. Cumplimiento de Indicadores de Mantenimiento Junio 2021

CUMPLIMIENTO DE MEDICIÓN DE INDICADORES DE JUNIO 2021.	
INDICADOR	CUMPLIMIENTO
E1-IRI	PENDIENTE POR ATENCIÓN
E2-Ahuellamiento	PENDIENTE POR ATENCIÓN
E3-Fisuras	100%
E4 – Coeficiente de fricción transversal	100%
E5 – Textura	100%
E6 - Baches	100%
E7-Hundimientos	PENDIENTE POR ATENCIÓN
E8 - Estado de Márgenes, separador central, Área de Servicio y Corredor del Proyecto	100%
E10 - Drenajes superficiales, longitudinal y transversal	100%
E11 - Señalización vertical	100%
E12 - Señalización vertical	100%
E13 - Barrera y Elementos de Contención	100%
E14 – Iluminación	100%
E15- Puentes	100%
E16 – Capacidad Estructural	PENDIENTE POR ATENCIÓN
E17 – Disponibilidad de la vía	100%

1.2 OBRAS EJECUTADAS FASE DE CONSTRUCCION

Las obras de construcción finalizaron en el mes de enero de 2021, Sin embargo, en nuestro corredor vial se han venido ejecutando trabajos de reparación a la carpeta asfáltica resultado del proceso de mantenimiento en aras del cumplimiento de los indicadores

1.3 CONTROL DE CALIDAD

En los anexos se presentan los resultados de ensayos de laboratorio realizados a los materiales dispuestos durante el periodo del mes de Junio de 2021 en los trabajos de mantenimiento, sin embargo se informa al interventor que los resultados de ensayos de laboratorio de los trabajos ejecutados por MHC se entregaran en el informe del mes de JULIO de 2021.

2 INFORMES TECNICOS

2.1 TRASLADO DE REDES

2.1.1 REDES ELECTRICAS

Tabla 12 Traslado redes Eléctricas.

GESTION DE ACTIVIDADES DE REDES											
AREA DE INTERFERENCIA DE REDES ELECTRICAS											
No.	TIPO DE RED	OPERADORES	UNIDADES FUNCIONALES					CONVENIO FIRMADO	ESTADO CONVENIO		OBSERVACIONES
			UF1	UF2	UF3	UF4	UF5		FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	
1	ENERGIA	CHEC grupo epm						SI	11/11/2016	11/11/2020	Firmado entre las partes
2		EEC						SI	05/05/2016	05/05/2019	Firmado entre las partes
3		ENERTOLIMA						SI	16/05/2016	FINALIZADO	Firmado entre las partes

2.1.2 REDES HUMEDAS

Tabla 13 Traslado de redes Húmedas.

GESTION DE ACTIVIDADES DE REDES											
AREA DE INTERFERENCIA DE REDES HUMEDAS											
No.	TIPO DE RED	OPERADORES	UNIDADES FUNCIONALES					CONVENIO FIRMADO	ESTADO CONVENIO		OBSERVACIONES
			UF1	UF2	UF3	UF4	UF5		FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	
1	HUMEDAS	ACUAGYR S.A. ESP						SI	13/02/2017	13/02/2020	Firmado entre las partes
2		ALCALDIA NARIÑO						SI	08/11/2016	08/11/2019	Firmado entre las partes
3		ALCALDIA GUATAQUI						SI	13/12/2016	13/12/2019	Firmado entre las partes
4		ALCALDIA BELTRAN						SI	08/11/2016	08/11/2019	Firmado entre las partes
5		ALCALDIA SAN JUAN DE RIO SECO						SI	25/10/2017	25/10/2020	Firmado entre las partes
6		MUNICIPIO DE GUADUAS.						NO			A pesar de que la alcaldía de Guaduas de Cundinamarca, se abstuvo de suscribir un convenio de cooperación, todas las obras ejecutadas por el
	AGUAS DEL CAPIRA S.A. ESP										

GESTION DE ACTIVIDADES DE REDES											
AREA DE INTERFERENCIA DE REDES HUMEDAS											
No.	TIPO DE RED	OPERADORES	UNIDADES FUNCIONALES					CONVENIO FIRMADO	ESTADO CONVENIO		OBSERVACIONES
			UF1	UF2	UF3	UF4	UF5		FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	
											concesionario fueron recibidas a satisfacción por el operador de red (Aguas de Capira S.A. ESP).
7		EMPOCALDAS S.A. ESP						SI	04/01/2017	04/01/2020	Firmado entre las partes
8		EMPRESA SERVICIOS PUBLICOS PUERTO SALGAR						NO APLICA			No requiere convenio; en común acuerdo con el operador por ser una interferencia en el K10+850 de la UF5.4 la actividad se realizara a través de una suscripción de acta de obra.

2.1.3 REDES DE HIDROCARBUROS

Tabla 14 Traslado de redes de Hidrocarburos.

GESTION DE ACTIVIDADES DE REDES											
AREA DE INTERFERENCIA DE REDES HIDROCARBUROS											
No.	TIPO DE RED	OPERADORES	UNIDADES FUNCIONALES					CONVENIO	ESTADO CONVENIO		OBSERVACIONES
			UF1	UF2	UF3	UF4	UF5		FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	
1	GASODUCTO Y GAS DOMICILIARIO	ALCANOS DE COLOMBIA S.A. ESP.						SI	19/07/2017	19/07/2020	Firmado entre las partes
2		Trasportadora de Gas Internacional S.A. ESP - TGI S.A. ESP						SI	27/11/2016	27/11/2019	Firmado entre las partes
3		TURGAS.						NO APLICA			No requiere convenio por respuesta de Turgas, informando que los 2 tramos de interferencia están a más de 2,5 metros y se encuentra protegido.
4	POLIDUCTO	ECOPETROL S.A						SI	04/04/2016	04/04/2019	Firmado entre las partes

GESTION DE ACTIVIDADES DE REDES											
AREA DE INTERFERENCIA DE REDES HIDROCARBUROS											
No.	TIPO DE RED	OPERADORES	UNIDADES FUNCIONALES					CONVENIO	ESTADO CONVENIO		OBSERVACIONES
			UF1	UF2	UF3	UF4	UF5		FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	
5		PACIFIC RUBIALES ENERGY						SI	16/08/2017	16/08/2020	Firmado entre las partes

2.1.4 REDES DE FIBRA OPTICA

Tabla 15 Traslado de redes de Fibra Optica.

GESTION DE ACTIVIDADES DE REDES										
AREA DE INTERFERENCIA DE REDES TELEMATICA										
No.	TIPO DE RED	OPERADORES	UNIDADES FUNCIONALES					CONVENIO	OBSERVACIONES	
			UF1	UF2	UF3	UF4	UF5			
1	FIBRA ÓPTICA	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.						NO APLICA	Los traslados de la red fibra óptica de operador CABLEMAS TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. se realizaran una vez se realice los traslados de redes eléctricas en el sector. Movimiento a cargo del operador.	
2		CLARO COLOMBIA S.A. (Girardot)						NO APLICA	Los traslados de la red fibra óptica de operador CLARO COLOMBIA S.A. se realizaran una vez se realice los traslados de redes eléctricas en el sector. Movimiento a cargo del operador.	
3		CLARO COLOMBIA S.A. (La Dorada)						NO APLICA	En último diseño constructivo a la nueva glorieta Norcasia no hay interferencias con las redes de fibra óptica de EDATEL S.A. ESP.	
4		EDATEL S.A. ESP (Medellín)						NO APLICA	Los traslados de la red fibra óptica de operador MEDIA COMMERCE S.A. se realizaran una vez se realice los traslados de redes eléctricas en el sector. Movimiento a cargo del operador.	
5		MEDIA COMMERCE S.A.						NO APLICA	Convenio para firma entre las partes. Las obras ejecutadas por el concesionario fueron recibidas a satisfacción por el operador de red.	
6		Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP (TELEFONICA MOVISTAR)						NO		

GESTION DE ACTIVIDADES DE REDES									
AREA DE INTERFERENCIA DE REDES TELEMATICA									
No.	TIPO DE RED	OPERADORES	UNIDADES FUNCIONALES					CONVENIO	OBSERVACIONES
			UF1	UF2	UF3	UF4	UF5		
7		SOCIEDAD ALFA TV DORADA & CIA S.A.						NO APLICA	Los traslados de la red fibra óptica de operador SOCIEDAD ALFA TV DORADA & CIA S.A. se realizaran una vez se realice los traslados de redes eléctricas en el sector. Movimiento a cargo del operador.
8		TELEVISION AZTECA, S.A. DE C.V.						NO APLICA	Los traslados de la red fibra óptica de operador TELEVISION AZTECA S.A. DE C.V. se realizaran una vez se realice los traslados de redes eléctricas en el sector. Movimiento a cargo del operador.
9		UFINET COLOMBIA S.A.						NO APLICA	Los traslados de la red fibra óptica de operador UFINET COLOMBIA S.A. se realizaran una vez se realice los traslados de redes eléctricas en el sector. Movimiento a cargo del operador.

Las redes de Fibra Óptica están instaladas en Colombia en su mayoría a partir del año 2012. Las redes o activos que hayan sido instaladas en las fajas o zonas reservadas a que se refiere la Ley 1228 de 2008 con posterioridad a su promulgación, caso en el cual, el prestador y/u operador deberá asumir los costos asociados a la protección, traslado o reubicación.

A los Operadores de Red de Fibra Óptica que asumen los costos a la protección, traslado o reubicación; tiene el convenio por uso de sus infraestructuras con las empresas de Energía por lo que se les entrega copia de los diseños Eléctricos aprobados.

El Operador de Red Colombia de Telecomunicaciones S.A. ESP (TELEFONICA MOVISTAR) cuenta con Redes de Cobre y Fibra Óptica; porque los costos asociados a la protección, traslado o reubicación están a cargo del Concesionario.

2.1.5 AVANCE TRASLADO REDES ELÉCTRICAS EN JUNIO 2021

El avance de redes electricas en las unidades funcionales 1, 2, 4 y 5, se encuentran al 100%, por tal motivo no se presentan tablas correspondientes, solo se presenta las redes ejecutadas en el presente mes correspondiente a la maniobra en la Escuela Campo Alegre con un avance del 35%.

Tabla 5 Traslado de Redes Eléctricas UF3

ABSCISADO			DISTANCIA [m]	TIPO DE RED [KV]	FECHA LIBERACIÓN DE PREDIO	FIBRA ÓPTICA	FECHA ORDEN DE TRABAJO	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	OBSERVACIÓN
UNIDAD FUNCIONAL	INICIAL	FINAL							
UF3	47+030	47+320	290	13.2	DISPONIBLE	NO	20/05/2021	19/07/2021	En programación con centro de control CODENSA Bogotá

		REGISTRO FOTOGRAFICO		F-08-03	
				Versión: 04	
				01/04/2016	
PROYECTO VIAL GIRARDOT HONDA PUERTO SALGAR			UF No. 3		HOJA <u>1</u> DE <u>1</u>
REGISTRO FOTOGRAFICO					
					
					
FOTOGRAFIA N°:		1,2,3, Y 4	FECHA		Junio 2021
LUGAR:			UF3 - K47+030 al K47+320 – Escuela Campo Alegre - Sector GUATAQUI		
DESCRIPCION:			Actividades de Excavación para cimentación e hincado de postes de la Infraestructura - Red Eléctrica – Operador CODENSA ENEL		

2.1.6 AVANCE TRASLADO REDES HÚMEDAS EN JUNIO 2021

El avance de redes húmedas en las unidades funcionales 2, 3, 4 y 5, se encuentran al 100%, por tal motivo no se presentan tablas correspondientes.

2.1.7 TRASLADO REDES ELÉCTRICAS PENDIENTES POR EJECUTAR

Redes eléctricas por ejecutar se presentan en la unidad funcional 3.

Tabla 16 Traslado de Redes Electricas Pendientes UF3

ABSCISADO									
UNIDAD FUNCIONAL	INICIAL	FINAL	DISTANCIA [m]	TIPO DE RED [KV]	FECHA LIBERACIÓN DE PREDIO	FIBRA ÓPTICA	FECHA ORDEN DE TRABAJO	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	OBSERVACIÓN
UF3	47+030	47+320	290	13.2	DISPONIBLE	NO	20/05/2021	16/07/2021	En programación con centro de control CODENSA Bogotá

2.1.8 TRASLADO REDES HÚMEDAS PENDIENTES POR EJECUTAR

Las Redes húmedas presentan un avance del 100% en todas las unidades funcionales

2.1.9 REDES POR TRAMOS A INTERVENIR POR UNIDAD FUNCIONAL

Unidad Funcional 1

jun-21										
Facilidad	Operador	UF1								
		Total UF1		Ejecutado Acumulado Mes Anterior		Ejecutado Durante el Presente mes		Avance Acumulado		Proyección Julio
		Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	
Energía	Enertolima	4.80	100%	4.80	100%	0.00	0%	4.80	100%	0.00%

Nota: Las redes eléctricas de ENERTOLIMA se ejecutaron en su totalidad cumpliendo los diseños aprobados por el operador.

Las redes de Fibra Óptica (Media Commerce – Tv Azteca) el Avance Acumulado es cero; ya que por Ley 1228 de 2008 los traslados son del Operador y por no ser de ejecución directa al proyecto no se registra Avance.

Unidad Funcional 2

jun-21										
Facilidad	Operador	UF2								
		Total UF2		Ejecutado Acumulado Mes Anterior		Ejecutado Durante el Presente mes		Avance Acumulado		Proyección Julio
		Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	%
Energía	EEC-CODENSA	27.65	100%	27.65	100%	0.00	0%	27.65	100%	0.00%
Gasoducto	Alcanos de Colombia	1.63	100%	1.63	100%	0.00	0%	1.63	100%	0.00%
Humedas	Acuagyr	7.06	100%	7.06	100%	0.00	0%	7.06	100%	0.00%
Humedas	Alcaldía Nariño	8.38	100%	8.38	100%	0.00	0%	8.38	100%	0.00%
Humedas	Alcaldía Guataqui	10.94	100%	10.94	100%	0.00	0%	10.94	100%	0.00%

Nota: se ajustan longitudes definitivas con los operadores de redes húmedas con Alcaldía Nariño y Alcaldía Guataqui. Las longitudes acumuladas están acordes con las actas suscritas con la interventoría y el operador.

Las redes de Fibra Óptica (Claro Colombia – Tv Azteca) el Avance Acumulado es cero; ya que por Ley 1228 de 2008 los traslados son del Operador y por no ser de ejecución directa al proyecto no se registra Avance.

Unidad Funcional 3

jun-21										
Facilidad	Operador	UF3								
		Total UF3		Ejecutado Acumulado Mes Anterior		Ejecutado Durante el Presente mes		Avance Acumulado		Proyección Julio
		Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	%
Energía	EEC-CODENSA	25.94	100%	25.65	98.9%	0.10	0.4%	25.75	99.3%	0.7%
Gasoducto	Alcanos de Colombia	3.75	100%	3.75	100%	0.00	0%	3.75	100%	0.00%
Humedas	Alcaldía Guataqui	4.70	100%	4.70	100%	0.00	0%	4.70	100%	0.00%

jun-21										
Facilidad	Operador	UF3								
		Total UF3		Ejecutado Acumulado Mes Anterior		Ejecutado Durante el Presente mes		Avance Acumulado		Proyección Julio
		Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	%
Humedas	Aguas de Beltran	6.51	100%	6.51	100%	0.00	0%	6.51	100%	0.00%
Humedas	Alcaldía San Juan de Rioseco	0.08	100%	0.08	100%	0.00	0%	0.08	100%	0.00%

Nota: Las longitudes acumuladas están acorde con las actas suscritas con la interventoría y el operador.

Se realiza ajuste en los traslados totales con los operadores de redes eléctricas y húmedas por mayores cantidades de obra; se ajustan los avances reales ejecutados y faltantes al 31 de marzo del 2021.

- CODENSA: Longitud inicial 23.34km; longitud final 25.937km
- Alcaldía de Guataqui: Longitud inicial 1.01km; longitud final 4.70km
- Aguas de Beltran: Longitud inicial 6.25km; longitud final 6.51km

Las redes de Fibra Óptica (Tv Azteca) el Avance Acumulado son cero; ya que por Ley 1228 de 2008 los traslados son del Operador y por no ser de ejecución directa al proyecto no se registra Avance.

El cumplimiento en las proyecciones para el siguiente mes por tipo de red en la unidad funcional 3 depende de la programación con centro de control CODENSA Bogotá.

Las Redes Eléctricas con el operador EEC-CODENSA, presenta un avance del 99.3%.

Unidad Funcional 4

jun-21										
Facilidad	Operador	UF4 CONDICIÓN INICIAL								
		Total UF4		Ejecutado Acumulado Mes Anterior		Ejecutado Durante el Presente mes		Avance Acumulado		Proyección Julio
		Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	%
Energía	EEC- CODENSA	6.08	100%	6.08	100%	0.00	0%	6.08	100%	0.00%
Energía	ENERTOLIMA	5.86	100%	5.86	100%	0.00	0%	5.86	100%	0.00%
Fibra Óptica	Colombia de Telecomunicaciones	1.30	100%	1.30	100%	0.00	0%	1.30	100%	0.00%
Gasoducto	Alcanos de Colombia	4.02	100%	4.02	100.00%	0.00	0%	4.02	100%	0.00%
Humedas	Alcaldía San Juan de Rioseco	0.33	100%	0.33	100%	0.00	0%	0.33	100%	0.00%

Humedas	Aguas del Capira	4.46	100%	4.46	100.00%	0.00	0%	4.46	100%	0.00%
---------	------------------	------	------	------	---------	------	----	------	------	-------

jun-21										
Facilidad	Operador	UF4 EXCLUYENDO PASO URBANO PUERTO BOGOTÁ								
		Total UF4		Ejecutado Acumulado Mes Anterior		Ejecutado Durante el Presente mes		Avance Acumulado		Proyección Julio
		Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	%
Energía	EEC- CODENSA	5.64	100%	5.64	100%	0.00	0%	5.64	100%	0.00%
Energía	ENERTOLIMA	5.53	100%	5.53	100%	0.00	0%	5.53	100%	0.00%
Fibra Óptica	Colombia de Telecomunicaciones	1.30	100%	1.30	100%	0.00	0%	1.30	100%	0.00%
Humedas	Alcaldía San Juan de Rioseco	0.33	100%	0.33	100%	0.00	0%	0.33	100%	0.00%
SE EXCLUYE PASO URBANO DE PUERTO BOGOTÁ DE LA TABLA DE CANTIDADES DE: CODENSA, ENERTOLIMA Y ALCALDIA SAN JUAN DE RIO SECO EN EL TRASLADO DE REDES Y EL VALOR EXCLUIDO SERA SUMADO A LA UF5										

DISMINUCIÓN INTERFERENCIA ----- PASA A LA UF5			
OPERADOR	CANTIDAD INICIAL ESTIMADA EN KM	DESCUENTO EN KM	CANTIDAD FINAL EN KM
CODENSA	6.08	0.44	5.64
ENERTOLIMA	5.86	0.33	5.53
ALCANOS COLOMBIA	4.02	4.02	0.00
AGUAS DEL CAPÍRA	3.45	3.45	0.00

Nota: Las longitudes acumuladas están acorde con las actas suscritas con la interventoría y el operador.

Las cantidades pertenecientes al traslado de redes en el paso urbano de Puerto Bogotá corregimiento de Guaduas – Cundinamarca de la UF4 pasaran hacer parte de la UF5.

Se realiza ajuste en los traslados totales con el operador de redes húmedas en el sector de puerto bogota por mayores cantidades de obra; se ajustan los avances reales ejecutados al 30 de noviembre del 2019.

- Aguas de capira: Longitud inicial 3.45km; longitud final 4.456km.

Las redes de Fibra Óptica (Claro de Colombia – Ufinet) el Avance Acumulado es cero; ya que por Ley 1228 de 2008 los traslados son del Operador y por no ser de ejecución directa al proyecto no se registra Avance.

Con la red de Fibra Óptica de Colombia de Telecomunicaciones (Telefónica Movistar) tendrá porcentaje de Avance Acumulado; ya que tiene redes de cobre y fibra óptica (telefonía) instaladas antes del 2008.

El traslado y/o protección de todas las redes de la unidad funcional 4 presentan avance del 100%.

Unidad Funcional 5

jun-21										
Facilidad	Operador	UF5 CONDICIÓN INICIAL								
		Total UF5		Ejecutado Acumulado Mes Anterior		Ejecutado Durante el Presente mes		Avance Acumulado		Proyección Julio
		Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	%
Energía	EEC- CODENSA	0.71	100%	0.71	100%	0.00	0%	0.71	100%	0.00%
Energía	ENERTOLIMA	1.36	100%	1.36	100%	0.00	0%	1.36	100%	0.00%
Energía	CHEC	2.30	100%	2.30	100.00%	0.00	0%	2.30	100%	0.00%
Fibra Óptica	Colombia de Telecomunicaciones	3.80	100%	3.80	100.00%	0.00	0%	3.80	100%	0.00%
Gasoducto	Alcanos de Colombia	1.72	100%	1.72	100.00%	0.00	0%	1.72	100%	0.00%
Gasoducto	TGI	0.55	100%	0.55	100%	0.00	0%	0.55	100%	0.00%
Humedas	Empocaldas	2.48	100%	2.48	100.00%	0.00	0%	2.48	100%	0.00%
Humedas	Empresa Servicios Publicos Puerto Salgar	0.160	100%	0.16	100%	0.00	0%	0.16	100%	0.00%
Polieducto	Ecopetrol	1.72	100%	1.61	94%	0.00	0%	1.61	94%	0.00%
Polieducto	Pacific	0.09	100%	0.09	100%	0.00	0%	0.09	100%	0.00%

jun-21										
Facilidad	Operador	UF5 INCLUYENDO REDES DE PUERTO BOGOTA								
		Total UF5		Ejecutado Acumulado Mes Anterior		Ejecutado Durante el Presente mes		Avance Acumulado		Proyección Julio
		Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	%
Energía	EEC- CODENSA	1.15	100%	1.15	100%	0.00	0%	1.15	100%	0.00%
Energía	ENERTOLIMA	1.69	100%	1.69	100%	0.00	0%	1.69	100%	0.00%
Energía	CHEC	2.30	100%	2.30	100.00%	0.00	0%	2.30	100%	0.00%
Fibra Óptica	Colombia de Telecomunicaciones	3.80	100%	3.80	100.00%	0.00	0%	3.80	100%	0.00%
Gasoducto	Alcanos de Colombia	5.74	100%	5.74	100.00%	0.00	0%	5.74	100%	0.00%
Gasoducto	TGI	0.55	100%	0.55	100%	0.00	0%	0.55	100%	0.00%
Humedas	Empocaldas	2.48	100%	2.48	100.00%	0.00	0%	2.48	100%	0.00%

jun-21										
Facilidad	Operador	UF5 INCLUYENDO REDES DE PUERTO BOGOTA								
		Total UF5		Ejecutado Acumulado Mes Anterior		Ejecutado Durante el Presente mes		Avance Acumulado		Proyección Julio
		Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	%
Humedas	Empresa Servicios Publicos Puerto Salgar	0.16	100%	0.16	100%	0.00	0%	0.16	100%	0.00%
Humedas	Aguas del Capira	4.46	100%	4.46	100.00%	0.00	0%	4.46	100%	0.00%
Polieducto	Ecopetrol	1.72	100%	1.61	94%	0.00	0%	1.61	94%	0.00%
Polieducto	Pacific	0.09	100%	0.09	100%	0.00	0%	0.09	100%	0.00%
SE INCLUYEN LAS CANTIDADES A TRASLADAR DE LAS REDES PERTENECIENTES A PUERTO BOGOTÁ DE LOS OPERADORES CODENSA, ENERTOLIMA, AGUAS DEL CAPIRA Y ALCANOS DE COLOMBIA										

INCLUSIÓN DE CANTIDADES A LA UF5			
OPERADOR	CANTIDAD INICIAL ESTIMADA EN KM	AUMENTO EN KM	CANTIDAD FINAL EN KM
CODENSA	0.71	0.44	1.15
ENERTOLIMA	1.36	0.33	1.69
ALCANOS COLOMBIA	1.72	4.02	5.74
AGUAS DEL CAPIRA	0	4.46	4.46

Nota: Las longitudes acumuladas están acorde con las actas suscritas con la interventoría y el operador.

Las cantidades correspondientes al traslado de redes en el paso urbano de Puerto Bogotá corregimiento de Guaduas - Cundinamarca se excluyeron de la UF4 y pasaron hacer parte de la UF5.

Se realiza ajuste en los traslados totales con los operadores de redes húmedas y de hidrocarburos por mayores cantidades de obra; se ajustan los avances reales ejecutados al 29 de febrero del 2020.

- Aguas de capira: Longitud inicial 3.45km; longitud final 4.456km
- Empocaldas: Longitud inicial 2.04km; longitud final 2.48km
- Ecopetrol: Longitud inicial 1.486km; longitud final 1.716km

Las redes de Fibra Óptica (Cablemas Telecomunicaciones - Claro de Colombia – Edatel – Sociedad AlfaTV – Tv Azteca - Ufinet) el Avance Acumulado es cero; ya que por Ley 1228 de 2008 los traslados son del Operador y por no ser de ejecución directa al proyecto no se registra Avance.

Las redes Poliducto del operador ECOPETROL se registra un Avance Acumulado al 94% correspondiente a la actividad de protección en los sectores K3+190 en Naranjos, K5+980

en Mayaca, K8+530 en Hato Kalakali, K9+670, Glorieta Dindal Guaduro y Glorieta Norcasia; el 6% restante forman parte de la directriz de la interventoría y la ANI de no estar de acuerdo de proteger (cambio de recubrimiento) tubería JET DUCTO 6". en el cruce de vía y el paralelismo.

Con la red de Fibra Óptica de Colombia de Telecomunicaciones (Telefónica Movistar) registra un avance del 100%, correspondiente a las protecciones de tubería que se realiza en la unidad funcional 5.

La red de Gasoducto (Alcanos de Colombia) registra avance acumulado del 100%; correspondiente a los traslados en la UF5.

Las Redes Eléctricas con los operadores EEC-CODENSA, ENERTOLIMA y CHEC presentan un avance del 100%, en la unidad funcional 5.

Tabla 17 Trazabilidad de comunicaciones de Cartas Enviadas.

TRAZABILIDAD DE COMUNICACIONES					
Trazabilidad a las respuestas, conforme a las observaciones realizadas se presenta tabla de información de los comunicados enviados y las respuestas recibidas de las diferentes empresas.					
Fecha Radicación	Comunicado o Acta	De	Para	Asunto	Red
15/06/2021	ACTA DE REUNIÓN	CONCESION ALTO MAGDALENA S.A.S.	CODENSA ENEL	Comité técnico a los avances al convenio de cooperación entre CODENSA ENEL y la Concesión Alto Magdalena. Conciliación maniobras ejecutadas en el año 2019 con el Ingeniero William Laiton.	ELÉCTRICA

2.1.10 ACTAS DE OBRA EJECUTADA

Tabla 18 Actas de Obra Y Procesos de Aprobación

RESUMEN GENERAL OBRAS EJECUTADAS REDES ELECTRICAS, REDES HUMEDAS, RED TELEMATICOS, RED DE GAS Y REDES DE HIDROCARBUROS								
ACTA N°	RED ELÉCTRICA	REDES HÚMEDAS		RED HIDROCARBUROS	RED TELEMATICOS	RED GAS	TOTAL ACTA	OBSERVACIÓN
		RED ACUEDUCTO	RED ALCANTARILLADO					
1	\$ 736,059,842	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 736,059,842	APROBADA Y CANCELADO
2	\$ 827,851,795	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 827,851,795	APROBADA Y CANCELADO
3	\$ 443,194,941	\$ 790,382,111	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,233,577,052	APROBADA Y CANCELADO
4	\$ 509,873,192	\$ 171,217,203	\$ -	\$ 31,508,681	\$ -	\$ -	\$ 712,599,076	APROBADA Y CANCELADO
5	\$ 805,202,624	\$ 264,228,919	\$ -	\$ 465,117,441	\$ -	\$ -	\$ 1,534,548,984	APROBADA Y CANCELADO
6	\$ 209,979,880	\$ 268,849,120	\$ -	\$ 803,321,971	\$ -	\$ -	\$ 1,282,150,971	APROBADA Y CANCELADO
7	\$ 809,681,311	\$ 140,252,012	\$ 241,367,656	\$ 1,004,553,005	\$ -	\$ -	\$ 2,195,853,984	APROBADA Y CANCELADO
8	\$ 403,575,838	\$ 66,632,757	\$ 46,994,741	\$ 816,347,519	\$ -	\$ -	\$ 1,333,550,855	APROBADA Y CANCELADO
9	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,527,462,551	\$ -	\$ -	\$ 2,527,462,551	APROBADA Y CANCELADO
10	\$ 918,602,296	\$ 1,158,839,580	\$ 533,714,922	\$ 2,818,942,498	\$ -	\$ -	\$ 5,430,099,296	APROBADA Y CANCELADO
11	\$ 913,399,195	\$ 287,197,410	\$ 613,178,927	\$ 1,894,183,641	\$ -	\$ -	\$ 3,707,959,173	APROBADA Y CANCELADO
12	\$ 575,044,400	\$ 972,503,015	\$ 304,802,771	\$ 659,889,784	\$ -	\$ -	\$ 2,512,239,970	APROBADA Y CANCELADO
13	\$ 262,481,294	\$ 302,063,774	\$ 325,537,114	\$ -	\$ 128,617,199	\$ 15,929,282	\$ 1,034,628,663	APROBADA PENDIENTE FONDEO
14	\$ 580,550,884	\$ -	\$ -	\$ 488,928,729	\$ 78,122,274	\$ 24,621,139	\$ 1,172,223,026	APROBADA PENDIENTE FONDEO
15	\$ 214,546,560	\$ -	\$ -	\$ 823,813,576	\$ -	\$ -	\$ -	APROBADA PENDIENTE FONDEO
16	\$ -	\$ 466,667,835	\$ 122,932,740	\$ -	\$ 32,306,414	\$ -	\$ 621,906,989	APROBADA PENDIENTE FONDEO

2.2 MANEJO Y GESTION AMBIENTAL

2.2.1 LICENCIAS AMBIENTALES

En la siguiente tabla se relacionan las licencias ambientales con las que cuenta el proyecto:

Tabla 19 Licencias Ambientales

UF	ACTO ADMINISTRATIVO	FECHA	AUTORIDAD QUE LO APRUEBA
1	Resolución 1685 por la cual se otorga la Licencia Ambiental	24/12/2015	Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA)
	Resolución 895 por la cual se aclara la Res 1685	18/08/2016	
	Resolución 265 por la cual se modifica la Resolución 1685	13/03/2017	
4.1	Resolución 660 por la cual se otorga la Licencia Ambiental	20/06/2016	Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA)
	Resolución 1032 por la cual se aclara la Res 660	16/09/2016	
	Resolución 897 por la cual se aclara la Res 660	18/08/2016	
	Resolución 02471 por la cual se aclara la Res 660	18/12/2020	
5.4	Resolución 1684 por la cual se otorga la Licencia Ambiental	24/12/2015	Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA)
	Resolución 975 por la cual se modifica la Resolución 1684	29/06/2018	

Fuente: Concesión Alto Magdalena S.A.S., 2021

En la siguiente tabla se relacionan los Informes de Cumplimiento Ambiental – ICA entregados a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA y Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca:

Tabla 20 Entrega Informes de Cumplimiento Ambiental ICA

UF	ICA	FECHA	RADICADO ANLA /VITAL	RADICADO ALMA
1	1	18-10-2016	3500900745219816032	ALMA-2016-0003607
	2	26-05-2017	3500900745219817012	ALMA-2017-1971
	3	27-03-2018	2018035607-1-000	ALMA-2018-0894
	4	29-08-2018	2018118727-1-000	ALMA-2018-3362
	5	16-01-2019	2019003528-1-000	ALMA-2019-00086
		25-01-2019	2019007915-1-000	ALMA-2019-0272
		13-05-2019	2019061289-1-000	ALMA-2019-01659
	6	06-06-2019	2019076728-1-000	ALMA-2019-01675
	7	21-10-2019	2019169877-1-000	ALMA-2019-03270
	8	25-02-2020	2020029083-1-000	ALMA-2020-0519
		11-05-2020	2020072512-1-000	ALMA-2020-1284
3	1	30-10-2020	20201169239	ALMA-2020-2701
4.1	1	06-04-2017	3500900745219817010	ALMA-2017-1043
	2	26-05-2017	3500900745219817013	ALMA-2017-2070
	3	09-08-2017	3500900745219817019	ALMA-2017-3045
	4	27-02-2018	2018022000-1-000---3500900745219818008	ALMA-2018-0302

UF	ICA	FECHA	RADICADO ANLA /VITAL	RADICADO ALMA
	5	26-06-2018	3500900745219818021	ALMA-2018-1079
	6	27-09-2018	2018134927-1-000	ALMA-2018-3531
	7	23-10-2018	2018148386-1-000	ALMA-2018-3671
	8	15-03-2019	2019032162-1-000	ALMA-2019-2016
	9	03-07-2019	2019091781-1-000	ALMA-2019-1239
	10	07-08-2019	2019109979-1-000	ALMA-2019-2324
	11	18-09-2019	2019141966-1-000	ALMA-2019-02933
	12	27-04-2020	2020064051-1-000	ALMA-2020-0833
		09-06-2020	2020090832-1-000	ALMA-2020-1545
		05-08-2020	2020126054-1-000	ALMA-2020-1983
	13	07-10-2020	2020174809-1-000	ALMA-2020-2561
	14	23-10-2020	2020187947-1-000	ALMA-2020-2654
	15	18-06-2021	Sin recibir radicado a la fecha	ALMA-2021-0915
5.4	1	01-11-2017	3500900745219817025	ALMA-2017-4326
			3500900745219817026	
	2	11-07-2018	3500900745219818028	ALMA-2018-2538
	3	17-12-2018	2018175600-1-000	ALMA-2018-4380
		10-01-2019.	2019001309-1-000	ALMA-2018-4380
	4	27-05-2019	201919069458-1-000	ALMA-2018-01647
	5	17-07-2020	2020114925-1-000	ALMA-2020-1848
	6	29-12-2020	2020232902-1-000	ALMA-20203199
	7	21-07-2021	2021148728-1-000	ALMA-2021-1066

Fuente: Concesión Alto Magdalena S.A.S., 2021

En la siguiente tabla se relacionan los Autos de control y seguimiento remitido por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA:

Tabla 21 Autos de Control y Seguimiento – ANLA

UF	FECHA	AUTO	RESPUESTA AUTO	
			CORRESPONDENCIA	RADICADO ANLA
1	21-03-2017	Auto No. 825	ALMA-2019-00537	No. 2019015352-1-000 del 12-02-2019
	28-11-2018	Auto No. 7431		
	26-09-2019	Auto No. 08192	ALMA-2020-1134	No. 2020069459-1-000 del 05-05-2020
	25-10-2018	Auto No. 6551	ALMA-2019-00537	No. 2019015352-1-000 del 12-02-2019
	16-07-2020	Acta de reunión No 158 control y seguimiento actividades PMA	-	-

UF	FECHA	AUTO	RESPUESTA AUTO	
			CORRESPONDENCIA	RADICADO ANLA
	16-09-2020	Auto No. 09099. Declara iniciada la fase desmantelamiento y abandono	ALMA-2021-0479	20210519-15-1-000 del 24-03-2021
	02-10-2020	Auto No. 09667	-	-
	31-03-2021	Auto No. 1814	-	-
4.1	10-09-2018	Auto No. 05681	ALMA-2018-3907	No. 2018140925-1-000 del 10-09-2018
	30-12-2019	Auto No. 11982	ALMA-2020-2782	2020198650-1-000 del 11-11-2020
	14-08-2020	Acta de reunión No 220 control y seguimiento actividades PMA	ALMA-2021-0276	2021025871-1-000 del 16-02-2021
	23-03-2021	Acta de reunión No. 70 control y seguimiento actividades PMA	-	-
5.4	25-10-2018	Auto No. 6563	ALMA-2018-4810	No. 2019000018-1-000 del 10-09-2018
	26-07-2019	Acta reunión No 89 control y seguimiento actividades PMA	ALMA-2020-1848	No. 2020114925-1-000 del 17-07-2020
	03-04-2020	Auto No. 2692		
	24-04-2020	Auto 3386	ALMA-2020-2591	2020178685-1-000 del 14-10-2020
	11-11-2020	Auto No. 10765	-	-

Fuente: Concesión Alto Magdalena S.A.S., 2021

2.2.2 CAMBIOS MENORES

En la siguiente tabla se relacionan los cambios generados a las licencias ambientales con las que cuenta el proyecto.

Tabla 22 Cambios menores Licencias Ambientales

UF	TIPO DE TRAMITE	ENTIDAD QUE OTORGA	ESTADO DE TRAMITE	OBSERVACIONES
1	Licencia Ambiental	ANLA	OBRAS HIDRÁULICAS	El 27 de Julio de 2016 mediante radicado ALMA-2016-2504 (Radicado ANLA No.2016042577-1-000), se realizó cambio menor para el ajuste a las dimensiones de la estructura hidráulica para el manejo de aguas lluvia ubicada en el K0+014 del eje 8 (Topacio), teniendo en cuenta que se autorizó una alcantarilla de 0,90 y se requiere un Box de 3m x 2,50m. Mediante comunicado ALMA-R-2016-2152 del 19 de agosto de 2016 (Radicado ANLA No. 2016049831-2-000) la autoridad solicito información adicional al cambio menor, la cual fue

UF	TIPO DE TRAMITE	ENTIDAD QUE OTORGA	ESTADO DE TRAMITE	OBSERVACIONES
				radicada mediante ALMA-2016-2504 el 15 de septiembre de 2016 (Radicado ANLA No. 2016058196-1-000. Sin pronunciamiento.
				El 08 de agosto de 2016 mediante radicado ALMA-2016-2648 (Radicado ANLA No.2016046622-1-000), se realizó cambio menor para ajustar las dimensiones de la obra hidráulica ubicada en el K1+858 cuerpos de agua innominados, teniendo en cuenta que fue autorizado un Box Culvert de 1,20 m x 1,20 m y se requiere un Box Culvert de 3,00 m x 3,00 m. Sin pronunciamiento.
			PUENTE FLANDES	Mediante comunicado ALMA-2017-0143 el 13 de enero de 2017 se radica cambio menor al ANLA (Radicado ANLA No. 2017002786-1-000), en donde se relacionan las alternativas contractivas de la pila 2 teniendo en cuenta que por nivel freático solo se logró llegar a los 15m y se debe llegar a los 20). Sin pronunciamiento.
				Mediante comunicado ALMA-2017-0471 el 03 de febrero de 2017 se radica cambio menor al ANLA (Radicado ANLA No. 2017007452199817006), para la inclusión de seis pilotes adicionales, tres en cada costado, cambio menor que fue aprobado por el ANLA mediante comunicado ALMA-R-2017 el 17 de marzo de 2017 (Radicado ANLA 2017017232-2-000).
				Mediante comunicado ALMA-2017-1255 el 04 de abril de 2017 se radica nuevamente cambio menor ante la ANLA (Radicado ANLA No.2017024414-1-000) para la inclusión de dos pilotes laterales adicionales en la Pila 2, uno en cada costado, cambio menor aprobado mediante ALMA-R-2017-2245 el 07 de Julio de 2017 (Radicado ANLA 2017049732-2-000).
				Mediante comunicado ALMA-2017-3587 el 04 de septiembre de 2017, se radica nuevamente cambio menor ante el ANLA (2017071950-1-000) para la inclusión de un pilote adicional en la pila 2, cambio menor aprobado mediante comunicado ALMA-2017-3946 el 8 de noviembre de 2017 (Radicado ANLA 2017093165-2-000).
4.1	Licencia Ambiental	ANLA	Cambio menor UF 4.1	El 06 de octubre de 2016 mediante radicado ALMA-2016-3472 (Radicado ANLA No.2016064527-1-000), se realizó cambio menor para ajustar la ubicación de la infraestructura asociada dentro de la finca La Cajita.

UF	TIPO DE TRAMITE	ENTIDAD QUE OTORGA	ESTADO DE TRAMITE	OBSERVACIONES
				El 07 de noviembre de 2017 mediante radicado ALMA-2017-4559, se radica cambio menor para el uso de las plantas de la Cajita en las unidades Funcionales 3 y 5, mediante radicado ANLA No. 2017095325-1-000. Mediante radicado ANLA No. 2017117370-2-000 del 19 de diciembre de 2017 (Radicado Interno ALMA-R-2017-4416) aprueba el suministro de materiales pétreos del campamento la Cajita para las unidades funcionales 3 y 5. Se realiza la solicitud con radicación ALMA-20192826, sobre el pronunciamiento de fondo para calificar como menor o giro ordinario, la actividad de exclusión de la infraestructura asociada a la finca La Cajita del plan de cierre y abandono que se adelanta en el marco de la resolución 660 del 20 de junio de 2016, del proyecto “Unidad Funcional 4 subsector 1interconexión Cambio”. Mediante comunicación a ANLA-2019188644-2-000, se da respuesta a la radicación ALMA-20192826, donde se especifica que se debe dar cumplimiento a lo estipulado en la Licencia ambiental y se niega el cambio menor de la infraestructura asociada.
5.4	Licencia Ambiental	ANLA	Cambio menor UF 5.4	El 12 de junio de 2017, se realiza cambio menor para el ajuste del alineamiento de la vía en el tramo comprendido entre el K1+820 al K2+300. Mediante radicado vital 3500900745219817016. Mediante radicado ANLA No. 2017055615-2-000 del 24 de julio de 2017 la Agencia Nacional de Licencias Ambientales realiza el pronunciamiento, para la aprobación del cambio menor. El 04 de octubre de 2017, se radica cambio menor para la instalación temporal de una planta dosificadora de concreto móvil en el K6+900, Costado derecho de la Unidad funcional 5.4, mediante radicado ANLA No. 20174091063512. Mediante radicado ANLA No. 2017101714-2-000 22 de noviembre de 2017 la Agencia Nacional de Licencias Ambientales realiza el pronunciamiento, para la aprobación del cambio menor. Mediante comunicado ALMA-2018-4281 con radicado ANLA No. 2018158630-1-000, se solicitó la ampliación del tiempo de operación de la planta móvil dosificadora de concreto, aprobada mediante cambio menor ANLA No 201710714-2-0000 del 22 de noviembre de 2017. Sin embargo mediante comunicado ALMA-R-2019-0283 con radicado ANLA 2019010703-2-000, la ANLA determino que no es procedente acceder a dicha petición. El 26 de diciembre de 2018, mediante el comunicado ALMA-2018-4720, Radicado ANLA 2018185136-1-000, se radico el

UF	TIPO DE TRAMITE	ENTIDAD QUE OTORGA	ESTADO DE TRAMITE	OBSERVACIONES
				cambio menor para variar los permisos de ocupaciones de cauce dentro de la Licencia Ambiental Resolución 1684 de 2015. Consecuentemente la ANLA, mediante radicado 2019031153-2-00 del 13 de marzo de 2019 (ALMA-R-2019-0661), aprobó como cambio menor a doce (12) de las dieciocho (18) obras hidráulicas a las cuales se le modificara la sección hidráulica; así mismo considero que la eliminación o suspensión de las veinticinco (25) obras de drenaje, no se considera como modificación menor o ajuste normal dentro del giro ordinario en la actividad licenciada; razón por la cual se consideró que el cambio menor se encuentra parcialmente aprobado. Con base a lo anterior mediante la comunicación ALMA-2020-0834 del 25 de marzo de 2020, la concesión presento la justificación técnica e hidráulica del cambio solicitado para las seis (6) obras restantes, negadas en el citado cambio menor, incluyendo también una justificación más amplia y detallada de la no construcción de las veinticinco (25) obras de drenaje, que no fueron consideradas como cambio menor; todo ello en cumplimiento a lo requerido por el Acta de Reunión No. 89 del 26 de julio de 2019. Siendo así se está a la espera del pronunciamiento de la autoridad ambiental.

Fuente: Concesión Alto Magdalena S.A.S., 2021

2.2.3 PERMISOS DE APROVECHAMIENTO FORESTAL

En la siguiente tabla se relacionan los permisos de aprovechamiento forestal otorgados y en trámite del proyecto.

Tabla 23 Permisos de Aprovechamiento

UF	ACTO ADMINISTRATIVO	TRAMO	AUTORIDAD QUE LO APRUEBA
1	Resolución No. 1685 24 de diciembre de 2015	Construcción y Operación de la Variante Flandes	Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA)
2	Resolución No. 0038 25 de abril de 2016	Mejoramiento tramo Girardot-Guataquí, incluye construcción de ciclo ruta.	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca- CAR-Girardot
	Informe tecnico. 0884 de 9 de octubre 2017	Se autoriza el aprovechamiento forestal de 21 árboles municipio de Guataquí km 25+282	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca- CAR-Girardot

UF	ACTO ADMINISTRATIVO	TRAMO	AUTORIDAD QUE LO APRUEBA
	Informe tecnico 0385 junio 05 del 2018	Se autoriza el aprovechamiento forestal de de 31 árboles municipio de Guataquí km 5+000	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca- CAR-Girardot
3	Resolución No. 128 21 de diciembre de 2015	Mejoramiento sector Guataquí – Cambao	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca- CAR Vianí
	Resolución No. 0560 octubre 18 de 2017	Mejoramiento sector Guataquí – Cambao	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca- CAR Vianí
4.1	Resolución No. 660 de junio 20 de 2016	Interconexión vial Cambao K87+330 a K88+440	Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA)
4.2	Resolución No. 013 de mayo 05 de 2016	Mejoramiento del tramo de vía de Cambao - Puerto Bogotá	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca- CAR-Vianí
	Resolución N° 0061 de mayo 03 de 2016, con inicio de solicitud de prorroga por el auto 0732 de agosto 9 de 2019	Mejoramiento del tramo de vía de Cambao - Puerto Bogotá	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca- Guaduas
5.1	Resolución N° 193 20 de junio del 2018 Mediante Resolución N° 202 del 28 de junio de 2018 se aclara la resolución 193.	Glorieta Puerto Bogotá	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca- Guaduas
	Resolución N° 0274 de agosto 29 de 2018, con aclaración por medio de la resolución. N° 0202 de 28 junio de 2018	Glorieta Nuevo Puente de Honda - costado oriental Puerto Bogotá	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca- Guaduas
	Informe técnico N°12 del 13 de junio del 2019.	Puerto Bogota.	Alcaldia de Guaduas
	Autorización N° 54 del 11 de junio del 2019.	Puerto Bogota.	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca-Guaduas
	Autorización N° 12 del 3 de marzo del 2020	Puerto Bogota, glorieta costado oriental nuevo puente de Honda	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca-Guaduas
5.2	Resolución No. 1408 de mayo 20 de 2016	Mantenimiento y Rehabilitación de la vía Honda y Dorada	CORTOLIMA
	Resolución No. 157 del 01 de julio de 2016	Sector faja de protección de la quebrada Galleras, Municipio de Dorada	CORPOCALDAS
	Prorroga resolución No. 2018-1535 de junio 27 de 2018		
	Aclaratoria resolución 2558 de octubre 17 de 2018		
	Aclaratoria resolución 2693 de Noviembre 2 de 2018		

UF	ACTO ADMINISTRATIVO	TRAMO	AUTORIDAD QUE LO APRUEBA
	Prorroga Resolución 2020-1496 del 30 de septiembre del 2020		
	Resolución N°.158 01 julio de 2016	Sector faja de protección de la quebrada Doradita, Municipio de Dorada	CORPOCALDAS
	Aclaratoria de la resolución 1537 de Junio 27 de 2018		
	Aclaratoria resolución 2559 de octubre 17 de 2018		
	Prorroga Resolución 2020-1495 del 30 de septiembre del 2020		
	Resolución N° 159 del 01 de julio de 2016	Sector faja de protección de la quebrada Burras, Municipio de Dorada	CORPOCALDAS
	Prórroga de la resolución N°. 1536 de junio 27 de 2018		
	Aclaratoria resolución N°2560 de octubre 17 de 2018		
	Prorroga Resolución 2020-1474 del 28 de septiembre del 2020		
	Resolución N° 160 de 18 julio de 2018 18 julio de 2018	Sector faja de protección del rio Guarino	CORPOCALDAS
	Prórroga resolución No. 1737 de Julio 18 de 2018		
	Resolución 2019-0079 de enero 14 de 2019, prorrogada por medio de la Resolución 2020-1453 del 25 de septiembre del 2020	Andenes pasó urbano Municipio de Dorada. El concesionario mediante la comunicación ALMA-2020-0121 del 16 de enero de 2020 realiza la solicitud de prorroga a la resolución en mención. Con certificado de entrega por correspondencia certificada No. 700031706114. El concesionario mediante la comunicación ALMA-2020-0565 del 24 de febrero realizó el pago por solicitud de prorroga de la presente resolución con el comprobante de pago No 120020028.	CORPOCALDAS
	Resolución 386 de junio 17 de 2016 Prorroga Resolución No. 2019-0113 de enero 17 de	Área de servicio k18+000, Area de servicio	CORPOCALDAS

UF	ACTO ADMINISTRATIVO	TRAMO	AUTORIDAD QUE LO APRUEBA
	2019 y Aclaratoria Resolución No.2019-0851 de abril 2 de 2019		
	Resolución 2019-0494 de febrero 18 de 2019, , prorrogada por Resolución 2020-1452 del 25 de septiembre	Intersección Puente actual Puerto Salgar Costado Occidental (Glorieta NORCASIA). El concesionario con la comunicación ALMA-2020-0122 del 16 de enero de 2020 realiza la solicitud de prorroga de la Resolución en mención, por correspondencia certificada No. 700031705416	CORPOCALDAS
	Resolución No. 1627 de jul 05 de 2018, prorrogada por Resolución 2020-1571 del 13 octubre del 2020.	Intersección Melisa Municipio de Dorada. El concesionario mediante la comunicación ALMA-2020-0524 del 18 de febrero de 2020, entrega un avance de las actividades de aprovechamiento forestal de esta resolución, documento remitido por correspondencia certificada No. 70032721893.	CORPOCALDAS
	Resolución N° 2618 de septiembre 4 de 2018	Acceso al puente del rio Guarino (k9+580 - k9+700) Intersección del nuevo puente de Honda - Costado Occidental (K3+240 - k 3+480)	CORTOLIMA
	Acta de visita del 13 de julio de 2020	Quebrada Pericos	CORTOLIMA
5.4	Resolución N° 1684 de diciembre 24 de 2015, modificada por la resolución N° 0975 de junio 29 de 2018	Vía Honda -La Dorada ruta 4510 con la vía Puerto Salgar - El Koran 4510, incluye puente nuevo	Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA)

Fuente: Concesión Alto Magdalena S.A.S., 2021

2.2.4 LEVANTAMIENTO DE VEDAS

A continuación, se mencionan los actos administrativos mediante los cuales se aprueban los levantamientos de veda para el proyecto.

Tabla 24 Levantamiento de Vedas

UNIDAD FUNCIONAL	ACTO ADMINISTRATIVO	FECHA	AUTORIDAD QUE LO APRUEBA
1	Aprobado a través de la Resolución 1701	17 de julio de 2015	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
2	Aprobado a través de la Resolución 1928	2 de septiembre de 2015	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
3	Aprobado a través de la Resolución 2280	30 de octubre de 2015	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
4.1	Aprobado a través de la Resolución 2129 (Corredor vial)	30 de septiembre de 2015	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
	Aprobado a través de la Resolución 817 (Fuente de material La Cajita)	24 de mayo de 2016	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
4.2	Aprobado a través de la Resolución 2601	18 de diciembre de 2015	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
5.2	Aprobado a través de la Resolución 2602	18 de diciembre de 2015	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
5.4	Aprobado a través de la Resolución 2284	3 de noviembre de 2015	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
	Aprobado a través de la Resolución 1082	13 de junio del 2018	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Fuente: Concesión Alto Magdalena S.A.S., 2021

2.2.5 PAGAS

A continuación, se presentan los PAGA con los que cuenta el proyecto y la correspondiente No Objeción que otorga la Interventoría.

Tabla 25 PAGAS

UNIDAD FUNCIONAL	APROBACIÓN	FECHA	AUTORIDAD QUE LO APRUEBA
2	N° CI.004/GP0225/15/7.18	10 de agosto de 2015	Interventoría
3	N° CI.004/GP0283/15/7.18	07 de septiembre de 2015	Interventoría
4.2	N° CI.004/GP0283/15/7.18	07 de septiembre de 2015	Interventoría
5.1	N° CI.004/GP8641/20/7.1.8	17 de noviembre de 2020	Interventoría
5.2	N° CI.004/GP0283/15/7.18	07 de septiembre de 2015	Interventoría
Operación y Mantenimiento	N° CI.004/GP05720/15/7.18	14 de diciembre de 2018	Interventoría

Fuente: Concesión Alto Magdalena S.A.S., 2021

2.2.6 PERMISOS DE OCUPACION DE CAUCES

En la siguiente tabla se relaciona el número de ocupaciones de cauce otorgadas y en trámite por cada unidad funcional.

Tabla 26 Permisos de Ocupación de Cauces

UF	OTORGADAS	EN TRÁMITE	PORCENTAJE DE AVANCE
2	Se han otorgado 88 ocupaciones de cauce por parte de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca- CAR- Alto Magdalena -Girardot	N/A	100%
3	Se han otorgado 65 ocupaciones de cauce por parte de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, Regional Alto Magdalena y Magdalena Centro, CAR-Girardot y Vianí.	Se relacionan los tramites en proceso: Desistimientos Negados: 4 Obras ajustadas: 11	95%
4.2	Se han otorgado 77 ocupaciones de cauce por parte de la Corporación Autónoma de Cundinamarca, Regional Bajo Magdalena - CAR- Guaduas.	Se relacionan los tramites en proceso: Ajustes: 9 Desistimientos: 2 Duplicidad: 9 Resuelve recurso de reposición y/o archiva expediente: 6	90 %
5.2	La unidad funcional cuenta con la totalidad de las ocupaciones de cauce, las cuales fueron otorgadas por Corpocaldas mediante Resolución 355 (08-06-2016). Por medio de la Resolución 2107 (27-08-2018) se modifica un permiso ambiental. Corpocaldas emitió el Auto No. 2021-0092 del 20 de enero que aprueba las obras construidas y archiva el expediente 2904-284	Burras,	100%
		Puente Doradita	100%
		Galleras	100%
		Guarino	100%

Fuente: Concesión Alto Magdalena S.A.S., 2021

2.2.7 ARQUEOLOGIA

El proyecto se encuentra en la fase de implementación del Plan de Manejo Arqueológico, el cual requiere de una aprobación por parte del ICANH:

Tabla 27 Arqueología por Unidad Funcional

UNIDAD FUNCIONAL	ACTO ADMINISTRATIVO	FECHA
UF 1	Aprobada la ejecución de Plan de Manejo Arqueológico de la Autorización No. 5640 por parte del Instituto Colombiano de Antropología e Historia – ICANH Con la comunicación ICANH 130-3891-14/05/2021 No. Recibido 3449 (Radicado interno ALMA-R-2021-0621 del 19-05-2021) el ICANH aprueba el informe final de la autorización de Intervención Arqueológica No. 5640 y se da cumplimiento a las obligaciones contraídas en la licencia arqueológica citado.	01 de abril de 2016
UF 2		
UF 3		20 de abril de 2016
UF. 4.1		

UNIDAD FUNCIONAL	ACTO ADMINISTRATIVO	FECHA
UF 4.2	Aprobada la Ejecución de Plan de Manejo Arqueológico de la Autorización No. 5681 por parte del Instituto Colombiano de Antropología e Historia - ICANH	
UF 5.2		
UF 5.2		
UF 5.4		
Campamentos Zodmes	Prospección Arqueológica para las áreas anexas del Corredor Honda- Puerto Salgar- Girardot	18 de marzo de 2016

Fuente: Concesión Alto Magdalena S.A.S., 2021

2.2.8 CRUCE AEREO SOBRE EL RIO MAGDALENA

El corredor vial atraviesa en varios momentos al río Magdalena como se observa en la siguiente tabla.

Tabla 28 Cruce aéreo y obras fluviales por Unidad Funcional

UNIDAD FUNCIONAL	ACTO ADMINISTRATIVO	FECHA	OBSERVACIONES
UF 1	Resolución 016	28 de marzo de 2016	Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena – CORMAGDALENA
UF 2	Resolución 020 (Modificada por la Resolución 374 del 06/10/2016, modificada por la Resolución 150 del 09 de junio de 2017) Resolución 0126 del 21 de mayo de 2020. Por medio de la cual se modifican parcialmente las Resoluciones No.374 de 2016 y 150 de 2017 modificatorias de la Resolución No. 20 de 2016 proferidas por Cormagdalena y se toman otras determinaciones.	26 de marzo de 2016	Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena – CORMAGDALENA. Mediante la comunicación ALMA-2020-0527 del 19 de febrero, solicitó a esta autoridad, la modificación de las Resolución 020 de 2016, (modificada por la Resolución 0374 del 06/10/2016, modificada por la Resolución 150 del 09/06/2017). Mediante la comunicación ALMA-2020-1783 del 08 de julio de 2020, se da cumplimiento a la obligación establecida en el artículo segundo de la Resolución No. 000126 del 21 de Mayo de 2020.
UF 4.2	Resolución 020 (Modificada por la Resolución 374 del 06/10/2016, modificada por la Resolución 150 del 09 de junio de 2017). Resolución 0126 del 21 de mayo de 2020. Por medio de la cual se modifican parcialmente las Resoluciones No.374 de 2016 y 150 de 2017 modificatorias de la Resolución No. 20 de 2016 proferidas por Cormagdalena y se toman otras determinaciones.	26 de marzo de 2016	Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena – CORMAGDALENA Mediante la comunicación ALMA-2020-0527 del 19 de febrero, solicitó a esta autoridad, la modificación de las Resolución 020 de 2016, (modificada por la Resolución 0374 del 06/10/2016, modificada por la Resolución 150 del 09/06/2017). Mediante la comunicación ALMA-2020-1783 del 08 de julio de 2020, se da cumplimiento a la obligación establecida

UNIDAD FUNCIONAL	ACTO ADMINISTRATIVO	FECHA	OBSERVACIONES
			en el artículo segundo de la Resolución No. 000126 del 21 de Mayo de 2020.
UF 5.4	Resolución 021	29 de marzo de 2016	Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena – CORMAGDALENA

Fuente: Concesión Alto Magdalena S.A.S., 2021

2.2.9 SUSTRACCIÓN DMI LAGUNA DE COCO Y CUCHILLA DE SAN ANTONIO

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR realiza mediante el Acuerdo No 16 del 21 de mayo de 2019, una modificación del artículo tercero (3) del Acuerdo 019 del 21 de 21 julio de 2016, en el cual se sustraen siete (7) punto cero cuatro hectareas (7.04 Ha) del Distrito de Manejo Integrado Cuchilla de San Antonio y Laguna de Coco.

2.2.10 ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS

A continuación, se relacionan las actividades ejecutadas para este periodo en la fase de operación y mantenimiento:

2.2.11 CAPACITACIONES Y/O CHARLAS

A continuación, se presentan las capacitaciones realizadas en este periodo por parte de los contratistas que están realizando actividades constructivas en el corredor vial.

Tabla 29. Capacitaciones y/o charlas personal de la concesión

UF	FECHA	LUGAR	TEMA	EMPRESA	ASISTENTES
1,2,3, 4 Y 5	29/06/2021	Corredor vial	Biodiversidad y su importancia, fauna silvestre, bosque seco tropical, reflexión y acciones frente al panorama ambiental	ALMA	23
1,2,3, 4 Y 5	29/06/2021	Corredor vial	Manejo de residuos líquidos domésticos e industriales	ALMA	23
4	8/06/2021	PR 22+900	Orden, aseo y limpieza, interacción con el medio ambiente	MECO	24
4	17/06/2021	PR 22+330	Interacción del medio ambiente en las obras	MECO	25
4	25/06/2021	PR 23+000	Orden, aseo y limpieza como medio para evitar el contacto con especies que circulan las áreas de trabajo	MECO	26

Fuente: Concesión Alto Magdalena S.A.S., 2021

2.2.12 PROVEEDORES

A continuación, se detalla el suministro de materiales de construcción, adquisición de agua en bloque y disposición de material de excavación de los contratistas que han realizado actividades constructivas en la etapa de operación y mantenimiento del corredor vial.

Tabla 30. Cantidades Adquiridas material pétreo UF 4.2 y 5.2

UF	CONTRATISTA	CLASE DE MATERIAL	FUENTE	VOLUMEN (m3)	ACTO ADMINISTRATIVO
4.2	COPOLSA	Arena	Agregados La Punta	57	Título minero AG2-101. Resolución 1737 del 1 de junio de 2010
		Triturado		132	

Fuente: Concesión Alto Magdalena S.A.S., 2021

Tabla 31. Volumen agua en bloque UF 4.2 y 5.2.

UF	CONTRATISTA	FUENTE	VOLUMEN (m³)	ACTO ADMINISTRATIVO
4.2	COPOLSA	HONDA TRIPLE A	60	Resolución 1822 del 30 de diciembre de 2005

Fuente: Concesión Alto Magdalena S.A.S., 2021

Tabla 32. Volumen de los residuos líquidos generados

UF	UNIDADES INSTALADAS	EMPRESA	VOLUMEN (M3)	ACTO ADMINISTRATIVO	PROVEEDOR
5	2	MECO	0,500	Resolución 1559 de 2016	SAYA

Fuente: Concesión Alto Magdalena S.A.S., 2021

2.2.13 APROVECHAMIENTO FORESTAL

A continuación, se relaciona el volumen de material aprovechado:

Tabla 33 Aprovechamiento forestal

JURISDICCIÓN	Actos Administrativos	UNIDAD FUNCIONAL	# Individuos Licenciados	Volumen Total Licenciado M³	Volumen Comercial Licenciado M³	# individuos Talados	Volumen Total Aprovechado M3	Volumen Comercial Aprovechado M3	ÁRBOLES POR TALAR	% Avance
ANLA (CAR-CUNDINAMARCA - DIRECCIÓN REGIONAL ALTO MAGDALENA - CORTOLIMA)	Resolución No. 1685 de diciembre 24 de 2015	1 - PAVCOL	3593	542.52	324.77	3366	503.23	301.75	227	93.68%

AVANCE DE APROVECHAMIENTO FORESTAL POR UNIDADES FUNCIONALES Y CONSTRUCTORES										
JURISDICCIÓN	Actos Administrativos	UNIDAD FUNCIONAL	# Individuos Licenciados	Volumen Total Licenciado M³	Volumen Comercial Licenciado M³	# individuos Talados	Volumen Total Aprovechado M3	Volumen Comercial Aprovechado M3	ÁRBOLES POR TALAR	% Avance
CAR-CUNDINAMARCA - DIRECCIÓN REGIONAL ALTO MAGDALENA	Resolución No. 0038 de abril 25 de 2016	2 - PAVCOL	8076	2891.13	1448.87	6066	2380.519	1504.8	2010	75.11%
		2 - MHC	4002	864.01	508.28	3736	761.88	521.38	266	93.35%
	AUTO 094 de 07 de febrero de 2018	2- PAVCOL	21	1,6	0,4	21	1,6	0,4	0	100.0%
	AUTO 521 de 07 de Junio de 2018		31	3,03	1,07	31	3,03	1,07	0	100.0%

AVANCE DE APROVECHAMIENTO FORESTAL POR UNIDADES FUNCIONALES Y CONSTRUCTORES										
JURISDICCIÓN	Actos Administrativos	UNIDAD FUNCIONAL	# Individuos Licenciados	Volumen Total Licenciado M ³	Volumen Comercial Licenciado M ³	# individuos Talados	Volumen Total Aprovechado M ³	Volumen Comercial Aprovechado M ³	ÁRBOLES POR TALAR	% Avance
TOTAL			12130	3759,77	1958,62	9857	3149,69	1683,467	2273	92,13%

AVANCE DE APROVECHAMIENTO FORESTAL POR UNIDADES FUNCIONALES Y CONSTRUCTORES										
JURISDICCIÓN	Actos Administrativos	UNIDAD FUNCIONAL	# Individuos Licenciados	Volumen Total Licenciado M ³	Volumen Comercial Licenciado M ³	# individuos Talados	Volumen Total Aprovechado M ³	Volumen Comercial Aprovechado M ³	ÁRBOLES POR TALAR	% Avance
CAR-CUNDINAMARCA - DIRECCIÓN REGIONAL MAGDALENA CENTRO	Resolución No. 128 de diciembre del 21 de 2015	3 - MHC	8347	2322.36	1099.37	8184	2285.47	1072.71	163	98.05%
	Prorroga Res. No. 0434 de junio 29 de 2017									
	Resolución No. 0560 del 18 de octubre de 2017	3 - MHC	2353	270.69	111.16	2353	270.69	111.16	0	100.0%
TOTAL			10700	2593,05	1210,53	10537	2556,16	1183,87	163	99.03%

AVANCE DE APROVECHAMIENTO FORESTAL POR UNIDADES FUNCIONALES Y CONSTRUCTORES										
JURISDICCIÓN	Actos Administrativos	UNIDAD FUNCIONAL	# Individuos Licenciados	Volumen Total Licenciado M ³	Volumen Comercial Licenciado M ³	# individuos Talados	Volumen Total Aprovechado M ³	Volumen Comercial Aprovechado M ³	ÁRBOLES POR TALAR	% Avance
CAR-CUNDINAMARCA - DIRECCIÓN REGIONAL MAGDALENA CENTRO	Licencia Ambiental con resolución 0660 del 20 de junio de 2016	4,1 - MHC	986	187.66	107.49	772	155.512	94.018	214	78.30%

AVANCE DE APROVECHAMIENTO FORESTAL POR UNIDADES FUNCIONALES Y CONSTRUCTORES										
JURISDICCIÓN	Actos Administrativos	UNIDAD FUNCIONAL	# Individuos Licenciados	Volumen Total Licenciado M³	Volumen Comercial Licenciado M³	# individuos Talados	Volumen Total Aprovechado M3	Volumen Comercial Aprovechado M3	ÁRBOLES POR TALAR	% Avance
CAR-CUNDINAMARCA - DIRECCIÓN REGIONAL MAGDALENA CENTRO	Resolución No. 013 del 5 de mayo de 2016	4.2 - MHC - VIANÍ	322	311.98	42.17	322	311.98	42.17	0	100.0%
		4.2 - MECO - VIANÍ	2232	796.92	214.39	2232	796.92	207.28	0	100.0%
	Resolución No. 061 de mayo 03 de 2016	4.2 MECO - GUADUAS	4643	1992,17	1078,51	4533	1901,445	1046,847	110	97,63%
TOTAL			7197	3101,07	1335,07	7087	3010,345	1296,297	110	99,21%

AVANCE DE APROVECHAMIENTO FORESTAL POR UNIDADES FUNCIONALES Y CONSTRUCTORES										
JURISDICCIÓN	Actos Administrativos	UNIDAD FUNCIONAL	# Individuos Licenciados	Volumen Total Licenciado M³	Volumen Comercial Licenciado M³	# individuos Talados	Volumen Total Aprovechado M3	Volumen Comercial Aprovechado M3	ÁRBOLES POR TALAR	% Avance
CAR-CUNDINAMARCA - DIRECCIÓN REGIONAL BAJO MAGDALENA	Resolución No. 202 de junio 28 de 2018	5,1 MECO - GUADUAS	81	19.94	8.83	77	17.81	7.82	4	95.06%
	Resolución No. 0274 de agosto 29 de 2018		207	34.36	13.32	0	0	0	207	0.00%
	Permiso UMATA Autoriza del 13-06-2019 - I. T Nº12		17	1.92	0.53	17	1.92	0.53	0	100.0%
	CAR Autorización Nº54 de julio 11 del 2019		3	0.21	0.059	3	0.21	0.059	0	100.0%
	CAR-DRBM Autorización Nº12 del 3 de marzo del 2020		13	3,1	1,429	13	3,1	1,429	0	100.0%
TOTAL			321	59,53	24,168	110	23,04	9,838	211	79,01%

AVANCE DE APROVECHAMIENTO FORESTAL POR UNIDADES FUNCIONALES Y CONSTRUCTORES										
JURISDICCIÓN	Actos Administrativos	UNIDAD FUNCIONAL	# Individuos Licenciados	Volumen Total Licenciado M³	Volumen Comercial Licenciado M³	# individuos Talados	Volumen Total Aprovechado M3	Volumen Comercial Aprovechado M3	ÁRBOLES POR TALAR	% Avance
CORTOLIMA	Resolución 1408 mayo 20 de 2016	5,2 - MECO	43	24.6	6.83	43	24.6	6.83	0	100.0%
CORTOLIMA	Resolución No. 2618 de septiembre 04 de 2018		79	153,14	87,16	63	128,12	75,44	16	79,75%
CORPOCALDAS	Resolución 160 de 01 de julio de 2016; prorrogada Resolución No. 1737 de 18 Julio de 2018 GUARINÓ		40	15,756	4,801	27	145	3,412	13	70,00%
	Resolución No. 2560 de octubre 17 de 2018, prorrogada mediante Resolución 2020-1474 del 28 de septiembre del 2020. BURRAS		51	67,68	38,08	49	54,08	29,44	2	96,08%
	Resolución No. 2559 de octubre 17 de 2018, prorrogada mediante Resolución 2020-1495 del 30 de septiembre del 2020. DORADITA		30	67,63	36,83	15	25,35	16,3	15	50,00%
	Resolución No 2558 de octubre 17 de 2018, prorrogada mediante Resolución 2020-1496 del 30 de septiembre del 2020. GALLERAS		37	94,45	52,87	5	11,19	6,25	32	13,51%
	Resolución 386 de junio 17 de 2016 – (Resolución 2019-0113 del 17 de enero de 2019), prorrogada mediante Resolución 2020-1548 del 7		85	84.81	38.514	39	21.38	7.13	46	44.32%

AVANCE DE APROVECHAMIENTO FORESTAL POR UNIDADES FUNCIONALES Y CONSTRUCTORES										
JURISDICCIÓN	Actos Administrativos	UNIDAD FUNCIONAL	# Individuos Licenciados	Volumen Total Licenciado M³	Volumen Comercial Licenciado M³	# individuos Talados	Volumen Total Aprovechado M3	Volumen Comercial Aprovechado M3	ÁRBOLES POR TALAR	% Avance
	de octubre del 2020. ÁREA DE SERVICIO									
	Resolución No.1627 de julio 5 de 2018, prorrogada mediante Resolución 2020-1571 del 13 de octubre del 2020. LA MELISA		27	40,81	18,14	16	6,48	2,23	11	70,37%
	Resolución 2019-0079 de 14 de Enero de 2019, prorrogada Resolución 2020-1453 del 25 de septiembre del 2020. ANDENES		182	55.08	15.69	85	21.43	6.06	97	46.70%
	Resolución 2019-0079 de 14 de enero de 2019; prorrogada por Resolución 2020-1453 del 25 de septiembre del 2020. ANDENES		165	50,905	16,442	141	44,2	15,7	24	85,45%
Div. Medio Ambiente - Alcaldía La Dorada	Resolución 2019-0494 de 18 de febrero de 2019, prorrogada por Resolución 2020-1452 del 25 de septiembre del 2020. NORCASIA	5,2 - MECO	36	57,08	13,95	36	57,1	14,0	0	100,00%
CORTOLIMA	Acta de Visita del 13-07-2020 (PQR-511-07/07/2020)	5,2 - MECO	7	4,42	1,48	7	4,4	1,5	0	100,00%
TOTAL			785	716,361	330,787	526	543,30	184,25	248	71,3%

AVANCE DE APROVECHAMIENTO FORESTAL POR UNIDADES FUNCIONALES Y CONSTRUCTORES

JURISDICCIÓN	Actos Administrativos	UNIDAD FUNCIONAL	# Individuos Licenciados	Volumen Total Licenciado M³	Volumen Comercial Licenciado M³	# individuos Talados	Volumen Total Aprovechado M3	Volumen Comercial Aprovechado M3	ÁRBOLES POR TALAR	% Avance
ANLA	Resolución No. 1684 del 24 de diciembre de 2015	5,4 INGEVIAS	962	1357.1	580.23	962	1357.1	1250.68	0	100.00%
		5,4 MECO	200	238.71	137.52	200	238.72	134.52	0	100.00%
ANLA	Licencia Ambiental con resolución 00975 del 29 de junio de 2018	5,4 - MECO	66	49.02	15.15	46	29.2	15.15	66	69.70%
		5,4 - INGEVIAS	266	246.39	57.97	237	219.03	219.03	29	89.10%
TOTAL			1494	1891.22	790.87	1445	1844.05	1619.38	95	89.70%
TOTAL, TODAS LAS UNIDADES FUNCIONALES			37206	12851,181	6082,305	33704	11785,32	6372,87	3548	87,8%

Fuente: Concesión Alto Magdalena S.A.S., 2021

2.2.14 COMPENSACIONES AMBIENTALES

A continuación, se relaciona las compensaciones ambientales:

Tabla 34 Compensaciones ambientales

UNIDAD FUNCIONAL	MEDIDA COMPENSATORIA	ÁREA REQUERIDA PARA COMPENSACIÓN	GESTIÓN PREDIAL O ÁREA DISPONIBLE PARA SIEMBRA	ÁREA SEMBRADA PARA COMPENSACIÓN	% AVANCE	CONTRATISTA	ESTADO
1	Plan Por Pérdida de la Biodiversidad	16,01	0	0	0%		Contrato en liquidación. Acción Verde había gestionado 16.01 ha en Coello. Se presentó a la Autoridad Ambiental, una solicitud para revisión del área intervenida, y la definición de área a compensar. Actualmente se realiza la búsqueda de áreas que puedan ser aptas para el cumplimiento de la medida compensatoria
	Plan por afectación Paisajística	2	1	1	50%	COINAM	1.0 ha sembrada sin mantenimiento. En proceso de gestión predial de la hectárea faltante, en proceso póliza de otrosí.
2	Aprovechamiento Forestal	178,41	80	80	100%	CUMPLIMIENTO AMBIENTAL	Establecimiento de 52.000 árboles como parte de la medida compensatoria de la Res. 038 del 2016. Actualmente el contratista terminó la siembra. Ya se realizó el segundo mantenimiento a la plantación

UNIDAD FUNCIONAL	MEDIDA COMPENSATORIA	ÁREA REQUERIDA PARA COMPENSACIÓN	GESTIÓN PREDIAL O ÁREA DISPONIBLE PARA SIEMBRA	ÁREA SEMBRADA PARA COMPENSACIÓN	% AVANCE	CONTRATISTA	ESTADO
							y se generó la GDB de la compensación.
			100	29.5	50%	ECOPLANNING	Contrato C-014-2020. Se continúa estableciendo el cerramiento perimetral y la producción en vivero. Se verifica en campo de labores de cerramiento.
	Ocupaciones de cauce	13,81	12,08	10.65	55.80%	ERA	En la UF2 hay 15.073 árboles de 93 expedientes reportados a la AAC. Conteo y revisión de compensaciones con una sobrevivencia de 8.411 árboles indicando una de mortalidad del 44.20 %
	Árboles en riesgo	0,28	0,28	0.19	67.7%	COINAM	Área para establecimiento definida. En proceso de contratación
	Ap. Forestales árboles en categoría especial	7,6	7,6	0	0%	ECOPLANNING	Contrato C-014-2019. Medición de polígonos en el predio Tolú Alto. Inicio de siembras. Res 038 del 2016
	Ap. Forestal Túnel Verde	1,4	1,4	1.4	100%	COINAM	Arboles establecidos, incluyendo cerramientos. Se adelantan mantenimientos y seguimientos. Se evidencia

UNIDAD FUNCIONAL	MEDIDA COMPENSATORIA	ÁREA REQUERIDA PARA COMPENSACIÓN	GESTIÓN PREDIAL O ÁREA DISPONIBLE PARA SIEMBRA	ÁREA SEMBRADA PARA COMPENSACIÓN	% AVANCE	CONTRATISTA	ESTADO
							vandalismo en algunos cerramientos en proceso de reparación continuo.
3	Aprovechamiento forestal	105,39	105,39	0	0%	-	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR- expidió las resoluciones 049 y 050 del 29 de abril de 2020, mediante las cuales aprueba el cambio de medida compensatoria propuesto por la Concesión Alto Magdalena. S.A.S.
	Ocupaciones de cauce	15,27	15,27	8,00	35.13	ERA	8.800 árboles de 38 expedientes reportados a la AAC., Siembra de 3.092 árboles requeridos como compensación, generados por la CAR-DRMC. Se continúa proceso de humectación y mantenimientos. Se realizan nuevos cerramientos y nuevas siembras (alrededor de 3.000 plántulas) para ubicación de expedientes, marcación de los mismos con plaquetas. Reporte de siembra de 3

UNIDAD FUNCIONAL	MEDIDA COMPENSATORIA	ÁREA REQUERIDA PARA COMPENSACIÓN	GESTIÓN PREDIAL O ÁREA DISPONIBLE PARA SIEMBRA	ÁREA SEMBRADA PARA COMPENSACIÓN	% AVANCE	CONTRATISTA	ESTADO
							expedientes 51499, 56598 y 62721
	Árboles en categoría especial	0,32	0	0	0%		Pendiente de contratación
	Aprovechamiento forestal (Licencia Ambiental)	0.09	0.09	0.090	100%	ALMA	Resolución 0719 del 18 de marzo del 2019: Sembrado por Concesión ALMA predio La Rivera, equivalente a 60 árboles, avance de siembra de 0.09 ha
4.1	Plan de Inversión 1%	1,19	1,19	1,19	100%	INGECIMEINS	Cerramiento realizado y siembra de plántulas, pendiente el Cumulá y el Trompillo. Durante este mes el contratista se encuentra realizando labores de mantenimiento
	Diseño Paisajístico	12,5	12,5	12,5	100%	INGECIMEINS	Siembra de pastos en La Cajita, verificado por la Concesión. Se envían requerimientos para cumplimiento de actividades de mantenimiento al contratista

UNIDAD FUNCIONAL	MEDIDA COMPENSATORIA	ÁREA REQUERIDA PARA COMPENSACIÓN	GESTIÓN PREDIAL O ÁREA DISPONIBLE PARA SIEMBRA	ÁREA SEMBRADA PARA COMPENSACIÓN	% AVANCE	CONTRATISTA	ESTADO
	Plan Por Pérdida de la Biodiversidad	30,38	30,38	0	0%	CIINAS	Se radicó el Plan de Compensación por Pérdida de Biodiversidad a la ANLA, en espera de aprobación de ANLA.
4.2	Aprovechamiento forestal	89,13	62,22	30	24,8%	ECOPLANNING	Contrato C-13 del 2020, Resolución 061 del 3 de mayo del 2016: Gestión Predial de 62.22 ha, avance de siembra de 15.44 ha, equivalentes a 10.042 árboles ya establecidos con un primer y segundo ciclo de mantenimiento. Contrato C-100 del 2018; 4 y 5 ciclo de mantenimiento de 14.600 árboles.
	Aprovechamiento forestal				0%	INGECIMEINS	Resolución 013: Contratista en actividades de Gestión Predial.
	Ocupaciones de cauce	18,18	18,18	18,18	100%	ECOPLANNING	17.800 árboles establecidos, de 68 expedientes reportados a la AAC, 12 reportes a la CAR del segundo Informe Anual de Siembra.
5.1	Aprovechamiento forestal	3,12	0	0	0%	ECO PLANNING	En proceso de firma de Otrosí para la ejecución de 3,12 ha con ECO PLANNING

UNIDAD FUNCIONAL	MEDIDA COMPENSATORIA	ÁREA REQUERIDA PARA COMPENSACIÓN	GESTIÓN PREDIAL O ÁREA DISPONIBLE PARA SIEMBRA	ÁREA SEMBRADA PARA COMPENSACIÓN	% AVANCE	CONTRATISTA	ESTADO
	Aprovechamiento forestal			0.04	100%	ALMA	Autorización CAR 54 del 11 julio de 2019, Sembrado por Concesión ALMA predio Casa Loma, equivalente a 27 árboles, avance de siembra de 0.04 ha
5.2	Aprovechamiento forestal	19,41	0,38	0,38	2%	-	Lo sembrado corresponde a resolución 1408 Finca La Brasilia, sembrado por La concesión
5.4	Plan Por Pérdida de la Biodiversidad	29,42	29,42	0	0%	CUMPLIMIENTO AMBIENTAL	Mediante radicado ANLA 2020041725-1-000, se entregó la versión definitiva del plan de compensación por pérdida de Biodiversidad. Se espera pronunciamiento por parte de la Autoridad.
	Sustracción del DMI	28	28	0	0%	-	Reunión con alcalde de Puerto Salgar para radicación de proceso de compra de predio La Esperanza (28 ha), en proceso entrega a CAR DRBM de pozo profundo. Pendiente diseño de obras en quebrada Arenales
TOTAL		602,2	511,79	155,89			

Fuente: Concesión Alto Magdalena S.A.S., 2021

2.2.15 REHABILITACION ECOLOGICA

Tabla 35 Rehabilitación Ecológica


UNIDAD FUNCIONAL	MEDIDA COMPENSATORIA	ÁREA REQUERIDA PARA COMPENSACIÓN	GESTIÓN PREDIAL O ÁREA DISPONIBLE PARA SIEMBRA	ÁREA SEMBRADA PARA COMPENSACIÓN	% AVANCE	CONTRATISTA	ESTADO
2	Veda	1	0	0	0%	INGECIMEINS	Fue seleccionado el predio Tolú y se está a la espera de la firma de convenio con el propietario para la ejecución y realización de actividades.
3	Veda	1	1	1	100%	-	Sembrado por Concesión ALMA Finca El Porvenir
4.1	Veda	2,5	2,5	2,5	100%	INGECIMEINS	Sembrado por INGENECIMEINS Finca La Ilusión, Finca El Porvenir. Resiembra realizada. Para este mes el contratista está realizando labores de mantenimiento
4.2	Veda	3	3	3	100%	INGECIMEINS	Se realizó la siembra de 2800 individuos en 3Ha en la finca quinta Brasilia-Honda. Para este mes el contratista está realizando labores de mantenimiento
5.2	Veda	1	0	0	0%	INGECIMEINS	En gestión predial para el área al que se le realizará rehabilitación ecológica
5.4	Veda	2	0	0	0%	INGECIMEINS	En gestión predial para el área al que se le realizará rehabilitación ecológica

Tabla 36 Cumplimiento de informes semestrales por permisos de levantamiento de veda

UF	RESOLUCIÓN	No. INFORMES ENTREGADOS	INFORMES PENDIENTES	TOTAL No. INFORMES	Avance%
1	1701 de 2015	6	0	7	85%
2	1928 de 2015	8	0	8	100%
3	2280 de 2015	9	2	12	75%
4.1	2129 de 2015	6	2	9	66%
	0817 de 2016	6	2	12	75%
4.2	2601 de 2015	7	3	11	63%
5.2	2602 de 2015	4	2	8	37%
5.4	2284 de 2015	8	2	11	72%
	1082 de 2018	4	1	7	57%


Fuente: Concesión Alto Magdalena S.A.S., 2021

Ilustración 1. Cumplimiento de informes semestrales por permisos de levantamiento de veda

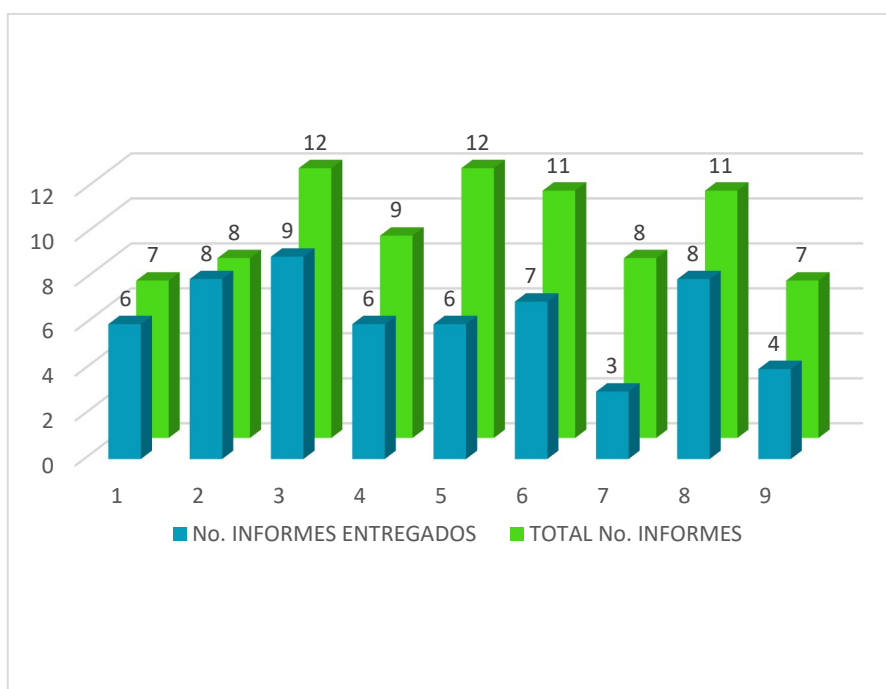


Fuente: Concesión Alto Magdalena S.A.S., 2021

Ilustración 2. Avances en gestión predial y establecimiento de áreas (ha).

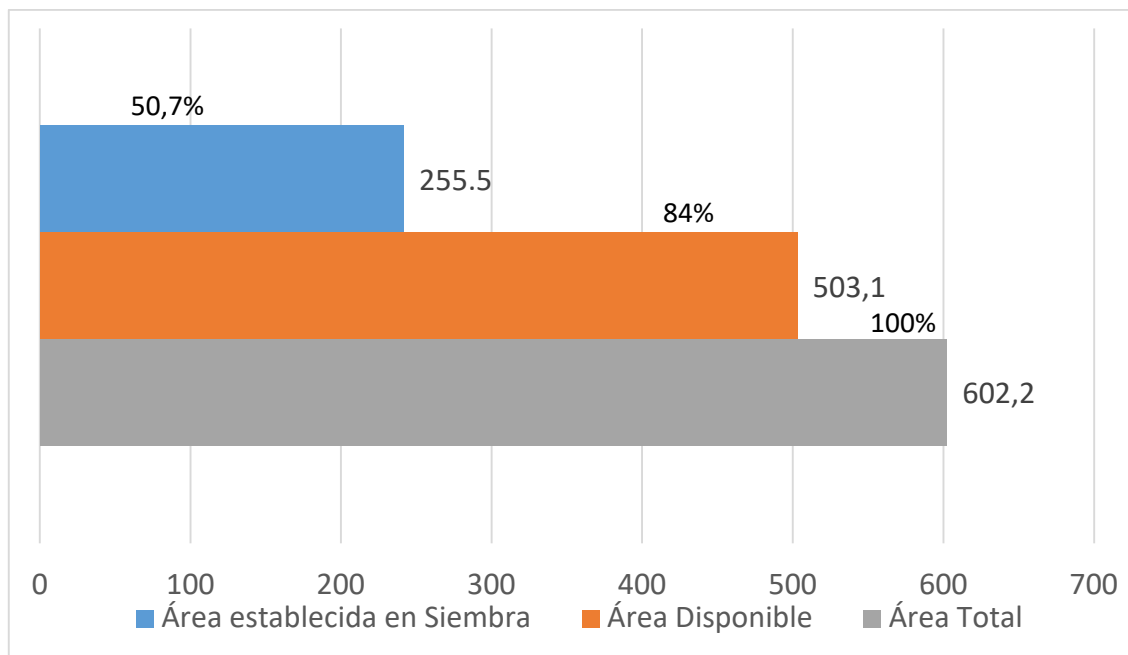

Fuente: Concesión Alto Magdalena S.A.S., 2021

Ilustración 3. Balance compensaciones ambientales por expedientes de ocupación de cauce.

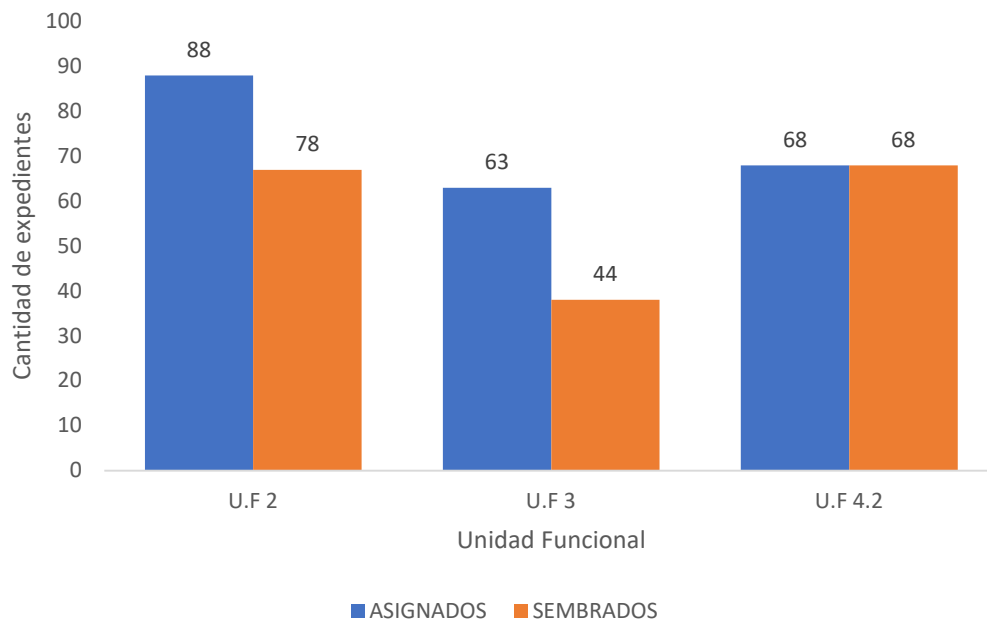


Fuente: Concesión Alto Magdalena S.A.S., 2021

2.2.16 SUBCUENTA COMPENSACIONES AMBIENTALES

En el periodo comprendido del presente informe, la Concesión Alto Magdalena S.A.S., presenta el valor utilizado de la subcuenta de compensaciones del contrato de concesión APP No. 003 de 2014, los cuales se han utilizado en los contratos celebrados con Acción Verde, Estrategias de Renovación Ambiental - ERA, Ecoplaning, Ingecimeins, Cumplimiento ambiental y CIINAS, las cuales se evidencian en la siguiente ilustración:

Ilustración 4. Estado subcuenta compensaciones ambientales

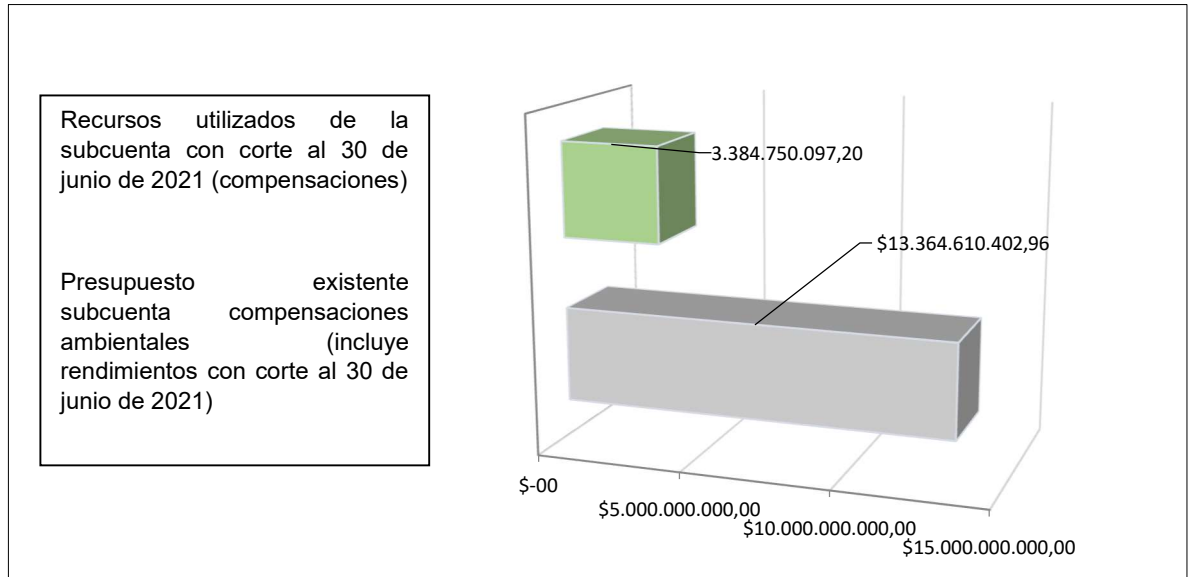

Fuente: Concesión Alto Magdalena S.A.S., 2021

2.2.17 TRÁMITES ESPECIALES

- **CORMAGDALENA:** A continuación, se relaciona la trazabilidad de los trámites realizados con la autoridad ambiental Durante este mes el Concesionario remito las siguientes comunicaciones a esa entidad:

Tabla 37 Trazabilidad Cormagdalena

CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO
ALMA-2018-2605	11 de julio de 2018	Obligaciones resolución No. 374 del 06 de octubre del 2016, mediante la cual se modifica la resolución No.0020 del 26 de enero de 2016
ALMA-2018-2606	11 de julio de 2018	Obras hidráulicas fluviales construidas sobre la ronda del rio magdalena en las unidades funcionales 2 y 4- Resolución No.0020 del 26 de enero de 2016

CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO
ALMA-2018-3009	1 de agosto de 2018	Remisión pólizas Resolución No. 020-2016, en repuesta a comunicado CE-SGC- 201803000473, con radicado ALMA-R-2018-0965 del 22 de marzo de 2018
ALMA-2018-3123	15 de agosto de 2018	Reiteración obligaciones Resolución No. 000374 del 06 de octubre de 2016 que modifica la resolución No.0020 del 26 de enero de 2016
ALMA-2019-00097	11 de enero de 2019	Derecho de petición
ALMA-2019-00686	22 de febrero de 2019	Derecho de petición pronunciamiento obras hidráulicas construidas UF 2. Resolución No. 020 de 2016
ALMA-2019-00822	6 de marzo de 2019	Respuesta comunicado SEG-201903000301 del 5 de febrero de 2019- cuentas de cobro 023 y 024 de febrero de 2019 por concepto de pago de cruce aéreo sobre el rio magdalena
ALMA-2019-01673	10 de mayo de 2019	Derecho de petición
ALMA-2019-01674	10 de mayo de 2019	Derecho de petición
ALMA-2019-01888	31 de mayo de 2019	Solicitud mesa de trabajo
ALMA-2019-01890	31 de mayo de 2019	Solicitud interinstitucional para intervención ante requerimientos pendientes de pronunciamiento por parte de la cooperación autónoma regional del rio grande de la magdalena CORMAGDALENA
ALMA-2019-01949	6 de junio de 2019	Cumplimiento parágrafo primero, artículo sexto resolución No. 020 del 26 de enero de 2016
No Aplica	21 de junio de 2019	Acercamientos a CORMAGDALENA
Acta reunión	5 de agosto 2019	Mesa de trabajo y revisión de los derechos de petición
Acta reunión	12 de agosto de 2019	Mesa de trabajo para solicitud de la exclusión de la obra del K5+200 y los informes de interventoría
ALMA-2019-2966	18 de septiembre de 2019	Radicación del evento eximente de responsabilidad a la ANI
Reunión	27 de septiembre de 2019	Mesa de trabajo para la presentación de la asesora jurídica de CORMAGDALENA
Acta reunión	29 de noviembre de 2019	Verificación del estado de radicación de las pólizas para poder proceder a la modificación de la resolución
ALMA-2019-3455	26 de noviembre de 2019	Radicación de pólizas después de haber realizado una retroalimentación y verificación vía correo electrónico

CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO
Acta de reunión	9 de diciembre de 2019	Mesa de trabajo para volver a revisar nuevamente las pólizas
ALMA-2019-3840	11 de diciembre de 2019	Se radicaron nuevamente las pólizas
ALMA-2019-3841		
ALMA-R-2019-2956	16 de diciembre de 2019	CORMAGDALENA aprueba las pólizas
ALMA-2020-0025	3 de enero de 2020	Se reiteran los derechos de petición en un solo comunicado de acuerdo a los compromisos con CORMAGDALENA
Acercamiento	20 de enero de 2020	Se realizó acercamiento a CORMAGDALENA, con el propósito de verificar el estado de las solicitudes y se evidencio un nuevo cambio en el personal
ALMA-2020-0233	31 de enero de 2020	Solicitud visita técnica para ubicación de puntos de señalización fluvial Resolución No. 0016 de 2016. Unidad Funcional 1.
ALMA-2020-0234	31 de enero de 2020	Solicitud visita técnica para ubicación de puntos de señalización fluvial Resolución No. 0021 de 2016.
ALMA-2020-0527	19 de febrero de 2020	Solicitud de modificación de la Resolución 020 del 26 de enero de 2016, modificada con las resoluciones 374 del 6 de octubre de 2016 y 150 del 9 de junio de 2017, con la cual se otorgó autorización a la Concesión Alto Magdalena S.A.S, para la construcción de obras hidráulicas fluviales sobre la ronda del rio Magdalena, en la Unidad Funcional 2 y 4, localizadas en el corredor vial Honda-Puerto Salgar- Girardot, EN EL SECTOR ENTRE Girardot (K5+200) y Guaduas (K129+060), cuya finalidad es mejorar la estabilidad del corredor vial de los sectores denominados “Sitios Críticos” que se localizan cerca de la ronda hídrica del rio Magdalena
Pagos resoluciones	21 de febrero de 2020	El concesionario realizó los pagos correspondientes al año 2020 de las resoluciones 016 y 020
Visita Cormagdalena	24 de febrero de 2020	Se realizó la visita técnica de Cormagdalena para revisar los puntos o posibles zonas para instalar la señalización, quedando a la espera del informe por parte del técnico de la entidad
ALMA-2020-0717	10 de marzo de 2020	Entrega soporte de pago por concepto de permiso de cruce aéreo otorgado mediante Resolución CORMAGDALENA 021 del 26 de enero de 2016
ALMA-2020-0716	10 de marzo de 2020	Entrega soporte de pago por concepto de permiso de cruce aéreo otorgado mediante Resolución CORMAGDALENA 016 del 21 de enero de 2016
ALMA-2020-0735	10 de marzo de 2020	Solicitud copia de informes técnicos
ALMA-2020-0854	27 de marzo de 2020	Alcance al radicado CORMAGDALENA 202002001182(Rad. Interno ALMA-2020-0717 – 9/03/2020). Entrega soporte de pago interés de mora por

CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO																														
		concepto de permiso de cruce aéreo otorgado mediante resolución 016 del 21 de enero de 2016																														
ALMA-R-2020-1022	22 de mayo de 2020	Notificación electrónica No 0126 de 2020. La Resolución No. 126 de 2020																														
		Resolución 0126 del 21 de mayo de 2020. Por medio de la cual se modifican parcialmente las Resoluciones No.374 de 2016 y 150 de 2017 modificatorias de la Resolución No. 20 de 2016 proferidas por Cormagdalena y se toman otras determinaciones. Artículo Primero: Negar la solicitud presentada por la Concesionaria Alto Magdalena S.A.S con el oficio No 202002000764 del 19 de febrero de 2020, frente a lo expuesto en el artículo Segundo, parágrafo cuarto de la Resolución 374 de 2016 que modifica el artículo 7º de la Resolución 020 de 2016. Artículo Segundo: Modificar el parágrafo cuarto de la Resolución 374 de 2016 que modifica el artículo 7º la Resolución 020 de 2016, en el sentido de indicar que la entrega de los informes solicitados se cumple con la radicación de una copia de los informes mensuales entregados por la interventoría de la obra a la Agencia Nacional de Infraestructura ANI, entidad ejecutora de la obra. Artículo Tercero: Conceder la solicitud de la modificación del artículo primero de la Resolución 150 de 2017 que modifica el artículo 2 de la Resolución No 020 de 2016, al adicionar las coordenadas de las obras que no serán construidas el cual quedará así: Artículo 2 de la Resolución No 020 de 2016, (...) Dentro de los sectores críticos no serán construidas las siguientes obras: <table><tr><th rowspan="2">Tipo De Obra</th><th rowspan="2">Abscisa</th><th colspan="2">Localización</th></tr><tr><th>Este</th><th>Norte</th></tr><tr><td>Muro de contención</td><td>K5+200</td><td>912874.0300</td><td>963962.9260</td></tr><tr><td>Alcantarilla Ø 0.90m</td><td>K14+487</td><td>913688.2470</td><td>971559.8980</td></tr><tr><td>Alcantarilla Ø 0.90m</td><td>K14+545</td><td>913670.6870</td><td>971125.7810</td></tr><tr><td>Alcantarilla Ø 0.90m</td><td>K23+835</td><td>916247.8650</td><td>979159.5410</td></tr><tr><td>Alcantarilla Ø 0.90m</td><td>K26+311</td><td>916344.8290</td><td>981470.7230</td></tr><tr><td>Alcantarilla Ø 0.90m</td><td>K29+653</td><td>918566.0620</td><td>983661.0501</td></tr></table>	Tipo De Obra	Abscisa	Localización		Este	Norte	Muro de contención	K5+200	912874.0300	963962.9260	Alcantarilla Ø 0.90m	K14+487	913688.2470	971559.8980	Alcantarilla Ø 0.90m	K14+545	913670.6870	971125.7810	Alcantarilla Ø 0.90m	K23+835	916247.8650	979159.5410	Alcantarilla Ø 0.90m	K26+311	916344.8290	981470.7230	Alcantarilla Ø 0.90m	K29+653	918566.0620	983661.0501
Tipo De Obra	Abscisa	Localización																														
		Este	Norte																													
Muro de contención	K5+200	912874.0300	963962.9260																													
Alcantarilla Ø 0.90m	K14+487	913688.2470	971559.8980																													
Alcantarilla Ø 0.90m	K14+545	913670.6870	971125.7810																													
Alcantarilla Ø 0.90m	K23+835	916247.8650	979159.5410																													
Alcantarilla Ø 0.90m	K26+311	916344.8290	981470.7230																													
Alcantarilla Ø 0.90m	K29+653	918566.0620	983661.0501																													
ALMA-2020-1783	9 de julio de 2020	Cumplimiento a la obligación establecida en el artículo segundo de la Resolución No. 000126 del 21 de Mayo de 2020.																														

CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO
ALMA-2021-0324 25-02-2021		Mediante comunicación con radicado 202102000688 la concesión remitió la solicitud de permiso o actividad no portuaria (cruce aéreo) para efectos de garantizar la conectividad de las ITS dentro del corredor vial y así prestar un mejor servicio a la comunidad y usuarios de la vía, requiere de la autorización para la ejecución de unos trabajos menores de manera contigua al Nuevo Puente Honda, que permita la instalación del cable que dé paso de la fibra óptica.
CE-SGC-202103000699 9-03-2021		Cormagdalena informa que conforme a la documentación allegada en relación con la autorización para un cruce aéreo de una red de fibra óptica, se debe remitir en su totalidad con la tabla 3 del artículo 4 del Acuerdo No. 199 de 2017.
		El trámite de cruce aéreo de la UF 5. 3 NPH, la Concesión a decidió no continuar con este ante la Autoridad Ambiental, y, va utilizar mediante tubos protectores que contienen la fibra óptica a instalar en la zona peatonal del NPH.

Fuente: Concesión Alto Magdalena S.A.S., 2021.

- **Evento Eximente de Responsabilidad (EER) UF 4.2 Expediente 52038:** El concesionario se encuentra en proceso de revisión y evaluación de la estrategia para comenzar a desarrollar los informes técnicos de justificación de la sección hidráulica y que esta no afecta la capacidad de obra para los expedientes 70404, 70405, 70406 y 70407. Igualmente se han reportado a la interventoría los IEER desde El No. 1 hasta el No. 63, este último con fecha del 5 y el 9 de octubre de 2020, reportado con la comunicación ALMA-2020-2716, que ya se obtuvo un pronunciamiento de fondo con el Auto DRBM No. 0530 del 30 de septiembre de 2020, que declara la pérdida de fuerza ejecutoria de un acto administrativo y ordena el archivo del expediente No. 52038.

2.2.18 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA DEL ÁREA AMBIENTAL

Tabla 38 Relación correspondencia saliente

RADICADO	CONTACTO	FECHA REG.	ASUNTO
ALMA-2021-0976	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR Girardot	30/06/202114:38:29	Recurso de reposición contra el Auto DRAM 0524 del 8 de junio de 2021, (Rad. Interna ALMA-R-2021-0784) Expediente: 62375
ALMA-2021-0975	Corporación Autónoma Regional de Vianí	29/06/202119:32:14	Solicitud permiso de aprovechamiento forestal árboles aislados en el PR 47 de la ruta nacional RN4508 en el municipio Guataqui.
ALMA-2021-0956	Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA	24/06/202109:00:50	Aclaración informe semestral 8 permiso levantamiento parcial de veda, Resolución 2284 del 3 de noviembre de 2015 - UF 5.3 - Exp.: LAV0068-00-2015 - ATV0247

RADICADO	CONTACTO	FECHA REG.	ASUNTO
ALMA-2021-0955	Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA	24/06/202108:59:25	Entrega del Informe semestral 4 de la Resolución 1082 del 13 de junio de 2018 UF 5.3 - Expediente LAV0068-00-2015 – ATV0788
ALMA-2021-0954	Corporación Autónoma Regional de Vianí	24/06/202108:57:58	Entrega segundo informe de compensaciones en cumplimiento del Auto DRMC 0211 del 5 de abril de 2021 (Rad. Interno ALMA-R-2021-0438) – Exp. 51957
ALMA-2021-0953	Corporación Autónoma Regional de Vianí	24/06/202108:55:54	Cumplimiento obligación pago tasa por utilización de aguas. Factura 202007787 30 de abril del 2021. (Rad. Interno ALMA-R-2021-0746) -Exp. LAV-0004-00-2016
ALMA-2021-0952	Corporación Autónoma Regional de Vianí	24/06/202108:54:15	Cumplimiento de la obligación de pago de la tasa por utilización de aguas. Factura 202007786 del 30 de abril del 2021. (Rad. Interno ALMA-R-2021-0745) Expediente 49270
ALMA-2021-0951	Corporación Autónoma Regional de Guaduas	24/06/202108:52:26	Cumplimiento obligación pago por seguimiento autorización de ocupación de cauce, según el Auto DRBM 0394 del 21 de mayo de 2021 (Rad. Interno ALMA-R-2021-0687) - Expediente 58464
ALMA-2021-0936	Alcaldía municipal de Guaduas	18/06/202115:10:46	Queja afectación y grave riesgo infraestructura vial nacional por actividades de extracción de material de construcción en la vereda Malambo del municipio de Guaduas.
ALMA-2021-0934	Agencia Nacional de Minería - ANM	18/06/202114:40:16	Solicitud trámites de renuncia, desanotación y archivo. Autorización Temporal SFT-08411, predio “La Argentina”.
ALMA-2021-0933	Consortio 4C	18/06/202114:38:25	Respuesta comunicación CI.004/GP9165/21/7.1.8 (Rad. Int. ALMA-R-2021-0737 del 8/06/2021). Ajustes y actualización Pólizas de cumplimiento y RCE
ALMA-2021-0932	Corporación Autónoma Regional de Guaduas	18/06/202114:36:57	Oficio CAR 03212004832 (Rad. Interna ALMA-R-2021-0731) del 9 de junio de 2021. Notificación personal por medio electrónico. Expediente 62373
ALMA-2021-0931	Corporación Autónoma Regional de Vianí	18/06/202114:35:35	Siembra de medida compensatoria. Expediente 62721
ALMA-2021-0930	Corporación Autónoma Regional de Vianí	18/06/202114:34:13	Siembra de medida compensatoria. Expediente 56598
ALMA-2021-0929	Corporación Autónoma Regional de Vianí	18/06/202114:32:09	Siembra medida compensatoria. Expediente 51499
ALMA-2021-0921	Consortio 4C	17/06/202115:44:03	Entrega Informe Trimestral Ambiental 26, correspondiente al periodo de febrero, marzo y abril del año 2021.
ALMA-2021-0917	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR Girardot	17/06/202115:32:39	Entrega Informe No. 8. Expediente ATV 0268.
ALMA-2021-0916	Corporación Autónoma Regional de Vianí	17/06/202115:31:11	Entrega segundo informe de compensaciones en cumplimiento del Auto DRMC 0214 del 5 de abril de 2021 (Rad. Interno ALMA-R-2021-0438). Expediente 51972
ALMA-2021-0915	Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA	17/06/202115:29:25	Entrega Informe de Cumplimiento Ambiental Biótico 15. Expediente: LAV0004-00-2016.

RADICADO	CONTACTO	FECHA REG.	ASUNTO
ALMA-2021-0905	Agencia Nacional de Infraestructura ANI	15/06/202116:30:48	Solicitud desmantelamiento y abandono de la infraestructura asociada al proyecto ubicada en el predio «La Cajita
ALMA-2021-0904	Consorcio 4C	15/06/202114:35:53	Respuesta comunicación CI.004/GP9104/21/5.3-7.4.1 – Rad. Int. ALMA-R-2021- 0606 del 13 de mayo de 2021 – Otorgamiento plazo de cura cercas.
ALMA-2021-0902	Alcaldía Municipal de Guataqui	15/06/202113:55:39	Solicitud protección fajas de retiro obligatorio o áreas de reserva para carreteras, según la Ley 1228 de 2008, PR 48 +00 costado izquierdo de la Ruta Nacional 4508 Girardot – Cambao.
ALMA-2021-0901	Consorcio 4C	15/06/202113:53:01	Respuesta comunicación CI.004/GP8997/21/7.1.8 (Rad. Int. ALMA-R-2021-0375 del 29/03/2021). Observaciones Informe Trimestral Ambiental N° 25 / Componente Ambiental
ALMA-2021-0900	Consorcio 4C	15/06/202113:51:35	Respuesta comunicación CI.004/GP8796/21/7.1.8 (Rad. Int. ALMA-R-2021-0029 del 5/01/2021) - Observaciones Informe de Cierre Ambiental UF 5.
ALMA-2021-0899	Corporación Autónoma Regional de Vianí	15/06/202113:50:08	Entrega segundo informe de compensaciones en cumplimiento del Auto DRMC 0212 del 5 de abril de 2021 (Rad. Interno ALMA-R-2021-0438). Expediente 51955
ALMA-2021-0898	Corporación Autónoma Regional de Vianí	15/06/202113:48:47	Entrega segundo informe de compensaciones en cumplimiento del Auto DRMC 0210 del 5 de abril de 2021 (Rad. Int. ALMA-R-2021-0438). Expediente 62274
ALMA-2021-0897	Corporación Autónoma Regional de Vianí	15/06/202113:47:17	Entrega segundo informe compensaciones en cumplimiento del Auto DRMC 0209 del 5 de abril de 2021 (Rad. Interno ALMA-R-2021-0438). Expediente 51961
ALMA-2021-0896	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR Girardot	15/06/202113:45:58	Remisión comprobante de pago por concepto de seguimiento ambiental - Resolución 2218 del 19 de noviembre 2020. Expediente PAF20284
ALMA-2021-0895	CORMAGDALENA	15/06/202113:44:33	Remisión comprobante de pago intereses de mora liquidados al 28 de mayo de 2021 del permiso de cruce aéreo Resolución 0021 del 29 de enero 2016.
ALMA-2021-0894	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR Girardot	15/06/202113:43:08	Cumplimiento obligación pago servicios de seguimiento ambiental. Auto DRAM 0388 del 12 de mayo de 2021 (Rad. Int. ALMA-R-2021-0655). Expediente 51714
ALMA-2021-0893	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR Girardot	15/06/202113:41:36	Cumplimiento obligación pago servicios de seguimiento ambiental Auto DRAM 0387 del 12 de mayo de 2021 (Rad. Int. ALMA-R-2021-0654) Expediente 51709
ALMA-2021-0892	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR Girardot	15/06/202113:39:27	Cumplimiento obligación de pago por los servicios de seguimiento ambiental Auto DRAM 0381 del 10 de mayo de 2021 (Rad. Int. ALMA-R-2021-0653). Expediente 51701
ALMA-2021-0875	Corporación Autónoma Regional de Vianí	08/06/202115:20:28	Cumplimiento obligación pago seguimiento ambiental 2021, Auto DRAM 0296 del 5 de mayo de 2021 (Rad. Interno ALMA-R-2021-0610). Expediente 51536

RADICADO	CONTACTO	FECHA REG.	ASUNTO
ALMA-2021-0874	Corporación Autónoma Regional de Vianí	08/06/202115:18:49	Cumplimiento obligación de pago seguimiento ambiental. Auto DRMC 0295 del 5 de mayo de 2021 (Rad. Interno ALMA-R-2021-0609) Expediente 51531
ALMA-2021-0873	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR Girardot	08/06/202115:16:11	Cumplimiento pago servicios seguimiento ambiental vigencia 2021, Auto DRAM 0237 del 29 de marzo de 2021 (Rad. Int. ALMA-R-2021-0602) Expediente 51903
ALMA-2021-0862	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR	02/06/202112:13:19	Solicitud visita técnica-ambiental a infraestructura del corredor vial Cambao – Puerto Bogotá Ruta Nacional RN4509 de la Unidad Funcional 4.2
ALMA-2021-0861	Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA	02/06/202112:11:27	Entrega Informe 8 Resolución 2284 del 03 de noviembre de 2015 UF 5.3. Expediente: LAV0068-00-2015 - ATV 0247
ALMA-2021-0860	Corporación Autónoma Regional de Vianí	02/06/202112:09:54	Entrega segundo informe de compensaciones en cumplimiento del Auto DRMC 0208 del 5 de abril de 2021 (Rad. Interno ALMA-R-2021-0438). Expediente 60681
ALMA-2021-0859	Corporación Autónoma Regional de Vianí	02/06/202112:07:51	Entrega del segundo informe de compensaciones en cumplimiento del Auto DRMC 0202 del 31 de marzo de 2021 (Rad. Interno ALMA-R-2021-0438). Expediente 51968
ALMA-2021-0858	Corporación Autónoma Regional de Vianí	02/06/202112:05:28	Entrega segundo informe de compensaciones en cumplimiento del Auto DRMC 0202 del 31 de marzo de 2021 (Rad. Interno ALMA-R-2021-0438). Expediente 51969
ALMA-2021-0857	Corporación Autónoma Regional de Vianí	02/06/202112:02:17	Entrega segundo informe de compensaciones en cumplimiento del Auto DRMC 0200 del 31 de marzo de 2021 (Rad. Interno ALMA-R-2021-0438). Expediente 51970

Fuente: Concesión Alto Magdalena S.A.S., 2021

Tabla 39 Relación correspondencia recibida

DESCRIPCIÓN	RADICADO	FECHA REGISTRO	CONTACTO
Notificación personal medio electrónico Auto DRBM No. 00537 de 2021. Expediente 51987	ALMA-R-2021-0881	30/06/202116:58:09	Corporación Autónoma Regional de Guaduas
Respuesta al radicado 20211039897: ALMA-2021-0739	ALMA-R-2021-0880	30/06/202116:55:54	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR Girardot
Notificación personal medio electrónico Auto DRBM No. 00535 de 2021. Expediente 51981	ALMA-R-2021-0879	30/06/202116:53:20	Corporación Autónoma Regional de Guaduas
Respuesta al radicado 20211039887: ALMA-2021-0738	ALMA-R-2021-0878	30/06/202116:48:50	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR Girardot
Notificación personal medio electrónico Auto DRBM No. 00536 de 2021. Expediente 52054	ALMA-R-2021-0877	30/06/202116:33:57	Corporación Autónoma Regional de Guaduas

DESCRIPCIÓN	RADICADO	FECHA REGISTRO	CONTACTO
Notificación personal medio electrónico Auto DRBM No. 00534 de 2021. Expediente 52000	ALMA-R-2021-0876	30/06/202116:21:11	Corporación Autónoma Regional de Guaduas
Respuesta al radicado 20211039900: ALMA-2021-0740	ALMA-R-2021-0875	30/06/202116:04:03	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
Aspectos e Impactos Ambientales / Operación y Mantenimiento	ALMA-R-2021-0870	30/06/202109:22:05	Consortio 4C
Expediente 51851. Citación notificación personal.	ALMA-R-2021-0865	29/06/202120:15:02	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR Girardot
Expediente 60604. Citación notificación personal.	ALMA-R-2021-0864	29/06/202120:11:03	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR Girardot
Respuesta al radicado 20211039501: VERIFICACIÓN MEDIDAS DE COMPENSACIÓN EXPEDIENTE 62378	ALMA-R-2021-0863	29/06/202120:05:15	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR Girardot
Respuesta al radicado 20211039500: VERIFICACIÓN MEDIDAS DE COMPENSACIÓN EXPEDIENTE 62377	ALMA-R-2021-0862	29/06/202120:03:16	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR Girardot
Respuesta al radicado 20211039498: VERIFICACIÓN MEDIDAS DE COMPENSACIÓN EXPEDIENTE 61893	ALMA-R-2021-0861	29/06/202120:00:53	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR Girardot
Respuesta al radicado 20211039497: VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO MEDIDAS DE COMPENSACIÓN EXPEDIENTE 61526	ALMA-R-2021-0860	29/06/202119:54:19	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR Girardot
CITACIÓN PARA NOTIFICACIÓN PERSONAL	ALMA-R-2021-0857	29/06/202113:40:56	Agencia Nacional de Minería
Respuesta al radicado 20211039496: VERIFICAR CUMPLIMIENTO MEDIDAS DE COMPENSACIÓN EXPEDIENTE 60749	ALMA-R-2021-0855	29/06/202112:06:26	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR Girardot
Respuesta al radicado 20211039494: VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO MEDIDAS DESCOMPENSACIÓN EXPEDIENTE 60699	ALMA-R-2021-0854	29/06/202111:04:38	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR Girardot
Respuesta al radicado 20211039495: VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO MEDIDAS DE COMPENSACIÓN EXPEDIENTE 60703	ALMA-R-2021-0853	29/06/202111:01:21	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR Girardot
Expediente 81168. Citación notificación personal.	ALMA-R-2021-0852	28/06/202115:53:20	Corporación Autónoma Regional de Guaduas
Observaciones Informe de Cumplimiento Ambiental N 15 / Expediente LAV0004-00-2016	ALMA-R-2021-0847	28/06/202111:32:00	Consortio 4C

DESCRIPCIÓN	RADICADO	FECHA REGISTRO	CONTACTO
Informe de Cierre Ambiental UF5 V02	ALMA-R-2021-0842	28/06/202110:43:30	Consorcio 4C
Respuesta al radicado 20211042678: ALMA-2021-0803	ALMA-R-2021-0835	25/06/202112:06:39	Corporación Autónoma Regional de Vianí
Observaciones Informe N° 8 Resolución 1928 de 2015	ALMA-R-2021-0832	24/06/202115:41:51	Consorcio 4C
Requerimiento Formal estudios & Diseños detallados para medidas de Mitigación en el puente Qda. Caño Grande. UF5.2	ALMA-R-2021-0831	24/06/202115:39:19	Consorcio 4C
Informe de establecimiento y mantenimiento C-13	ALMA-R-2021-0828	24/06/202114:10:56	ECO PLANNING S.A.S
Respuesta al radicado 20211038644: CUMPLIMIENTO MEDIDAS DE COMPENSACIÓN EXPEDIENTE 52291	ALMA-R-2021-0825	24/06/202110:45:10	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR Girardot
Respuesta al radicado 20211041890: ALMA-2021-0763	ALMA-R-2021-0823	24/06/202109:46:44	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
Respuesta al radicado 20211037275: INFORME MEDIDAS DE COMPENSACIÓN EXPEDIENTE 52183	ALMA-R-2021-0814	23/06/202109:00:41	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR Girardot
Notificación personal medio electrónico Auto DRMC No. 00440 de 2021. Expediente 51481	ALMA-R-2021-0812	22/06/202108:46:00	Corporación Autónoma Regional de Vianí
Respuesta a radicado No. 20211001231972 – Asunto: Respuesta Resolución VSC No 0000761 del 15 de octubre de 2020. Expediente: Autorización Temporal QBN-15031.	ALMA-R-2021-0810	21/06/202115:15:32	Agencia Nacional de Minería - ANM
Observaciones Informe Trimestral N°25 V02 / Componente Ambiental	ALMA-R-2021-0808	21/06/202112:23:28	Consorcio 4C
Notificación por Aviso AUTO DRAM No. 0291 de 16 ABR. 2021. Expediente 52168	ALMA-R-2021-0795	18/06/202110:33:47	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR Girardot
Observaciones y solicitud de actualización garantías derivadas de las Resoluciones Actividad No Portuaria Nos. 016 de 2016 / 020 de 2016 / 021 de 2016.	ALMA-R-2021-0793	18/06/202109:03:56	CORMAGDALENA
Notificación personal medio electrónico Auto DRAM No. 00553 de 2021. Expediente 61896	ALMA-R-2021-0788	17/06/202111:21:38	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR Girardot
Notificación personal medio electrónico Auto DRAM No. 00536 de 2021. Expediente 51782	ALMA-R-2021-0787	17/06/202111:19:05	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR Girardot
Notificación personal medio electrónico Auto DRAM No. 00550 de 2021. Expediente 51909	ALMA-R-2021-0786	17/06/202111:15:32	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR Girardot

DESCRIPCIÓN	RADICADO	FECHA REGISTRO	CONTACTO
Notificación personal medio electrónico Auto DRAM No. 00525 de 2021. Expediente 61524	ALMA-R-2021-0785	17/06/202111:11:12	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR Girardot
Notificación personal medio electrónico Auto DRAM No. 00524 de 2021. Expediente 62375	ALMA-R-2021-0784	17/06/202110:59:20	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR Girardot
Expediente 51860. Citación notificación personal.	ALMA-R-2021-0782	17/06/202110:56:59	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR Girardot
Notificación personal medio electrónico Auto DRMC No. 00367 de 2021. Expediente 62448	ALMA-R-2021-0781	17/06/202110:54:55	Corporación Autónoma Regional de Vianí
EXPEDIENTE 52147. NOTIFICACIÓN POR AVISO.	ALMA-R-2021-0766	16/06/202111:38:21	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR Girardot
CITACIÓN PARA NOTIFICACIÓN DEL AUTO 0139	ALMA-R-2021-0765	15/06/202111:49:48	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
CITACIÓN PARA NOTIFICACIÓN DEL AUTO 0118	ALMA-R-2021-0764	15/06/202111:48:39	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
CITACIÓN PARA NOTIFICACIÓN DEL AUTO 0117	ALMA-R-2021-0763	15/06/202111:47:17	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
CITACIÓN PARA NOTIFICACIÓN DEL AUTO 0115	ALMA-R-2021-0762	15/06/202111:45:58	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
CITACIÓN PARA NOTIFICACIÓN DEL AUTO 0114	ALMA-R-2021-0761	15/06/202111:44:12	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
CITACIÓN PARA NOTIFICACIÓN DEL AUTO 0113	ALMA-R-2021-0760	15/06/202111:41:12	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
Observaciones Informe N° 8 Resolución 2284 de 2015	ALMA-R-2021-0758	15/06/202109:24:09	Consortio 4C
Revisión informe compensación ambiental / Expediente 60681	ALMA-R-2021-0757	15/06/202109:21:03	Consortio 4C
Informe contrato C-01-2020	ALMA-R-2021-0753	11/06/202114:55:47	Ingenieria ambiental y sanitaria coinam sas
INFORMES CONTRATO C-100	ALMA-R-2021-0752	11/06/202114:49:53	ECO PLANNING S.A.S
INFORMES CONTRATO C-14	ALMA-R-2021-0751	11/06/202114:35:57	ECO PLANNING S.A.S
INFORMES CONTRATO C-14	ALMA-R-2021-0750	11/06/202109:55:52	ECO PLANNING S.A.S
Respuesta al radicado 20211007157: ALMA-2021-0170	ALMA-R-2021-0749	11/06/202109:39:16	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE VIANI
Respuesta al radicado 20211038929: solicitud reunión	ALMA-R-2021-0748	10/06/202115:48:26	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR Girardot
NOTIFICACIÓN FACTURA(S) TUSO N° 202007787 - VIG 2020	ALMA-R-2021-0746	10/06/202115:36:33	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
NOTIFICACIÓN FACTURA(S) TUSO N° 202007786 - VIG 2020	ALMA-R-2021-0745	10/06/202115:20:52	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
Respuesta al radicado 20211033659: RV: ALMA-2021-0632	ALMA-R-2021-0742	10/06/202109:02:07	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR Girardot
Respuesta al radicado 20211033662: ALMA-2021-0632	ALMA-R-2021-0741	10/06/202108:58:14	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR Girardot
Ajustes y actualización Pólizas de Cumplimiento y RCE -	ALMA-R-2021-0737	09/06/202112:26:12	Consortio 4C

DESCRIPCIÓN	RADICADO	FECHA REGISTRO	CONTACTO
Resoluciones No. 021 de 2016, 016 de 2016 y 020 de 2016			
Notificación personal medio electrónico Auto DRAM No. 00495 de 2021. Expediente 86298	ALMA-R-2021-0732	09/06/202112:05:23	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR Girardot
Expediente 62373. Notificación personal medio electrónico.	ALMA-R-2021-0731	09/06/202112:02:46	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR Girardot
Notificación personal medio electrónico Auto DRMC No. 00367 de 2021. Expediente 62448 y 51539.	ALMA-R-2021-0730	09/06/202111:59:55	Corporación Autónoma Regional de Vianí
Respuesta al radicado MADS No. E1-2021-08990 del 16 de marzo de 2021. Expediente: ATV 0275	ALMA-R-2021-0728	03/06/202114:59:25	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Notificación personal medio electrónico Resolución DRBM No. 00115 de 2021. Expediente 68855	ALMA-R-2021-0714	01/06/202113:48:49	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE GUADUAS CUNDINAMARCA
Citación a Notificación personal Exp.52168	ALMA-R-2021-0713	01/06/202113:33:30	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR Girardot
Informes de avance medida compensatoria / Permisos de Ocupación de Cauce UF4	ALMA-R-2021-0709	01/06/202109:47:54	Consortio 4C

Fuente: Concesión Alto Magdalena S.A.S., 2021

2.2.19 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO – PAGA O&M

Durante el periodo del presente informe la gestión ambiental se enfocó en el cumplimiento de las actividades de seguimiento y controles establecidos en el PAGA de Operación y Mantenimiento, No objetado mediante el comunicado CI.004/GP5720/18/7.1.8, radicado interno ALMA-R-2018-3833, del 14 de diciembre de 2018, a continuación, se describen las medidas tomadas por cada programa:

2.2.19.1 PROGRAMA 1. DESARROLLO Y APLICACION DE LA GESTION AMBIENTAL

A continuación, se refieren las actividades relacionadas al programa de desarrollo y aplicación de la Gestión Ambiental, que contiene tres (3) proyectos:

➤ Proyecto: Conformación del Grupo de Trabajo de Gestión Ambiental

Para la correcta implementación de las medidas ambientales establecidas en la normatividad ambiental nacional, contrato y actos administrativos del proyecto se conformó el Grupo de Gestión Ambiental, en el cual participan profesionales de diferentes especialidades.

Tabla 40 Conformación Grupo de Trabajo Ambiental

NOMBRE	PROFESIÓN	RESPONSABILIDAD
José Cervera	Ingeniero Forestal	Coordinador área ambiental

NOMBRE	PROFESIÓN	RESPONSABILIDAD
Jorge Eduardo Beltran	Ingeniero Ambiental	Ingeniero Residente Ambiental
Cristian Loaiza	Biólogo	Biólogo Residente
Jairo Augusto López	Ingeniero Forestal	Ingeniero Residente Forestal

Fuente: Concesión Alto Magdalena S.A.S., 2021

➤ **Proyecto: Capacitación Ambiental al Personal De Obra**

A continuación, se relacionan las capacitaciones realizadas en este periodo por parte de la concesión.

UF	FECHA	LUGAR	TEMA	EMPRESA	ASISTENTES
1,2,3, 4 Y 5	29/06/2021	Corredor vial	Biodiversidad y su importancia, fauna silvestre, bosque seco tropical, reflexión y acciones frente al panorama ambiental	ALMA	23
1,2,3, 4 Y 5	29/06/2021	Corredor vial	Manejo de residuos líquidos domésticos e industriales	ALMA	23

➤ **Proyecto: Cumplimiento de Requerimientos Legales**

A continuación, se relacionan los requerimientos legales de los proveedores utilizados para la etapa de operación y mantenimiento del corredor vial:

Tabla 41 Requerimientos legales

REQUERIMIENTO LEGAL	ACTO ADMINISTRATIVO	PROVEEDOR	MUNICIPIO	VIGENCIA
MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS, CONVENCIONALES Y ESPECIALES	Resolución No. 408 de 9 de Marzo de 2005	SERAMBIENTAL	Girardot	9 de Marzo de 2025
		Relleno Sanitario Praderas del Magdalena		
	Res 289 del 10 de octubre 2008	Relleno Sanitario Regional Doradita	Dorada	Octubre de 2031
	Resolución No. 783 de 19 de julio de 2007	Proyectos Ambientales Ltda.	Tolima	Vida útil del proyecto
	Resolución No. 1593 de 16 de junio de 2010			
	Resolución No. 2517 de 3 de octubre de 2005	ECOCAPITAL INTERNACIONAL S.A.E.S.P.	Cundinamarca	Vida útil del proyecto

REQUERIMIENTO LEGAL	ACTO ADMINISTRATIVO	PROVEEDOR	MUNICIPIO	VIGENCIA
	Resolución No. 2649 de 19 de octubre de 2009	Tecnologías Ambientales de Colombia de Bogotá S.A E.S.P. (Sociedad DESCONT S.A. E.S.P. – SISMEDICA)	Nariño – Guataqui (Cundinamarca)	Vida útil del proyecto
	Resolución No. 426 de 21 de mayo de 1999	DESCONT S.A. E.S.P.	Honda	Vida útil del proyecto
ASFALTO	Resolución No. 0660 20 de junio de 2016	MHC	Tolima	Vida útil del proyecto
	Resolución No. 294 del 2012	Ingeniería de Vías	Tolima	Junio 6 del 2017, se solicitó prorroga del permiso radicado CSM00757
CONCESIÓN DE AGUAS	Resolución 2753 de noviembre de 2007	Empresas Publicas de Beltrán	Cundinamarca	Noviembre de 2017
ZODMES	Resolución No. 408 de 9 de Marzo de 2005	Relleno Sanitario Praderas del Magdalena	Girardot	9 de Marzo de 2025

Fuente: Concesión Alto Magdalena S.A.S., 2021

Tabla 42 Cumplimiento de Requerimientos Legales

PROGRAMA	PROYECTO	MES	INDICADOR	RESULTADO
Desarrollo y Gestión Ambiental	Requerimientos Legales	Junio	N° de requerimientos obtenidos/ N° de requerimientos generados	100%

Fuente: Concesión Alto Magdalena S.A.S., 2021

2.2.19.2 PROGRAMA No. 2 PROGRAMA ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS

Este Programa se compone de cinco (5) proyectos, a continuación, se relacionan las actividades ejecutadas durante este periodo:

➤ Proyecto: Manejo Integral de Materiales de Construcción

Durante el periodo evaluado se realizaron actividades de parcheo en las unidades funcional 3 y 4 sub sector 2.

Tabla 43 Materiales de construcción mantenimiento rutinario

ETAPA	UF	VOLUMEN BACHEO(m3)	VOLUMEN PARCHEO (m3)	VOLUMEN TOTAL (m3)	PROVEEDOR	ACTO ADMINISTRATIVO
O&M	2	0	90,27	90,27	INGENIERÍA DE VÍAS	Contrato IJJ 09171 - Resolución 2555 del 24 de nov de 2015
	3	0	65,61	65,61		

Fuente: Concesión Alto Magdalena S.A.S., 2021

➤ **Proyecto: De Explotación de Fuentes De Materiales**

Para esta etapa del proyecto no se realiza explotación de Fuentes de Materiales, cabe aclarar que en caso de requerirse materiales se realiza la compra a través de proveedores que cuenten con los requerimientos legales ambientales.

➤ **Proyecto: De Señalización de Frentes de Obra y Sitios Temporales**

Para el resto de las actividades de limpieza de señalización, remoción de material vegetal y limpieza de derrumbes, se contó con conos de reducción de velocidad y pantallas móviles para evitar que partículas de sobrantes de material vegetal pudieran impactar vehículos.

En caso de requerir la ocupación temporal de una franja de carril para actividades de re-nivelación y reconformación en varios tramos de la vía, se utiliza medidas de señalización y auxiliares de tráfico.

Para las actividades realizadas para el periodo evaluado se instaló señalización en los frentes de obra, tal cual como se muestra a continuación:

Tabla 44 Indicador – Señalización de frentes de obra y sitios temporales

PROGRAMA	PROYECTO	MES	INDICADOR	RESULTADO
Actividades Constructivas	Señalización de frentes de obra y sitios temporales	Junio	N° de Medidas implementadas/ N° Total de medidas propuestas	100%

Fuente: Concesión Alto Magdalena S.A.S., 2021

➤ **Proyecto: Manejo y Disposición Final de Lodos y Escombros**

El material proveniente de la remoción de derrumbes, material vegetal, material de relleno y fresado, se busca la reutilización de estos, para adecuación de accesos o mejoramientos de procesos, como es el caso del material depositado en la cajita que es reutilizado para mejoramiento de la vía interna. A continuación, se relacionan los volúmenes generados de material durante el reporte del presente informe.

Tabla 45 Manejo de Materiales Sobrantes

ETAPA	UF	VOLUMEN GENERADO (m3)	VOLUMEN DISPUERTO (m3)	VOLUMEN REUTILIZADO (m3)	SITIO DISPOSICIÓN FINAL
O&M	2	511,00	511,00	0	Ser Ambiental disposición en el Relleno Sanitario Parque ecológico Praderas del Magdalena
	3	209,00	209,00	0	La Cajita
	4	119,00	119,00	0	Se realizó disposición de material de excavación en el predio de un particular que cuenta con la documentación respectiva para hacer nivelación del terreno, dicha documentación fue remitida en informe del mes de octubre de 2019. El predio está ubicado en la UF 5.2.

Fuente: Concesión Alto Magdalena S.A.S., 2021

➤ **Proyecto: Manejo y Disposición Final de Residuos Sólidos Convencionales y Especiales**

Las medidas implementadas para el manejo de los residuos sólidos convencionales y especiales que se generaron durante el periodo se describen a continuación:

✓ **Recolección y almacenamiento temporal**

Tabla 46. Estado de la gestión de los residuos sólidos domiciliarios

Área Contractual	UF	Abcisa	Operador	Estado
Área de pesaje (san Lorenzo)	2	PR 09+200	Serambiental	Activo desde el mes de enero de 2020
Peaje Guataquí	3	PR 45+560	ESP San Juan de Rio seco	Activo desde el mes de septiembre del 2019
Área de Servicio (PR 81)	3	PR 80+500	ESP San Juan de Rio seco	Activo desde el mes de septiembre del 2019
CCO	3	PR86+340	ESP San Juan de Rio seco	Activo desde el mes de septiembre del 2019
Peaje Cambao	4.2	PR 06+032	ESP San Juan de Rio seco	Activo desde el mes de septiembre del 2019
Área de servicio	5.2	K18+050	EMAS	Activo desde el mes de octubre de 2020
Peaje Brisas	5.4	PR10+200	ESP Pto Salgar	Activo desde el mes de julio del 2019
Área de Pesaje Brisas	5.4	PR 10+380	ESP Pto Salgar	Activo desde el mes de julio del 2019

Fuente: Concesión Alto Magdalena S.A.S., 2021

Los residuos provenientes de las actividades ejecutadas por los contratistas para la etapa de operación y mantenimiento, es responsabilidad de cada uno de ellos realizar la recolección, transporte y disposición de sus residuos sólidos generados contratando de empresas que cuentan con los permisos ambientales para la disposición de estos, dichos soportes son entregados mensualmente por cada contratista.

✓ **Disposición Final**

Los residuos sólidos generados en las áreas contractuales para el periodo de reporte del presente informe se describen a continuación.

Tabla 47. Reporte de residuos sólidos generados áreas contractuales

Infraestructura	Abscisa	Cantidad de residuos sólidos (Kg)	Proveedor/ Acto administrativo
Área de pesaje San Lorenzo	PR 09+200	25	Serambiental Resolución 2013 del 2005
Peaje Guataquí	PR 45+560	27	E.S.P. San Juan de Rio Seco (Recolección y transporte) Serambiental (Disposición final) Resolución 2013 del 2005
Área de servicio	PR 81+400	14	
Centro de Control y Operaciones	PR86+340	81	
Peaje Cambao	PR 06+032	36	
Área de servicio Guarino	PR 18+050	72	Relleno sanitario Regional Doradita Resolución No. 289 del 10 de octubre 2008
Peaje Brisas	PR10+200	34	
Área de peaje Brisas	PR 10+380	30	

Fuente: Concesión Alto Magdalena S.A.S., 2021

2.2.19.3 PROGRAMA DE GESTION HIDRICA

Este Programa se compone de dos (2) proyectos de los cuales la Interventoría hace seguimiento y control a:

✓ **Proyecto: De Manejo de Aguas Superficiales**

El agua utilizada para las actividades de operación y mantenimiento son provenientes de las empresas de servicios públicos de los municipios que se encuentran dentro del área de influencia. El abastecimiento de agua en bloque y consumo humano de las áreas contractuales se realiza a continuación.

Tabla 48. Reporte volumen de agua en bloque áreas contractuales.

Infraestructura	Abscisa	Volumen consumo agua en bloque (m ³)	Proveedor
Área de pesaje San Lorenzo	PR 09+200	9,00	José Mauricio Casas Restrepo (Acuagyr S.A. E.S.P)
Peaje Guataquí	PR 45+560	12,00	

Infraestructura	Abscisa	Volumen consumo agua en bloque (m³)	Proveedor
Centro de Control y Operaciones	PR86+340	7,0	Concesión de Aguas Resolución No. DRG 0136 del 21 de Abril de 1999.
Área de servicio 81	Pr 81+400	26,00	
Peaje Cambao	PR 06+032	12,00	EMPOCALDAS Resolución 2017-2746 del 12 de septiembre de 2017
Área de servicio Guarino	PR 18+050	22,00	
Peaje Brisas	PR10+200	12,00	
Área de básculas Brisas	PR 10+380	12,00	

Fuente: Concesión Alto Magdalena S.A.S., 2021

Tabla 49. Reporte volumen de agua consumo humano de áreas contractuales.

INFRAESTRUCTURA	ABSCISA	VOLUMEN AGUA CONSUMO HUMANO	Proveedor
Área de pesaje San Lorenzo	PR 09+200	0,67	Agua Pura Slide de Vida Registro INVIMA número 2011139316 del 29/11/2011
Peaje Guataquí	PR 45+560	0,96	
Centro de Control y Operaciones	PR86+340	1,59	
Peaje Cambao	PR 06+032	1,03	
Área de servicio Guarino	PR 18+050	1,10	
Peaje Brisas	PR10+200	0,90	
Área de peaje Brisas	PR 10+380	0,90	
Actividades de O&M	Corredor vial	4,20	

Fuente: Concesión Alto Magdalena S.A.S., 2021

Las aguas residuales generadas en las áreas contractuales son dispuestas en tanques sépticos, realizando el mantenimiento y disposición final de los desechos líquidos generados el contratista SAYA soluciones ambientales, mediante tanque de succión o vactor, con una frecuencia de recolección proyectada acorde al volumen generado y los monitoreos realizados en campo por los supervisores de operación y grupo ambiental. En la siguiente tabla se relaciona el volumen de aguas residuales doméstica extraída en el periodo de reporte del presente informe.

Tabla 50. Residuos líquidos sistemas sépticos

INFRAESTRUCTURA	ABSCISA	VOLUMEN AGUA RESIDUALES DOMÉSTICAS	FECHA DE SERVICIO
Área de servicio K81	PR81+600	4	02/06/2021
CCO	PR86+340	3,5	02/06/2021
Peaje Cambao	PR 06+032	2,5	02/06/2021
Báscula Brisas lado izquierdo	PR 10+380	1,65	03/06/2021
Báscula Brisas lado derecho	PR 10+380	1,65	03/06/2021
Peaje Brisas	PR10+200	3,3	03/06/2021
Peaje Brisas	PR10+200	3,3	09/06/2021
Báscula Brisas lado izquierdo	PR 10+380	1,65	09/06/2021
Báscula Brisas lado derecho	PR 10+380	1,65	09/06/2021
Báscula San Lorenzo lado derecho	PR 09+200	3,5	10/06/2021
Peaje Guataqui	PR 45+560	1,65	10/06/2021
Báscula San Lorenzo lado izquierdo	PR 09+560	4,5	10/06/2021
Área de servicio K81	PR81+600	5	15/06/2021
CCO	PR86+340	5	15/06/2021
Área de servicio K18	PR18+850	7	16/06/2021
Báscula Brisas lado izquierdo	PR 10+380	1,65	17/06/2021
Báscula Brisas lado derecho	PR 10+380	1,65	17/06/2021
Peaje Brisas	PR10+200	3,3	17/06/2021
Báscula San Lorenzo lado derecho	PR 09+200	3,5	19/06/2021
Área de servicio K18	PR18+850	4	22/06/2021
Peaje Cambao	PR 06+032	2,8	22/06/2021
Peaje Brisas	PR10+200	3,3	24/06/2021
Báscula Brisas lado izquierdo	PR 10+380	1,65	24/06/2021
Báscula Brisas lado derecho	PR 10+380	1,65	24/06/2021
Báscula San Lorenzo lado derecho	PR 09+200	3	24/06/2021
Báscula San Lorenzo lado izquierdo	PR 09+560	5	24/06/2021
Peaje Guataqui	PR 45+560	1,65	24/06/2021

Fuente: Concesión Alto Magdalena S.A.S., 2021

El cronograma remitido para el proceso de cierre de los plazos de cura otorgados para peaje Cambao y de Brisas, se presentaron acorde a los lineamientos teóricos del marco legal, no obstante, realizando supervisión en campo, se identificó que los volúmenes de los tanques sépticos, da capacidad, para realizar los mantenimientos de los tanques sépticos de los peajes con frecuencia máxima de una vez por semana, actividad que se viene realizando de forma permanente.

2.2.19.4 PROGRAMA DE BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS

Este Programa se compone de cuatro (4) proyectos, pero que no aplican dos (2) proyectos, la Interventoría hace seguimiento y control a los siguientes proyectos.

➤ **Proyecto: De Manejo del Descapote y Cobertura Vegetal**

Durante el periodo de reporte del presente informe se llevaron a cabo actividades de rocería mecanizada con un área total trabajada de 380,30 m² y las actividades de podas se han desarrollado acorde a lo programado y coordinado con el área de mantenimiento.

➤ **Proyecto: De Recuperación de Áreas Afectadas**

Durante este periodo se realizó la verificación correspondiente para concluir con el segundo mantenimiento de la compensación establecida por el contratista “Cumplimiento ambiental” en el predio “Hacienda Monterrey” y que corresponde a 80 hectáreas sembradas con 52000 mil árboles nativos. Además, se coordinaron acciones de mantenimiento con el contratista INGESIMEINS para el mantenimiento de los predios la Brasilia, la Cajita y la Ilusión, estos mantenimientos se pretenden realizar durante el mes de junio de 2021.

➤ **Proyecto: De Protección de Fauna**

Antes de iniciar las actividades de mantenimiento se tiene establecido el realizar una inspección visual de la zona, para identificar si hay especies de fauna que deban ser rescatadas y/o relocadas.

A continuación, se relaciona el reporte de fauna avistada o atropellada correspondiente al informe del presente mes.

Tabla 51 Reporte de Fauna

UF	Fecha	Abscisa / PR	Nombre común y/o especie	No individuos avistados	No individuos rescatados	No individuos relocados	No individuos atropellados
3	02/06/2021	PR 78+850	Morrocay	1	0	0	1
3	05/06/2021	PR 79+940	Manipelado	1	0	0	1
4.2	09/06/2021	PR 86+900	Abejas	1	1	1	0
2	16/06/2021	PR 3+450	serpiente	1	0	0	1
4.2	26/06/2021	PR 123+970	Pigua- <i>Milvago chimachima</i>	1	1	1	0

UF	Fecha	Abscisa / PR	Nombre común y/o especie	No individuos avistados	No individuos rescatados	No individuos relocados	No individuos atropellados
5.2	29/06/2021	PR 17+900	Chucha / zarigüeya /	1	0	0	1

Fuente: Concesión Alto Magdalena S.A.S., 2021

Tabla 52 Indicadores – Protección de Fauna

PROGRAMA	PROYECTO	MES	INDICADOR	RESULTADO
Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos	Protección de fauna	Junio	N° Medidas implementadas / N° Total de Medidas propuestas	100%
			N° Capacitaciones programadas / N° Total de capacitaciones ejecutadas	100%

Fuente: Concesión Alto Magdalena S.A.S., 2021

➤ **Proyecto: De Protección de Ecosistemas Sensibles**

No aplica. Durante el periodo no se realizó actividades dentro de este proyecto.

➤ **Proyecto: De Instalación, Funcionamiento y Desmantelamiento de Instalaciones Temporales y Sitios de Acopio**

Durante el periodo evaluado no se utilizaron instalaciones temporales ni sitios de acopio, debido a que no se abrieron frentes de obra fijos.

➤ **Proyecto: De Instalación, Funcionamiento, y Desmantelamiento de las Instalaciones para la Planta de Trituración, Asfalto o Concreto**

En la etapa de operación y mantenimiento no se ha contemplado la implementación de este proyecto, por lo tanto, no aplica al momento.

➤ **Proyecto: De Manejo de Maquinaria, Equipos y Vehículos**

Todos los vehículos utilizados en la obra cuentan con revisión técnico-mecánica, certificado de emisiones de gases y SOAT vigentes y con buen estado de funcionamiento de frenos, sistema de dirección, sistemas de suspensión, estado adecuado de llantas, vidrios y espejos.

Los mantenimientos de los vehículos se realizan en centro autorizados, como: Mercovil, Dinissan, DisToyota, Coltolima, Riogrande, Zagautos Taller autorizado Hyundai, Pijaos y Riomotos talleres autorizados Suzuki.

Documentación que reposa en la oficina de GS - SST de la oficina de la Concesión Alto Magdalena ubicada en el área de servicio de Guarino Caldas.

Tabla 53. Maquinaria y equipo de operación y mantenimiento

VEHICULO	PLACA	MODELO
TOYOTA HILUX DOBLE CABINA	URP761	2015
TOYOTA HILUX DOBLE CABINA	URP763	2015
TOYOTA HILUX DOBLE CABINA	URP766	2015
TOYOTA HILUX DOBLE CABINA	WMK000	2015
TOYOTA HILUX DOBLE CABINA	WMK001	2015
TOYOTA HILUX DOBLE CABINA	WMK002	2015
TOYOTA HILUX DOBLE CABINA	WMK003	2015
TOYOTA HILUX DOBLE CABINA	WMK004	2015
RENAULT TRAFIC	URR868	2015
NISSAN FRONTIER D22/NP300	COD658	2015
NISSAN FRONTIER D22/NP300	COD659	2015
NISSAN FRONTIER D22/NP300	COD660	2015
NISSAN FRONTIER D22/NP300	COD661	2015
NISSAN FRONTIER D22/NP300	COD662	2015
NISSAN FRONTIER D22/NP300	I FP021	2015
HYUNDAI PANEL H1	I EY600	2015
HYUNDAI PANEL H1	I EV960	2015
MOTOCICLETA SUZUKI DR 650	UEY07D	2015
MOTOCICLETA SUZUKI DR 650	UEY08D	2015
MOTOCICLETA SUZUKI DR 650	UEY09D	2015
MOTOCICLETA SUZUKI DR 650	UEY10D	2015
MOTOCICLETA SUZUKI DR 650	UEY11D	2015
MOTOCICLETA SUZUKI DR 650	UEY12D	2015
MOTOCICLETA SUZUKI DR 650	UEY13D	2015
MOTOCICLETA SUZUKI DR 650	UEY14D	2015
MOTOCICLETA SUZUKI DR 650	UEY15D	2015
MOTOCICLETA SUZUKI DR 650	UEY16D	2015
MOTOCICLETA SUZUKI DR 650	UEY17D	2015
MOTOCICLETA SUZUKI DR 650	UEY18D	2015
MOTOCICLETA SUZUKI DR 650	RYA01D	2015
MOTOCICLETA SUZUKI DR 650	RYA02D	2015
MOTOCICLETA SUZUKI DR 650	RYA03D	2015
MOTOCICLETA SUZUKI DR 650	RYA04D	2015
MOTOCICLETA SUZUKI DR 650	RYA05D	2015

VEHICULO	PLACA	MODELO
MOTOCICLETA SUZUKI DR 650	RYA06D	2015
MOTOCICLETA SUZUKI DR 650	RYA07D	2015
MOTOCICLETA SUZUKI DR 650	RYA08D	2015
MOTOCICLETA SUZUKI DR 650	RXO82D	2015
MOTOCICLETA SUZUKI DR 650	RXO83D	2015
MOTOCICLETA SUZUKI DR 650	RXO84D	2015
MOTOCICLETA SUZUKI DR 650	RXO85D	2015
NISSAN FRONTIER D22/NP300	IFV481	2015
NISSAN FRONTIER D22/NP300	IFV482	2015
CAMIONETA HONDA	IFV526	2016
MICRO BUS RENAULT	IFV537	2017
MICRO BUS RENAULT	IFV538	2017
CAMIONETA OROCH	IFV539	2017
CAMIONETA OROCH	IFV540	2017
CAMIONETA OROCH	IFV542	2017
CAMIONETA NISSAN	IFV556	2018
CHEVROLET FRR	SCK293	2015
CHEVROLET FRR	SCK295	2015
HYUNDAI HD 78	USW240	2014
CAMION NISSAN CABSTAR	IFV523	2016
HYUNDAI PANEL H1	IFV484	2016
HYUNDAI PANEL H1	IFV485	2016
RENAULT TRAFIC	FNW841	2018
INTERNATIONAL WORK STAR	WMK020	2015
INTERNATIONAL WORK STAR	WMK021	2015

Fuente: Concesión Alto Magdalena S.A.S., 2021

2.3 GESTION SOCIAL

Se hace una descripción de cada uno de los programas del Plan de Gestión Social Contractual.

2.3.1 PROGRAMA DE ATENCION AL USUARIO

Se cuenta con los medios físicos y electrónicos establecidos para recibir las peticiones que los usuarios y la comunidad en general requiera hacer sobre el Proyecto.

En la actualidad se cuenta con las diferentes Oficinas de Atención al Usuario como son la principal y las satélites, así como los demás medios electrónicos (Pagina Web, el Call Center y el correo electrónico) para la atención a la comunidad.

2.3.2 PUNTOS DE ATENCION AL USUARIO

En la actualidad la Concesión cuenta con un equipo de trabajo el cual está prestando servicios de gestión y atención en la oficina principal de atención al Usuario ubicada en la Centro de Control y Operaciones CCO ubicado sobre el Km 86+500; cumpliendo la obligación contractual de la etapa de operacion, en cuanto a la Oficinas móviles por consecuencia del Coronavirus COVID-19, no se esta prestando el servicio, sin dejar de atender cualquier requerimiento que la comunidad requiera de manera presencial cumpliendo los protocolos de bioseguridad.

Tabla 54 Personal del Programa de Atención al Usuario.

N°	NOMBRE	PROFESIÓN	FUNCIÓN A DESARROLLAR
1	Maria Carolina Rojas Mejia	Trabajadora Social	Coordinadora Social
2	Marly Rodríguez	Trabajadora Social	Coordinadora Atención al Usuario UF 4 Y 5 Oficina Móvil 2
3	Jessica Paola Vargas	Comunicadora Social	Profesional social UF 1,2,3 /Móvil 1

Fuente: Concesión Alto Magdalena S.A.S., 2021

2.3.3 ATENCION A QUEJAS Y RECLAMOS (PQRS)


En la actualidad desde el inicio de la etapa de pre-construcción, y en el desarrollo de la fase de Construcción, y operativa, se han recibido un total de 2.895 PQRS de las cuales se han atendido y cerrado el 99 % representada en (2.890 PQRS), quedando abiertas el 1 % representado en cuatro (5 PQRS). Es importante resaltar que para el corte del mes de mayo las PQRS que se encuentra abiertas están dentro de los tiempos límite de respuesta según la ley, debido que ingresaron los últimos días del mes.

Tabla 55 Relación a PQRS

TOTAL PQRS RECIBIDAS	PQRS ABIERTAS (Dentro del plazo límite de atención)		PQRS ABIERTAS (Fuera del plazo límite de atención)		PQRS CERRADAS	
2.895	5	1%	0	0	2.890	99%

Fuente: Concesión Alto Magdalena S.A.S., 2021

Grafica 1 PQRS Recibidas / Abiertas



Fuente: Concesión Alto Magdalena S.A.S., 2021

2.3.4 OFICINAS MOVILES DE ATENCIÓN AL USUARIO


El concesionario atendiendo las indicaciones del Gobierno Nacional, de la Agencia Nacional de Infraestructura y como responsabilidad social empresarial, se tomaron las medidas sanitarias encaminadas a la prevención y limitación de la expansión del Coronavirus-COVID-19, por consiguiente no se prestó atención al usuario en la Oficinas Moviles de igual manera se sigue prestando la atención a través de los medios electrónicos como: página web www.altomagdalena.com.co, correo electrónico info@altomagdalena.com.co y línea de atención al usuario 3219738511, semanalmente se le informo a la comunidad mediante los comunicados de prensa.

2.3.5 CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA

Se continúa prestando atención a través de la **Línea Telefónica de Atención al Usuario (321 9738511) y línea gratuita 018000 196 056**, en la cual se atienden las inquietudes y dudas que presenta la comunidad acerca del proyecto y de las actividades puntuales que se desarrollen a través de la Gestión Social.

En la fase de construcción y etapa operativa, se han recibido 4.838 llamadas telefónicas, 11 llamadas durante el mes de mayo correspondiendo en promedio a 0,36 % llamada diaria.

Grafica 2 Llamadas a la línea de Atención al Usuario

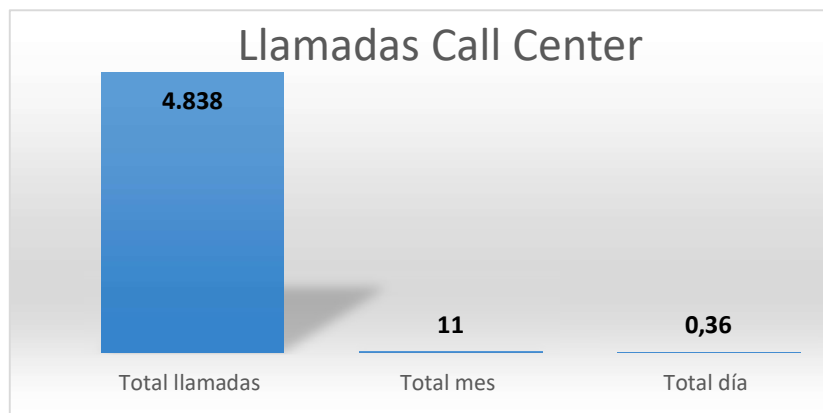


Fuente: Concesión Alto Magdalena S.A.S., 2021

2.3.6 CORREO ELECTRÓNICO, PAGINA WEB Y CALL CENTER

Durante la fase de construcción, y operación se continúa prestando atención través de la cuenta de correo electrónico info@altomagdalena.com.co en la cual se reciben todo tipo de inquietudes y consultas que realiza la comunidad, así como las PQRS que se radican a través de la página Web de la Concesión. En el presente periodo se recibieron 149 correos electrónicos, acumulando a la fecha 15.827 correos electrónicos.

A continuación, se presenta una gráfica comparativa, en donde se presenta los correos electrónicos discriminados por el motivo de la atención en el mes de junio de 2021.

Grafica 3 Atenciones por medio de correo electrónico



Fuente: Concesión Alto Magdalena S.A.S., 2021

2.3.7 PROGRAMA DE EDUCACION Y CAPACITACION AL PERSONAL VINCULADO AL PROYECTO

En articulación con las áreas de gestión ambiental, gestión social y seguridad y salud en el trabajo, en junio de 2021 se realizaron 166 talleres y capacitaciones dirigidos al personal vinculado al proyecto.

Tabla 56 Capacitaciones por Unidad Funcional Junio

UF	N° CAPACITACIONES REALIZADAS	N° DE ASISTENTES
UF 1	1	3
UF 2	20	199
UF 3	68	618
UF 4	30	266
UF 5	47	336
Total	166	1422

Fuente: Concesión Alto Magdalena S.A.S., 2021

Tabla 57 Consolidado capacitaciones realizadas hasta Mayo 2021

UNIDAD FUNCIONAL	N° CAPACITACIONES REALIZADAS	N° DE ASISTENTES
1	a mayol 318	7856
2	a mayo 583	10825
3	a mayo 1283	18353
4	a mayo 984	16195
5	a mayo 2320	85082
TOTAL	A mayo 5488	138311

Fuente: Concesión Alto Magdalena S.A.S., 2021

2.3.8 PROGRAMA DE VINCULACION DE MANO DE OBRA

Con el fin de fomentar la vinculación laboral del personal del Área de Influencia Directa del Proyecto se tiene un control sobre la vinculación de mano de obra procurando que la mayoría del personal pertenezca al Área de influencia Directa, y que los mayores beneficios económicos sean para la mano de obra no calificada.

Es así como a través del convenio especial de cooperación N° 002 de 2015, derivado del convenio marco N° 007 del 11 de febrero de 2015, suscrito con el SENA se promueva que la contratación de la mano de obra se haga de una forma transparente, que permita el beneficio de los pobladores del área de influencia directa.

Desde la etapa de construcción del proyecto vial Honda-Puerto Salgar-Girardot, se ha vinculado personal del Área de Influencia Directa, promoviendo la oportunidad laboral en cada uno de los municipios de incidencia. Se debe tener presente que, según la necesidad del avance de la obra, se realiza el proceso de vinculación del personal.

A continuación, se visualiza el proceso de contratación desarrollado desde el Área Directa (Concesión) y el Área Indirecta (Diferentes Contratistas), así como la contratación percibida desde Mano de Obra Calificada y Mano de Obra No Calificada.

2.3.9 CONTRATACION DE PERSONAL

Actualmente la etapa de construcción del proyecto vial, para el mes de junio de 2021 reporta la contratación de 470 personas vinculadas con la Concesión, constructores y contratistas que hacen parte de la ejecución del proyecto.

Tabla 58 Personal Contratado AID y AII a junio 2021

N° DE PERSONAL VINCULADO AL PROYECTO			TOTAL PERSONAS VINCULADAS AL PROYECTO
	CONTRATACION PERSONAL AID	CONTRATACION PERSONAL AII	
UF 1	3	0	
UF 2	35	17	
UF 3	99	43	
UF 4	85	18	
UF 5	131	39	
TOTAL	353	117	470

Fuente: Concesión Alto Magdalena S.A.S., 2021

A continuación, se reportan los datos a corte del mes de junio de 2021, el 75% hacen parte del Área de Influencia Directa y el 25% corresponde al personal que proviene del Área de Influencia Indirecta.


En cuanto al personal vinculado para el mes de junio 2021, el 71% pertenece al grupo de Mano de Obra No Calificada, por tanto, el 29% de los trabajadores corresponde al grupo de servidores de Mano de Obra Calificada.

Tabla 59 Personal Contratado MOC – MONC Junio 2021

N° DE PERSONAL VINCULADO AL PROYECTO	N° PERSONAL MOC		N° PERSONAL MONC	
UF 1	0		3	
UF 2	21		31	
UF 3	50		92	
UF 4	21		82	
UF 5	44		126	
TOTAL PERSONAS VINCULADAS 443	136	29%	136	29%


Fuente: Concesión Alto Magdalena S.A.S., 2021

Grafica 4 Relación Personal vinculado del AID con el personal del AII

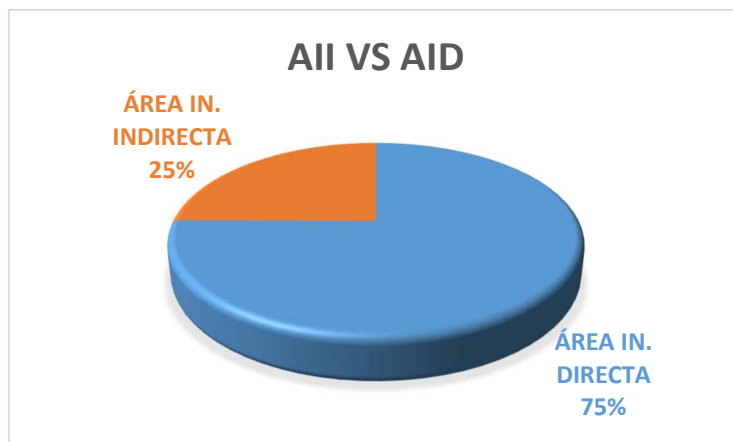

Fuente: Concesión Alto Magdalena S.A.S., 2021

Grafica 5 Relación MONC contratada con la MOC

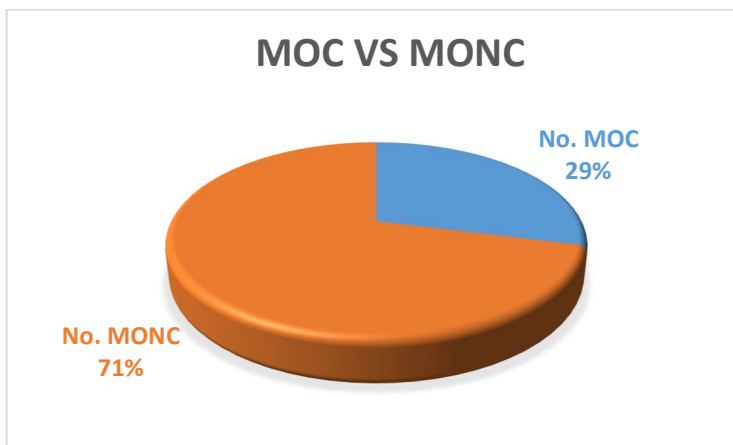

Fuente: Concesión Alto Magdalena S.A.S., 2021

2.3.10 RECEPCION DE HOJAS DE VIDA

Tabla 60 Recepción de hojas de vida en el mes de Abril 2021.

MES	CANTIDAD
(Mayo Consolidado) 2021	8532*

Fuente: Concesión Alto Magdalena S.A.S., 2021

*Número ajustado una vez depurada y actualizada la base de datos.

A la fecha en total se han recibido a través de las oficinas de atención al usuario y los medios magnéticos 8532 hojas de vida; según se puede evidenciar en la tabla

anteriormente anunciada. En la actualidad, solo se recibirán hojas de vida en jornadas especiales de recolección para vacantes específicas.

2.3.11 REUNIONES DE SOCIALIZACION

Al mes de junio 2021 por el tema de prevención al contagio al virus Covid 19 determinado por el Gobierno Nacional, no se generaron reuniones de acuerdo con el convenio pactado entre la Agencia Pública de Empleo APE y la Concesión Alto Magdalena, tampoco reuniones de socialización con los colaboradores de los frentes de obra del proyecto vial.

Tabla 61 Reuniones informativas alianza SENA.

Socialización Comunidad Convenio Sena	No. Reuniones	No. Asistentes
APLICATIVO SENA	82	1647

Fuente: Concesión Alto Magdalena S.A.S., 2021

Para el mes de junio 2021, por la situación de emergencia sanitaria derivada para la prevención del contagio al virus Covid 19, no se generaron jornadas de apoyo en el registro de hoja de vida y postulaciones a la vacante a través de la plataforma APE

Tabla 62 Jornada de apoyo proceso de postulación a vacante

APOYO POSTULACION A VACANTE	No. REUNIONES	No. ASISTENTES	No. POSTULACIONES
Comunidad UF5	0	0	0
Comunidad UF3	0	0	0

Fuente: Concesión Alto Magdalena S.A.S., 2021

Tabla 63 Consolidado nuevo personal vinculado con corte a Junio 2021

MES	TRABAJADORES DIRECTOS	TRABAJADORES INDIRECTOS	ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA	ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA	HOMBRES VINCULADOS	MUJERES VINCULADAS	MANO DE OBRA CALIFICADA	MANO DE OBRA NO CALIFICADA	TOTAL, EMPLEOS GENERADOS MES
nov-14	35	88	79	44	101	22	72	51	123
dic-14	31	2	19	14	16	17	18	15	33
ene-15	23	23	31	15	36	10	24	22	46
feb-15	22	7	15	14	19	10	20	9	29
mar-15	17	7	16	8	18	6	15	9	24
abr-15	8	5	10	3	8	5	10	3	13
may-15	26	8	26	8	27	7	19	15	34
jun-15	19	3	14	8	17	5	12	10	22
jul-15	8	6	6	8	12	2	12	2	14
ago-15	12	1	8	5	6	7	7	6	13
sep-15	12	2	2	12	11	3	12	2	14
oct-15	11	35	27	19	36	10	39	7	46
nov-15	9	55	35	29	53	11	47	17	64
dic-15	40	15	35	20	41	14	28	27	55
ene-16	22	42	37	27	47	17	48	16	64
feb-16	29	60	68	21	78	11	48	41	89
mar-16	48	106	126	28	142	12	81	73	154
abr-16	99	128	172	55	197	30	102	125	227
may-16	33	132	112	53	138	27	112	53	165
jun-16	57	100	122	35	147	10	88	69	157
jul-16	48	103	119	32	138	13	84	67	151
ago-16	25	121	91	55	133	13	104	42	146

Concesión Alto Magdalena
Contrato de Concesión N° 003 de 2014
Proyecto Girardot – Honda – Puerto Salgar

MES	TRABAJADORES DIRECTOS	TRABAJADORES INDIRECTOS	ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA	ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA	HOMBRES VINCULADOS	MUJERES VINCULADAS	MANO DE OBRA CALIFICADA	MANO DE OBRA NO CALIFICADA	TOTAL, EMPLEOS GENERADOS MES
sep-16	20	98	68	50	108	10	65	53	118
oct-16	14	243	180	77	228	29	122	135	257
nov-16	14	120	73	61	123	11	105	29	134
dic-16	7	133	85	55	131	9	96	44	140
ene-17	7	223	155	75	218	12	118	112	230
feb-17	9	211	130	90	205	15	136	84	220
mar-17	12	267	158	121	257	22	153	126	279
abr-17	9	164	96	77	164	9	114	59	173
may-17	16	218	159	75	221	13	137	97	234
jun-17	30	242	177	95	248	24	159	113	272
jul-17	12	257	176	93	255	14	162	107	269
ago-17	12	292	155	149	283	21	160	144	304
sep-17	16	260	167	109	259	17	135	141	276
oct-17	5	339	173	171	329	15	177	167	344
nov-17	15	164	91	88	169	10	98	81	179
dic-17	11	58	29	40	59	10	43	26	69
ene-18	14	307	134	187	295	26	187	134	321
feb-18	19	250	132	137	250	19	147	122	269
mar-18	12	103	63	52	105	10	55	60	115
abr-18	11	190	127	74	183	18	110	91	201
may-18	8	207	122	93	202	13	118	97	215
jun-18	12	137	60	89	139	10	97	52	149
jul-18	63	132	102	93	179	16	92	103	195
ago-18	39	92	67	64	110	21	77	54	131
sep-18	8	130	71	67	129	9	72	66	138

Concesión Alto Magdalena
Contrato de Concesión N° 003 de 2014
Proyecto Girardot – Honda – Puerto Salgar

MES	TRABAJADORES DIRECTOS	TRABAJADORES INDIRECTOS	ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA	ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA	HOMBRES VINCULADOS	MUJERES VINCULADAS	MANO DE OBRA CALIFICADA	MANO DE OBRA NO CALIFICADA	TOTAL, EMPLEOS GENERADOS MES
oct-18	13	157	103	67	157	13	86	84	170
nov-18	20	61	66	15	68	13	38	43	81
dic-18	4	29	20	13	30	3	10	23	33
ene-19	14	100	88	26	95	19	48	66	114
feb-19	20	76	57	39	85	11	44	52	96
mar-19	10	79	57	32	79	10	32	57	89
abr-19	9	71	68	12	75	5	24	56	80
may-19	34	46	48	32	66	14	40	40	80
jun-19	25	48	24	49	66	7	48	25	73
jul-19	32	50	46	36	54	28	50	32	82
ago-19	9	38	24	23	43	4	30	17	47
sep-19	16	62	50	28	63	15	38	40	78
oct-19	6	65	26	45	69	2	49	22	71
nov-19	4	24	4	24	26	2	24	4	28
dic-19	10	33	18	25	36	7	25	18	43
ene-20	9	90	53	46	92	7	55	44	99
feb-20	9	44	34	19	44	9	25	28	53
mar-20	19	28	21	26	32	15	31	16	47
abr-20	0	18	13	5	17	1	3	15	18
may-20	2	66	42	26	66	2	38	30	68
jun-20	4	14	12	6	15	3	7	11	16
jul-20	8	42	26	24	41	9	22	28	50
Agos-20	9	31	7	33	32	8	30	10	40
Sept-20	6	11	13	4	15	2	7	10	

Concesión Alto Magdalena
 Contrato de Concesión N° 003 de 2014
 Proyecto Girardot – Honda – Puerto Salgar

MES	TRABAJADORES DIRECTOS	TRABAJADORES INDIRECTOS	ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA	ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA	HOMBRES VINCULADOS	MUJERES VINCULADAS	MANO DE OBRA CALIFICADA	MANO DE OBRA NO CALIFICADA	TOTAL, EMPLEOS GENERADOS MES
Octubre 20	4	22	21	5	24	2	16	10	26
Nov-20	6	22	6	22	28	0	26	2	0
Dic-20	1	2	1	2	2	1	2	1	
Ene-2021	10	30	24	16	36	4	12	28	40
Feb-2021	14	27	29	12	37	4	7	34	41
Mar-2021	8	30	18	20	35	3	15	23	38
Abril 2021	1	12	8	5	13	0	4	9	13
May 2021	9	34	23	20	38	5	17	26	43
Jun 2021	6	35	17	24	37	4	13	28	41
Total	1380	7405	5209	3576	7908	877	4853	3932	8785

2.3.12 PROGRAMA DE INFORMACION Y PARTICIPACION COMUNITARIA

Para el mes de junio de 2021, la gestión del Plan de Medios y entrega de piezas comunicativas, según compromisos, corresponde al 100%; con 6 medios de divulgación empleados, de acuerdo con las obligaciones contractuales estipuladas. Adicionalmente se entregaron cuatro (04) Boletines de Prensa (451al 454) y no se generaron volantes. El total de piezas y actividades en acumulado son:

Tabla 64 Piezas Comunicativas en Mayo 2021

Indicador	Ediciones Elaboradas	Impresos o Enviados	Divulgados	% de entrega o avance
Volantes	639	98524	98524	100%
Boletín de Prensa	454	52341	52341	100%
Pendón desvíos Chicoral, Abanicos, esfera linterna, llavero linterna, estampa de la virgen y llavero denario, calendarios y bolsas - Actividades Campaña vial- Ponchos, pendón motociclista – policía virtual - Actividad Responsabilidad Social – Pasavías Peaje Cambao – Pasavías retorno Bogotá – Tula- Pendón #MuéveteLegal – Pendón Yo Protejo la vida – Valla Mintransporte – Pendón orientación Cambao –Pendón y folletos entrega obra Puente Flandes – Esfero gol por la vida - regla – Folleto Pescadores – Bolsa vehículo 2018 – Kit de despinche – Tarjeta calendario 2019 – Sticker número emergencia – Linterna para peatones - Pasacalles aproximación de peaje Brisas, vallas tarifarias, Abanicos, Mapa ruta, afiche mapa ruta #3., Abanicos nuevas rutas.	69	23770	23770	100%
Folleto #1 – V2 * - Folleto#2 Visita Presidencia	4	423	423	100%
Afiche #2 * Campaña vial.	1	60	60	100%
Afiche # 3 * Apertura Variante Purnio – peaje Brisas	1	14	14	100%
Mapa Ruta	1	150	150	100%
Folleto #3. Comparendo ambiental	6	3708	3708	100%
Folleto #6. Código Nacional de Tránsito Terrestre. Ley 769 de 2002 / Tránsito de animales en vía pública. Decreto 2257 de 1986	1	102	102	100%
Folleto #7. Permisos para el uso, la ocupación y la intervención temporal de la infraestructura vial. Resolución 716 de 2015	1	500	492	98%

Indicador	Ediciones Elaboradas	Impresos o Enviados	Divulgados	% de entrega o avance
Folleto #8. Campaña de Samana Santa Reflexiona en la vía... ¡Es por Tú vida!	1	2000	2000	100%
Brochure *Se inicio la entrega enero de 2020 a enero de 2021.	4	1000	1000	100%
Comunicado de Prensa	16	1220	1220	100%
Periódico trimestral Edición #15 *agosto-octubre	15	3000	3000	100%
Periódico trimestral Edición #16 *Noviembre-enero	16	3000	3000	100%
Periódico trimestral Edición #16 *Febrero-abril	17	3000	3000	100%
Periódico trimestral Edición #17 * abril-mayo	17	3000	3000	100%
Periódico trimestral Edición #18 *mayo-julio	18	3000	3000	100%
Periódico trimestral Edición #19 *agosto-octubre	19	3000	3000	100%
Periódico trimestral Edición #20 *noviembre-enero	20	3000	3000	100%
Periódico trimestral Edición #21 *febrero-abril	21	3000	3000	100%
Periódico trimestral Edición #22 *mayo-junio-julio.	22	3000	3000	100%
Periódico trimestral Edición #23 *Agosto-Septiembre-Octubre.	23	3000	3000	100%
Periódico trimestral Edición #24 *Noviembre-Diciembre-Enero.	24	3000	2700	90%
Periódico trimestral Edición #25 *Febrero-abril	25	124	124	0.5%
Volante No se deje engañar – Servicios Concesión	638	360	360	36%
Volante campaña 'Respeta la vida, movilizate seguro'	639	300	300	30%
Brochure *Se inicio la entrega enero de 2021 a enero de 2021	5	1000	728	42%
Total visitantes a la página web	En el mes de junio: 19.389. Total de visitantes a la fecha: 1002002			

Fuente: Concesión Alto Magdalena S.A.S., 2021

Tabla 65 Piezas Comunicativas entregadas por UF a Junio 2021

UF1			
AÑO	PIEZAS COMUNICATIVAS		
	MES	ELABORADAS	ENTREGADAS
2015	Octubre	90	7138
	Noviembre		
	Diciembre		
2016	Enero	7	587
	Febrero	16	1084
	Marzo	13	1125

UF1			
AÑO	PIEZAS COMUNICATIVAS		
	MES	ELABORADAS	ENTREGADAS
	Abril	11	1223
	Mayo	18	1411
	Junio	11	704
	Julio	14	2026
	Agosto	16	796
	Septiembre	17	1763
	Octubre	12	1638
	Noviembre	12	2121
	Diciembre	12	1371
2017	Enero	13	1296
	Febrero	18	982
	Marzo	13	1310
	Abril	18	1315
	Mayo	19	1302
	Junio	18	849
	Julio	18	822
	Agosto	16	871
	Ocubre	25	4976
	Octubre	21	5215
	Noviembre	19	1255
	Diciembre	16	473
2018	Enero	10	872
	Febrero	9	292
	Marzo	129	129
	Abril	339	339
	Mayo	125	125
	Junio	209	209
	Julio	104	104
	Agosto	323	323
	Septiembre	142	142
	Octubre	141	141
	Noviembre	139	139
	Diciembre	116	116
2019	Enero	250	250
	Febrero	84	84
	Marzo	64	64
	Abril	670	670
	Mayo	401	401
	Junio	610	610
	Julio	589	589
	Agosto	464	464
	Septiembre	393	393
	Octubre	815	815
	Noviembre	294	294
	Diciembre	356	356
2020	Enero	388	388
	Febrero	365	365
	Marzo	701	701
	Abril	426	426
	Mayo	355	355
	Junio	548	548
	Julio	715	715

UF1			
AÑO	PIEZAS COMUNICATIVAS		
	MES	ELABORADAS	ENTREGADAS
	Agosto	715	715
	Septiembre	355	355
	Octubre	355	355
	Noviembre	355	355
	Diciembre	355	355
2021	Enero	250	250
	Febrero	250	250
	Marzo	270	270
	Abril	215	215
	Mayo	320	320
	Junio	450	450

UF2			
AÑO	PIEZAS COMUNICATIVAS		
	MES	ELABORADAS	ENTREGADAS
2015	Octubre	87	7138
	Noviembre		
	Diciembre		
2016	Enero	8	605
	Febrero	18	1109
	Marzo	16	940
	Abril	11	1358
	Mayo	13	958
	Junio	8	1351
	Julio	13	1182
	Agosto	13	1043
	Septiembre	17	1876
	Octubre	9	1562
	Noviembre	7	1779
	Diciembre	12	1380
2017	Enero	15	1256
	Febrero	15	1126
	Marzo	11	1681
	Abril	12	1312
	Mayo	16	1300
	Junio	17	2624
	Julio	9	819
	Agosto	12	901
	Septiembre	20	883
	Octubre	16	2167
	Noviembre	13	1251
	Diciembre	16	473
2018	Enero	12	899
	Febrero	13	372
	Marzo	179	179
	Abril	359	359
	Mayo	320	320
	Junio	391	391
	Julio	400	400
	Agosto	449	449
	Septiembre	249	249
	Octubre	359	359

UF2			
AÑO	PIEZAS COMUNICATIVAS		
	MES	ELABORADAS	ENTREGADAS
	Noviembre	123	123
	Diciembre	288	288
2019	Enero	795	795
	Febrero	99	99
	Marzo	368	368
	Abril	400	400
	Mayo	901	901
	Junio	631	631
	Julio	806	806
	Agosto	511	511
	Septiembre	497	497
	Octubre	672	672
	Noviembre	625	625
	Diciembre	502	502
2020	enero	460	460
	Febrero	362	362
	Marzo	625	625
	Abril	426	426
	Mayo	355	355
	Junio	688	688
	Julio	415	415
	Agosto	415	415
	Septiembre	415	415
	Octubre	315	315
	Noviembre	33	33
	Diciembre	267	267
2021	Enero	250	250
	Febrero	270	270
	Marzo	438	438
	Abril	265	265
	Mayo	320	320
	Junio	250	250

UF3			
AÑO	PIEZAS COMUNICATIVAS		
	MES	ELABORADAS	ENTREGADAS
2015	Octubre	87	7130
	Noviembre		
	Diciembre		
2016	Enero	5	470
	Febrero	10	940
	Marzo	10	940
	Abril	7	658
	Mayo	9	846
	Junio	6	564
	Julio	6	752
	Agosto	6	564
	Septiembre	8	752
	Octubre	6	564
	Noviembre	4	376
	Diciembre	8	752
2017	Enero	7	720

	Febrero	8	752
	Marzo	7	720
	Abril	8	812
	Mayo	11	1050
	Junio	9	846
	Julio	4	376
	Agosto	7	718
	Septiembre	6	564
	Octubre	11	1301
	Noviembre	10	1155
	Diciembre	16	473
2018	Enero	10	872
	Febrero	13	461
	Marzo	323	323
	Abril	367	367
	Mayo	54	54
	Junio	391	391
	Julio	277	277
	Agosto	386	386
	Septiembre	429	429
	Octubre	433	433
	Noviembre	175	175
	Diciembre	284	284
2019	Enero	1872	1872
	Febrero	206	206
	Marzo	741	741
	Abril	400	400
	Mayo	423	423
	Junio	873	873
	Julio	1407	1407
	Agosto	735	735
	Septiembre	492	492
	Octubre	629	629
	Noviembre	821	821
	Diciembre	1137	1137
2020	enero	487	487
	Febrero	415	415
	Marzo	763	763
	Abril	426	426
	Mayo	355	355
	Junio	1113	1113
	Julio	624	624
	Agosto	624	624
	Septiembre	624	624
	Octubre	667	667
	Noviembre	220	220
	Diciembre	454	454
2021	Enero	504	505
	Febrerro	324	324
	Marzo	1468	1468
	Abril	327	327
	Mayo	615	615
	Junio	550	550

UF4			
AÑO	PIEZAS COMUNICATIVAS		
	MES	ELABORADAS	ENTREGADAS
2015	Octubre	87	7138
	Noviembre		
	Diciembre		
2016	Enero	3	641
	Febrero	18	1268
	Marzo	19	1583
	Abril	13	1463
	Mayo	13	984
	Junio	8	1366
	Julio	14	1207
	Agosto	11	1028
	Septiembre	15	1667
	Octubre	8	1562
	Noviembre	6	1893
	Diciembre	11	1350
2017	Enero	11	1191
	Febrero	11	1088
	Marzo	10	1394
	Abril	12	1381
	Mayo	15	1343
	Junio	19	3213
	Julio	8	896
	Agosto	15	1548
	Septiembre	20	1308
	Octubre	21	2450
	Noviembre	12	1229
	Diciembre	16	475
2018	Enero	10	872
	Febrero	9	292
	Marzo	142	142
	Abril	775	775
	Mayo	310	310
	Junio	494	494
	Julio	284	284
	Agosto	349	349
	Septiembre	631	631
	Octubre	576	576
	Noviembre	175	175
	Diciembre	165	165
2019	Enero	2402	2402
	Febrero	419	419
	Marzo	130	130
	Abril	1031	1031
	Mayo	1759	1759
	Junio	984	984
	Julio	1410	1410
	Agosto	594	594
	Septiembre	519	519
	Octubre	686	686
	Noviembre	686	686
	Diciembre	1278	1278
2020	enero	508	508
	Febrero	383	383

	Marzo	586	586
	Abril	426	426
	Mayo	355	355
	Junio	1029	1029
	Julio	703	703
	Agosto	703	703
	Septiembre	715	715
	Octubre	399	399
	Noviembre	270	270
	Diciembre	90	90
2021	Enero	390	390
	Febrero	250	250
	Marzo	570	570
	Abril	300	300
	Mayo	540	540
	Junio	396	396

UF5			
AÑO	PIEZAS COMUNICATIVAS		
	MES	ELABORADAS	ENTREGADAS
2015	Octubre	87	7118
	Noviembre		
	Diciembre		
2016	Enero	5	470
	Febrero	10	940
	Marzo	10	940
	Abril	7	658
	Mayo	9	846
	Junio	6	564
	Julio	6	752
	Agosto	6	564
	Septiembre	8	752
	Octubre	6	564
	Noviembre	4	376
	Diciembre	8	752
2017	Enero	7	720
	Febrero	8	752
	Marzo	7	720
	Abril	8	812
	Mayo	11	1050
	Junio	9	846
	Julio	4	376
	Agosto	7	718
	Septiembre	6	564
	Octubre	11	1301
	Noviembre	10	1155
	Diciembre	16	474
2018	Enero	16	896
	Febrero	18	736
	Marzo	1531	1531
	Abril	1514	1514
	Mayo	386	386
	Junio	889	889
	Julio	1572	1572

UF5			
AÑO	PIEZAS COMUNICATIVAS		
	MES	ELABORADAS	ENTREGADAS
	Agosto	2258	2258
	Septiembre	2910	2910
	Octubre	222	222
	Noviembre	166	166
	Diciembre	461	461
2019	Enero	2332	2332
	Febrero	2267	2267
	Marzo	1182	1182
	Abril	2630	2630
	Mayo	6486	6486
	Junio	1494	1494
	Julio	6992	6992
	Agosto	2563	2563
	septiembre	938	938
	Octubre	1165	1165
	Noviembre	1934	1934
	Diciembre	1278	1278
2020	Enero	981	981
	Febrero	3090	3090
	Marzo	658	658
	Abril	426	426
	Mayo	372	372
	Junio	1473	1473
	Julio	1158	1158
	Agosto	1208	1208
	Septiembre	1208	1208
	Octubre	729	729
	Noviembre	1151	1151
	Diciembre	712	712
2021	Enero	731	741
	Febrero	264	264
	Marzo	1655	1655
	Abril	320	320
	Mayo	615	615
	Junio	775	775

Fuente: Concesión Alto Magdalena S.A.S., 2021

En cuanto a las reuniones de socialización, para el mes de junio no se generaron reuniones, Las socializaciones en acumulado son:

Tabla 66 Socializaciones en acumulado a Junio 2021

Indicador	Programadas	Convocados	Asistentes	% de asistencia
Reuniones de Socialización	347	6826	6889	98%

Fuente: Concesión Alto Magdalena S.A.S., 2021

Tabla 67 Socializaciones realizadas por UF a Junio 2021

UF1				
AÑO	MES	SOCIALIZACIONES		
		PROGRAMADAS	CONVOCADOS	ASISTENTES
2015	Octubre	8	97	103
	Noviembre			
	Diciembre			
2016	Enero	1	12	19
	Febrero	1	13	19
	Marzo	0	0	0
	Abril	0	0	0
	Mayo	0	0	0
	Junio	0	0	0
	Julio	1	25	25
	Agosto	2	28	28
	Septiembre	0	0	0
	Octubre	0	0	0
	Noviembre	0	0	0
	Diciembre	6	90	90
2017	Enero	6	90	90
	Febrero	0	0	0
	Marzo	0	0	0
	Abril	0	0	0
	Mayo	1	12	12
	Junio	2	23	23
	Julio	0	0	0
	Agosto	2	14	14
	Septiembre	7	80	73
	Octubre	1	13	13
	Noviembre	0	0	0
	Diciembre	0	0	0
2018	Enero	0	0	0
	Febrero	0	0	0
	Marzo	1	5	5
	Abril	0	0	0
	Mayo	5	67	67
	Junio	3	29	29
	Julio	0	0	0
	Agosto	0	0	0
	Septiembre	0	0	0
	Octubre	0	0	0
	Noviembre	0	0	0
	Diciembre	0	0	0
2019	Enero	1	10	10
	Febrero	1	5	5
	Marzo	0	0	0
	Abril	0	0	0
	Mayo	0	0	0
	Junio	0	0	0
	Julio	0	0	0
	Agosto	0	0	0
	Septiembre	0	0	0

UF1				
AÑO	MES	SOCIALIZACIONES		
		PROGRAMADAS	CONVOCADOS	ASISTENTES
	Octubre	0	0	0
	Noviembre	0	0	0
	Diciembre	0	0	0
2020	enero	0	0	0
	Febrero	0	0	0
	Marzo	1	4	4
	Abril	0	0	0
	Mayo	0	0	0
	Junio	0	0	0
	Julio	0	0	0
	Agosto	0	0	0
	Septiembre	0	0	0
	Octubre	0	0	0
	Noviembre	0	0	0
	Diciembre	0	0	0
2021	Enero	0	0	0
	Febrero	0	0	0
	Marzo	0	0	0
	Abril	0	0	0
	Mayo	0	0	0
	Junio	0	0	0

UF2				
AÑO	MES	SOCIALIZACIONES		
		PROGRAMADAS	CONVOCADOS	ASISTENTES
2015	Octubre	12	158	152
	Noviembre			
	Diciembre			
2016	Enero	1	20	14
	Febrero	2	25	30
	Marzo	3	124	100
	Abril	0	0	0
	Mayo	0	0	0
	Junio	0	0	0
	Julio	2	40	40
	Agosto	0	0	0
	Septiembre	2	34	23
	Octubre	0	0	0
	Noviembre	0	0	0
	Diciembre	0	0	0
2017	Enero	3	60	60
	Febrero	0	0	0
	Marzo	0	0	0
	Abril	0	0	0
	Mayo	0	0	0
	Junio	0	0	8
	Julio	1	8	8
	Agosto	3	31	31

UF2				
AÑO	MES	SOCIALIZACIONES		
		PROGRAMADAS	CONVOCADOS	ASISTENTES
	Septiembre	7	159	152
	Octubre	0	0	0
	Noviembre	0	0	0
	Diciembre	0	0	0
2018	Enero	0	0	0
	Febrero	0	0	0
	Marzo	0	0	0
	Abril	0	0	0
	Mayo	5	62	62
	Junio	3	25	59
	Julio	3	56	56
	Agosto	0	0	0
	Septiembre	0	0	0
	Octubre	0	0	0
	Noviembre	0	0	0
	Diciembre	0	0	0
2019	Enero	2	16	16
	Febrero	1	5	5
	Marzo	0	0	0
	Abril	0	0	0
	Mayo	0	0	0
	Junio	0	0	0
	Agosto	0	0	0
	Septiembre	0	0	0
	Octubre	0	0	0
	Noviembre	0	0	0
	Diciembre	0	0	0
2020	Enero	0	0	0
	Febrero	0	0	0
	Marzo	1	4	4
	Abril	0	0	0
	Mayo	0	0	0
	Junio	0	0	0
	Julio	0	0	0
	Agosto	0	0	0
	Septiembre	0	0	0
	Octubre	0	0	0
	Noviembre	0	0	0
	Diciembre	0	0	0
2021	Enero	0	0	0
	Febrero	0	0	0
	Marzo	0	0	0
	Abril	0	0	0
	Mayo	0	0	0
	Junio	0	0	0

UF3				
AÑO	PIEZAS COMUNICATIVAS	SOCIALIZACIONES		
	MES	PROGRAMADAS	CONVOCADOS	ASISTENTES
2015	Octubre	0	0	0
	Noviembre			
	Diciembre			
2016	Enero	2	13	36
	Febrero	3	44	60
	Marzo	3	70	69
	Abril	0	0	0
	Mayo	0	0	0
	Junio	0	0	0
	Julio	3	38	38
	Agosto	0	0	0
	Septiembre	0	0	0
	Octubre	0	0	0
	Noviembre	0	0	0
	Diciembre	0	0	0
2017	Enero	1	18	18
	Febrero	0	0	0
	Marzo	0	0	0
	Abril	0	0	0
	Mayo	0	0	0
	Junio	0	0	0
	Julio	0	0	0
	Agosto	1	178	178
	Septiembre	4	99	99
	Octubre	3	62	62
	Noviembre	3	24	24
	Diciembre	0	0	0
2018	Enero	0	0	0
	Febrero	2	18	18
	Marzo	3	68	68
	Abril	0	0	0
	Mayo	1	18	18
	Junio	1	34	34
	Julio	1	22	22
	Agosto	2	45	45
	Septiembre	2	11	11
	Octubre	0	0	0
	Noviembre	3	69	135
	Diciembre	0	0	0
2019	Enero	6	86	99
	Febrero	1	24	24
	Marzo	0	0	0
	Abril	0	0	0
	Mayo	0	0	0
	Junio	0	0	0
	Julio	5	75	75
	Agosto	1	10	12
	Septiembre	0	0	0
	Octubre	0	0	0
	Noviembre	0	0	0

UF3				
AÑO	PIEZAS COMUNICATIVAS	SOCIALIZACIONES		
	MES	PROGRAMADAS	CONVOCADOS	ASISTENTES
2020	Diciembre	0	0	0
	Enero	0	0	0
	Febrero	0	0	0
	Marzo	2	8	8
	Abril	0	0	0
	Mayo	0	0	0
	Junio	0	0	0
	Julio	0	0	0
	Agosto	0	0	0
	Septiembre	0	0	0
	Octubre	0	0	0
	Noviembre	0	0	0
	Diciembre	0	0	0
2021	Enero	0	0	0
	Febrero	0	0	0
	Marzo	0	0	0
	Abril	0	0	0
	Mayo	0	0	0
	Junio	0	0	0

UF3				
AÑO	MES	SOCIALIZACIONES		
		PROGRAMADAS	CONVOCADOS	ASISTENTES
2015	Octubre	11	258	267
	Noviembre			
	Diciembre			
2016	Enero	1	12	28
	Febrero	5	62	76
	Marzo	5	279	334
	Abril	1	12	15
	Mayo	1	5	10
	Junio	0	0	0
	Julio	1	41	41
	Agosto	4	52	134
	Septiembre	0	0	0
	Octubre	0	0	0
	Noviembre	0	0	0
	Diciembre	1	19	19
2017	Enero	0	0	0
	Febrero	1	32	32
	Marzo	2	43	43
	Abril	4	85	85
	Mayo	4	45	116
	Junio	0	0	0
	Julio	0	0	0
	Agosto	4	55	55
	Septiembre	5	273	149
	Octubre	2	46	46
	Noviembre	1	6	6

UF3				
AÑO	MES	SOCIALIZACIONES		
		PROGRAMADAS	CONVOCADOS	ASISTENTES
	Diciembre	1	20	27
2018	Enero	0	0	0
	Febrero	1	32	32
	Marzo	0	0	0
	Abril	0	0	0
	Mayo	2	60	60
	Junio	2	21	25
	Julio	0	0	0
	Agosto	0	0	0
	Septiembre	0	0	0
	Octubre	0	0	0
	Noviembre	2	10	10
	Diciembre	0	0	0
2019	Enero	3	72	72
	Febrero	0	0	0
	Marzo	0	0	0
	Abril	0	0	0
	Mayo	0	0	0
	Junio	0	0	0
	Julio	0	0	0
	Agosto	0	0	0
	Septiembre	0	0	0
	Octubre	0	0	0
	Noviembre	0	0	0
	Diciembre	0	0	0
2020	Enero	0	0	0
	Febrero	0	0	0
	Marzo	0	0	0
	Abril	0	0	0
	Mayo	0	0	0
	Junio	0	0	0
	Julio	0	0	0
	Agosto	0	0	0
	Septiembre	0	0	0
	Octubre	0	0	0
	Noviembre	0	0	0
	Diciembre	0	0	0
2021	Enero	0	0	0
	Febrero	0	0	0
	Marzo	0	0	0
	Abril	0	0	0
	mayo	0	0	0
	Junio	0	0	0

UF5				
AÑO	PIEZAS COMUNICATIVAS	SOCIALIZACIONES		
	MES	PROGRAMADAS	CONVOCADOS	ASISTENTES
2015	Octubre	0	0	0
	Noviembre	0	0	0
	Diciembre	0	0	0
2016	Enero	0	0	0
	Febrero	1	12	26
	Marzo	12	175	382
	Abril	1	12	23
	Mayo	2	52	36
	Junio	0	0	0
	Julio	0	0	0
	Agosto	2	26	27
	Septiembre	2	116	130
	Octubre	9	456	222
	Noviembre	0	0	0
	Diciembre	1	35	35
2017	Enero	0	0	0
	Febrero	0	0	0
	Marzo	1	68	68
	Abril	2	20	20
	Mayo	1	28	28
	Junio	2	14	14
	Julio	2	23	23
	Agosto	6	38	38
	Septiembre	2	10	10
	Octubre	4	85	85
	Noviembre	4	75	65
	Diciembre	2	7	7
2018	Enero	0	0	0
	Febrero	3	22	22
	Marzo	1	5	5
	Abril	8	155	155
	Mayo	9	117	117
	Junio	10	156	153
	Julio	2	49	49
	Agosto	4	39	39
	Septiembre	14	222	153
	Octubre	4	121	84
	Noviembre	3	69	135
	Diciembre	0	0	0
2019	Enero	2	34	34
	Febrero	5	289	289
	Marzo	2	59	59
	Abril	3	55	55
	Mayo	11	205	205
	Junio	12	213	213
	Julio	13	222	222
	Agosto	3	30	35
	Septiembre	0	0	0

UF5				
AÑO	PIEZAS COMUNICATIVAS	SOCIALIZACIONES		
	MES	PROGRAMADAS	CONVOCADOS	ASISTENTES
	Octubre	3	20	20
	Noviembre	0	0	0
	Diciembre	1	4	4
2020	Enero	3	14	14
	Febrero	6	63	63
	Marzo	1	15	15
	Abril	0	0	0
	Mayo	1	11	11
	Junio	0	0	0
	Julio	5	39	39
	Agosto	0	0	0
	Septiembre	0	0	0
	Octubre	0	0	0
	Noviembre	0	0	0
	Diciembre	0	0	0
2021	Enero	0	0	0
	Febrero	0	0	0
	Marzo	0	0	0
	Abril	0	0	0
	Mayo	0	0	0
	Junio	0	0	0

Fuente: Concesión Alto Magdalena S.A.S., 2021

2.3.13 PROGRAMA DE APOYO A LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL

La Concesión implementa jornadas informativas y de capacitación con las diferentes instituciones, entes municipales y entes de vigilancia (Policía de carreteras) en miras de propiciar un mejor escenario para el desarrollo del proyecto, dando a conocer la diferente normatividad que permite mantener la custodia y/o recuperación de las áreas de espacio público (derecho de vía).

Es así como desde el año 2015 al año 2021 se han ejecutado las siguientes actividades.

Tabla 68 Relación de comunicados dirigidos a instituciones en Junio 2021

COMUNICADOS	UF	MES	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	ASUNTO
			CANT	CANT	CANT	CANT	CANT	CANT	CANT	
155	UF1	ENERO	0	1	0	0	0	0	0	Información sobre la Resolución 716 del 2015. Permisos para el uso, ocupación e intervención temporal de
		FEBRERO	0	0	0	0	1	2	0	
		MARZO	0	0	0	0	0	0	0	
		ABRIL	0	0	0	0	0	0	0	
		MAYO	0	0	0	1	0	0	0	
		JUNIO	0	0	0	1	2	0	0	
		JULIO	2	0	1	0	1	0		
		AGOSTO	0	0	0	3	0	0		
		SEPTIEMBRE	0	0	0	0	0	0		

COMUNICADOS	UF	MES	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	ASUNTO
			CANT	CANT	CANT	CANT	CANT	CANT	CANT	
		OCTUBRE	0	0	0	0	0	0		la infraestructur a vial carretera concesionada . Instalación y funcionamient o COSO MUNICIPAL (alcaldías)
		NOVIEMBRE	0	0	0	0	0	0		
		DICIEMBRE	0	0	0	0	0	0		
	UF2	ENERO	0	0	0	0	1	0	0	
		FEBRERO	0	1	0	0	1	2	0	
		MARZO	0	0	0	0	0	0	1	
		ABRIL	0	0	0	0	1	0	0	
		MAYO	0	0	0	1	3	2	1	
		JUNIO	0	0	0	0	0	0	0	
		JULIO	0	0	0	0	0	0		
		AGOSTO	0	0	0	1	0	0		
		SEPTIEMBRE	0	0	0	0	0	0		
		OCTUBRE	0	0	0	2	0	0		
		NOVIEMBRE	0	0	0	2	0	0		
		DICIEMBRE	0	0	2	1	0	0		
	UF3	ENERO	0	0	0	0	2	1	3	
		FEBRERO	0	0	0	1	2	3	1	
		MARZO	0	1	1	0	1	0	1	
		ABRIL	0	0	0	0	2	0	0	
		MAYO	0	1	0	1	0	0	3	
		JUNIO	0	0	0	0	2	1	1	
		JULIO	0	0	0	1	0	0		
		AGOSTO	0	1	0	2	0	0		
		SEPTIEMBRE	1	0	1	0	2	0		
		OCTUBRE	0	0	0	3	1	0		
		NOVIEMBRE	0	0	0	4	4	3		
		DICIEMBRE	0	0	0	1	0	0		
	UF4	ENERO	0	0	0	1	0	0	0	
		FEBRERO	0	0	0	1	1	3	0	
		MARZO	0	1	0	0	0	1	0	
		ABRIL	0	0	0	0	0	0	0	
		MAYO	0	0	1	0	0	0	0	
		JUNIO	0	1	0	0	0	0	0	
		JULIO	0	0	3	0	0	0	0	
		AGOSTO	0	0	1	0	0	0		
		SEPTIEMBRE	0	1	1	0	0	0		
		OCTUBRE	1	0	1	1	0	0		
		NOVIEMBRE	0	0	2	2	0	0		
		DICIEMBRE	0	0	0	1	0	0		
	UF5	ENERO	0	0	0	1	0	2	1	
		FEBRERO	0	0	0	5	1	3	0	
		MARZO	0	1	0	0	2	0	3	
		ABRIL	0	0	1	4	0	0	1	
		MAYO	0	0	0	0	0	2	2	
		JUNIO	0	0	0	1	2	0	1	
		JULIO	0	1	0	1	0	0		
		AGOSTO	0	0	1	1	2	0		
		SEPTIEMBRE	1	0	0	0	2	0		
OCTUBRE		0	0	0	2	1	0			
NOVIEMBRE		0	1	0	0	0	1			
DICIEMBRE		0	0	2	1	1	0			
TOTAL			5	11	18	47	38	26	19	

Fuente: Concesión Alto Magdalena S.A.S., 2021

Tabla 69 Solicitudes restitución espacio Público/Capacitaciones a Junio 2021

COMUNICADOS	UF	MES	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	ASUNTO
			CANT	CANT	CANT	CANT	CANT	CANT	CANT	
206	UF1	ENERO	0	1	0	0	0	0	0	Solicitud de Restitución de Bienes de Uso Público / Capacitación en normatividad vigente de ley 1228, Restitución de Bienes de Uso Público (alcaldías municipales)
		FEBRERO	0	0	0	0	1	0	0	
		MARZO	0	0	0	0	1	2	0	
		ABRIL	0	0	0	3	0	0	0	
		MAYO	0	0	0	1	0	2	0	
		JUNIO	0	0	0	1	0	1	0	
		JULIO	2	0	1	0	0	3		
		AGOSTO	0	0	0	0	0	0		
		SEPTIEMBRE	0	0	0	2	1	2		
		OCTUBRE	1	1	0	0	0	0		
		NOVIEMBRE	0	0	0	0	1	0		
		DICIEMBRE	0	0	0	0	0	0		
	UF2	ENERO	0	0	0	0	1	0	0	
		FEBRERO	0	0	0	0	2	0	0	
		MARZO	0	1	0	0	1	0	0	
		ABRIL	0	0	0	0	0	0	0	
		MAYO	0	0	0	1	0	0	0	
		JUNIO	0	0	1	2	0	0	0	
		JULIO	0	0	0	0	0	0		
		AGOSTO	0	0	0	2	0	1		
		SEPTIEMBRE	0	0	0	1	0	1		
		OCTUBRE	1	1	1	3	2	0		
		NOVIEMBRE	0	0	0	1	0	0		
		DICIEMBRE	0	0	0	0	0	0		
	UF3	ENERO	0	0	0	0	2	1	0	
		FEBRERO	0	0	0	2	2	0	2	
		MARZO	0	1	0	1	1	0	0	
		ABRIL	0	0	0	1	4	0	0	
		MAYO	0	0	0	0	0	0	0	
		JUNIO	0	0	0	0	0	0	1	
		JULIO	0	0	1	0	0	0		
		AGOSTO	0	0	0	2	0	0		
		SEPTIEMBRE	0	1	0	2	0	0		
		OCTUBRE	1	0	1	0	1	1		
		NOVIEMBRE	0	0	0	4	0	0		
		DICIEMBRE	0	0	1	1	0	0		
	UF4	ENERO	0	0	0	2	0	0	0	
		FEBRERO	0	0	0	2	1	0	0	
		MARZO	0	1	0	2	0	0	0	
		ABRIL	0	0	0	0	2	0	0	
		MAYO	0	0	1	0	0	0	2	
		JUNIO	0	1	0	2	0	0	1	
		JULIO	0	0	1	1	0	0		
		AGOSTO	0	0	0	1	0	0		
		SEPTIEMBRE	0	1	1	0	0	0		
		OCTUBRE	1	0	0	2	2	1		
		NOVIEMBRE	0	0	1	1	1	0		
		DICIEMBRE	0	0	1	0	0	0		
	UF5	ENERO	0	0	1	3	2	2	0	

COMUNICADOS	UF	MES	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	ASUNTO
			CANT	CANT	CANT	CANT	CANT	CANT	CANT	
		FEBRERO	0	1	1	2	5	5	1	
		MARZO	0	1	0	1	1	0	0	
		ABRIL	0	0	1	3	5	0	0	
		MAYO	0	1	0	3	4	2	4	
		JUNIO	0	1	0	1	2	1		
		JULIO	0	0	1	2	4	2		
		AGOSTO	0	0	0	1	2	0		
		SEPTIEMBRE	0	1	0	1	2	0		
		OCTUBRE	1	0	1	3	1	1		
		NOVIEMBRE	0	1	2	10	2	1		
		DICIEMBRE	1	0	1	3	4	0		
TOTAL			8	15	19	76	60	30	18	

Fuente: Concesión Alto Magdalena S.A.S., 2021

Tabla 70 Reuniones o Gestiones con Autoridades Municipales y/o de Policía a Mayo 2021

Total, Reuniones	UF	MES	2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
			CANT	ASIST	CANT	ASIST	CANT	ASIST	CANT	ASIST	CANT	ASIST	CANT	ASIST	CANT	ASIST
	UF1	ENERO	0	0	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FEBRERO	0	0	0	0	1	7	0	0	0	0	0	0	0	0
		MARZO	1	8	0	0	1	6	1	2	0	0	2	5	0	0
		ABRIL	1	10	1	7	1	5	1	10	2	15	0	0	0	0
		MAYO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	15	0	0
		JUNIO	0	0	0	0	1	8	0	0	0	0	0	0	0	0
		JULIO	2	10	1	7	1	6	3	18	1	5	0	0		
		AGOSTO	0	0	0	0	1	7	0	0	0	0	0	0		
		SEPTIEMBRE	0	0	0	0	2	16	0	0	0	0	0	0		
		OCTUBRE	1	4	0	0	1	5	0	0	1	2	0	0		
		NOVIEMBRE	0	0	0	0	1	8	0	0	1	2	0	0		
		DICIEMBRE	1	6	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0
	UF2	ENERO	0	0	0	0	1	7	2	4	3	24	1	2	0	0
		FEBRERO	0	0	1	6	0	0	2	10	0	0	0	0	0	0
		MARZO	1	6	1	4	4	27	2	17	0	0	2	6	0	0
		ABRIL	0	0	0	0	0	0	1	26	1	2	0	0	0	0
		MAYO	1	5	0	0	0	0	2	13	1	13	1	15	0	0
		JUNIO	2	10	1	5	3	18	0	0	5	18	0	0		
		JULIO	1	5	0	0	0	0	8	67	1	5	4	10		
		AGOSTO	0	0	0	0	0	0	2	5	0	0	0	0		
		SEPTIEMBRE	0	0	1	5	4	29	2	12	3	20	0	0		
		OCTUBRE	1	7	1	7	4	32	1	5	3	7	0	0		
		NOVIEMBRE	1	7	1	9	2	17	0	0	1	12	0	0		
		DICIEMBRE	0	0	0	0	0	0	2	8	0	0	0	0		
	UF3	ENERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	8	0	0
		FEBRERO	1	7	0	0	0	0	1	4	0	0	4	8	1	16
		MARZO	0	0	1	6	0	0	1	3	1	5	6	26	2	22
		ABRIL	1	8	0	0	0	0	0	0	1	5	0	0	0	0
		MAYO	0	0	0	0	0	0	3	25	3	23	1	15	1	13
		JUNIO	1	5	0	0	2	10	1	8	3	11	2	5	1	12
		JULIO	0	0	1	7	1	6	0	0	5	24	2	17		
		AGOSTO	1	8	0	0	0	0	1	15	1	4	1	4		

Total, Reunione s	UF	MES	2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		
			CANT	ASIST	CANT	ASIST	CANT	ASIST	CANT	ASIST	CANT	ASIST	CANT	ASIST	CANT	ASIST	
		SEPTIEMBR E	0	0	0	0	1	7	3	9	4	15	0	0			
		OCTUBRE	1	4	1	9	0	0	5	54	4	9	1	6			
		NOVIEMBRE	1	8	0	0	0	0	0	0	7	23	2	21			
		DICIEMBRE	1	7	0	0	0	0	2	8	2	4	1	12			
	UF4	ENERO	0	0	0	0	0	0	1	4	1	2	1	14	1	2	
		FEBRERO	1	6	0	0	1	6	3	16	1	12	1	13	0	0	
		MARZO	1	5	2	18	1	8	0	0	1	2	2	14	0	0	
		ABRIL	1	5	0	0	0	0	1	4	4	29	0	0	0	0	
		MAYO	0	0	0	0	1	6	1	2	1	2	1	15	0	0	
		JUNIO	1	6	1	7	3	19	7	57	1	13	1	17	0	0	
		JULIO	0	0	0	0	3	14	3	24	1	17	0	0			
		AGOSTO	1	4	0	0	2	12	2	14	3	20	0	0			
		SEPTIEMBR E	0	0	1	5	4	24	3	21	0	0	0	0			
		OCTUBRE	1	8	0	0	2	13	4	30	2	20	1	6			
		NOVIEMBRE	1	8	1	5	1	7	3	22	1	2	0	0			
		DICIEMBRE	1	7	0	0	0	0	5	16	1	2	0	0			
		UF5	ENERO	0	0	0	0	0	0	2	17	7	41	6	45	0	0
			FEBRERO	0	0	0	0	1	8	2	24	12	93	9	81	0	0
			MARZO	1	10	1	6	1	5	2	12	5	16	1	3	1	10
			ABRIL	0	0	0	0	1	7	3	32	3	6	0	0	0	0
	MAYO		0	0	0	0	0	0	0	0	6	55	4	40	0	0	
	JUNIO		2	17	1	10	1	6	1	6	6	19	0	0	2	10	
	JULIO		0	0	0	0	2	17	0	0	6	31	1	2			
	AGOSTO		2	19	0	0	3	23	4	22	6	26	0	0			
	SEPTIEMBR E		0	0	1	6	1	8	4	19	0	0	0	0			
	OCTUBRE		1	7	0	0	1	7	1	2	4	23	1	5			
	NOVIEMBRE		1	8	1	5	0	0	8	19	4	10	0	0			
	DICIEMBRE		1	9	1	8	1	7	0	0	4	13	0	0			
TOTAL			36	244	22	147	62	418	108	688	134	702	64	439	9	85	

Fuente: Concesión Alto Magdalena S.A.S., 2021

Tabla 71 Gestiones de recuperación y/o Custodia de Espacio Público a Junio 2021

COMUNICADOS	UF	MES	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	ASUNTO
			CANT	CANT	CANT	CANT	CANT	CANT	CANT	
967	UF1	ENERO	0	1	1	2	1	0	0	Gestiones de recuperación y/o Custodia de Espacio Público a agosto 2017. a los municipios de Flandes, Girardot, Nariño, Guataquí, San Juan de Río Seco, Chaguaní, Guaduas, Honda, La Dorada, Puerto Salgar
		FEBRERO	0	1	0	1	0	0	0	
		MARZO	0	0	1	0	2	1	0	
		ABRIL	0	1	1	1	0	1	0	
		MAYO	0	1	1	0	1	1	0	
		JUNIO	1	0	1	2	4	1	0	
		JULIO	0	1	1	0	1	0		
		AGOSTO	0	0	2	0	2	0		
		SEPTIEMBRE	0	1	1	0	0	0		
		OCTUBRE	1	1	2	1	4	0		
		NOVIEMBRE	1	1	1	0	1	0		
		DICIEMBRE	0	0	1	1	0	0		
	UF2	ENERO	0	1	0	2	2	10	0	
		FEBRERO	1	1	1	2	0	2	0	
		MARZO	0	1	1	3	0	5	0	
		ABRIL	1	1	1	2	1	3	0	
		MAYO	0	1	1	3	3	1	1	
		JUNIO	0	0	2	4	2	7	0	
		JULIO	1	1	1	4	3	0		
		AGOSTO	1	1	1	5	1	2		
		SEPTIEMBRE	1	1	1	1	1	4		
		OCTUBRE	0	1	0	3	2	1		
		NOVIEMBRE	1	1	1	1	7	2		
		DICIEMBRE	0	0	1	4	1	0		
	UF3	ENERO	0	0	0	2	6	9	2	
		FEBRERO	0	1	0	5	6	7	0	
		MARZO	0	0	1	4	1	6	1	
		ABRIL	1	0	0	4	8	4	6	
		MAYO	0	1	0	4	3	13	0	
		JUNIO	0	1	1	4	15	10	0	
		JULIO	0	0	1	1	8	14		
		AGOSTO	0	1	0	5	13	3		
		SEPTIEMBRE	0	0	1	9	7	1		
		OCTUBRE	1	0	2	5	8	4		
		NOVIEMBRE	1	1	1	4	6	6		
		DICIEMBRE	1	0	0	9	18	0		
	UF4	ENERO	0	1	0	2	2	0	1	
		FEBRERO	0	1	1	7	6	1	0	
		MARZO	0	1	1	4	1	1	0	
		ABRIL	1	0	0	2	4	3	0	
		MAYO	0	1	1	4	3	12	2	
		JUNIO	0	1	1	2	11	19	0	
		JULIO	0	1	1	1	8	6		
		AGOSTO	0	1	2	1	10	4		
		SEPTIEMBRE	0	0	1	2	3	0		
		OCTUBRE	1	1	2	9	3	1		
		NOVIEMBRE	1	1	2	5	3	6		
		DICIEMBRE	0	1	1	4	2	1		
	UF5	ENERO	0	0	0	5	9	5	1	
		FEBRERO	0	1	1	6	18	23	2	
		MARZO	0	1	1	3	11	14	1	
		ABRIL	0	2	0	10	18	2	1	
		MAYO	1	1	0	11	7	14	5	
		JUNIO	0	1	2	13	8	15	1	
		JULIO	0	2	3	9	24	20		
		AGOSTO	0	1	2	2	12	2		
		SEPTIEMBRE	0	1	2	7	19	1		
		OCTUBRE	1	2	3	3	20	8		
		NOVIEMBRE	2	1	3	10	11	6		

COMUNICADOS	UF	MES	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	ASUNTO
			CANT	CANT	CANT	CANT	CANT	CANT	CANT	
		DICIEMBRE	1	1	2	6	13	1		
TOTAL			21	47	63	226	364	283	23	

Fuente: Concesión Alto Magdalena S.A.S., 2021

2.3.14 PROGRAMA DE CAPACITACION, EDUCACION Y CONCIENTIZACION DE LA COMUNIDAD

Teniendo en cuenta la coyuntura que se presenta en el país por la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19, continúan las medidas de autoprotección y cuidado para evitar posibles contagios.

En el mes de junio se realizó acercamiento con varias de las comunidades del área de influencia del corredor vial, para la programación de actividades, sin embargo, la mayoría de ellas manifiestan en abstenerse de participar en reuniones, mientras no pase el tercer pico de la pandemia, el cual está en un estado crítico.

Tabla 72 Capacitaciones con la comunidad Junio 2021

UF	N° CAPACITACIONES REALIZADAS	N° DE ASISTENTES
UF 1	0	0
UF 2	2	12
UF 3	0	0
UF 4	0	0
UF 5	1	10
Total	3	22

Fuente: Concesión Alto Magdalena S.A.S., 2021

Tabla 73 Consolidado capacitaciones con la comunidad al mes Mayo 2021

UNIDAD FUNCIONAL	N° CAPACITACIONES REALIZADAS	N° DE ASISTENTES
1	a Mayo 70	1496
2	a Mayo 76	1789
3	a Mayo 91	1285
4	a Mayo 94	1734
5	a Mayo 248	5012
TOTAL	Total Mayo 575	11.316

Fuente: Concesión Alto Magdalena S.A.S., 2021

2.3.15 PROGRAMA DE CULTURA VIAL

El programa está orientado en promover comportamientos adecuados relacionados con el uso y disfrute de la infraestructura vial que contribuya a la prevención y mitigación de accidentes.

En este mes se presentaron situaciones como el paro nacional y el tercer pico de la pandemia COVID-19, motivo por el cual, no se ejecutaron todas las actividades de prevención vial.

Tabla 74 Gestiones para la implementación del programa Junio 2021

UNIDAD FUNCIONAL	GESTIONES REALIZADAS	PARTICIPANTES
UF 1	3	9
UF 2	21	103
UF 3	40	395
UF 4	10	70
UF 5	64	493
TOTAL JUNIO	2	25
CONSOLIDADO	140	1095

Fuente: Concesión Alto Magdalena S.A.S., 2021

Tabla 75 Actividades Pedagógicas Junio 2021

UNIDAD FUNCIONAL	CAPACITACIONES	PARTICIPANTES
UF 1	59	1078
UF 2	71	1.389
UF 3	87	2.802
UF 4	68	1.848
UF 5	85	2.997
TOTAL JUNIO	0	0
CONSOLIDADO	370	10.114

Fuente: Concesión Alto Magdalena S.A.S., 2021

Tabla 76 Actividades de Campañas Trimestrales a Junio 2021

UNIDAD FUNCIONAL	ACTIVIDADES CAMPAÑA TRIMESTRAL	PARTICIPANTES
UF 1	46	1.283
UF 2	141	6.441
UF 3	117	9.297
UF 4	131	13.275
UF 5	271	32.509
TOTAL JUNIO	10	893
CONSOLIDADO	715	63.668

Fuente: Concesión Alto Magdalena S.A.S., 2021

Tabla 77 Actividades de Sensibilización peatones Junio 2021

MES	ACTIVIDADES	PARTICIPANTES
UF 1	58	986
UF 2	76	1.801
UF 3	85	3.063
UF 4	70	1.627
UF 5	79	6.066
TOTAL JUNIO	2	20
CONSOLIDADO	373	13.563

Fuente: Concesión Alto Magdalena S.A.S., 2021

2.3.16 PROGRAMA DE ARQUEOLOGIA PREVENTIVA

Para proteger el patrimonio arqueológico antes del inicio de las actividades de construcción y en cumplimiento de los lineamientos ambientales del proyecto, el Concesionario solicitó al ICANH la certificación sobre el estado del patrimonio arqueológico, con los debidos soportes para que el Instituto se pronuncie al respecto.

Mediante el radicado 0814 del 22 de febrero de 2016 se entregó la solicitud autorización de intervención arqueológica (Arqueología Preventiva) para la ejecución del plan de manejo arqueológico para el proyecto de construcción, rehabilitación, mejoramiento, operación y mantenimiento del corredor Honda - Puerto Salgar - Girardot unidades funcionales 1, 2 y 3.

Posteriormente, mediante el radicado 1603 del 6 de abril de 2016 se entregó la solicitud autorización de intervención arqueológica (Arqueología Preventiva) para la ejecución del plan de manejo arqueológico para el proyecto de construcción, rehabilitación, mejoramiento, operación y mantenimiento del corredor Honda - Puerto Salgar - Girardot unidades funcionales 4 y 5.

El 26 de febrero de 2018 se realizaron entregaron los siguientes documentos al ICANH. Adenda de modificación de personal 4, radicado 0934. Entrega de informe ejecutivo de trabajo de campo, radicado 0935.

El 2 de agosto hubo visita por parte del coordinador de arqueología de este instituto quien observó y valoró los procesos desempeñados en el laboratorio.

Entre el 01 de mayo de 2019 al 28 de mayo de 2019 se realizaron los siguientes trámites con el ICANH.

Asunto: Manejo y tenencia del material arqueológico. Según el No. De Radicado 2867 con fecha 27 de mayo del 2009.

Entre el 01 de Junio de 2019 al 28 de Junio de 2019 el ICANH no se realizaron trámites, se recibió la visita del personal del ICANH el día 13 de Junio de 2019.

Entre el 01 de Julio de 2019 al 28 de Julio de 2019 el ICANH no se realizaron trámites ante el ICANH.

El 24 de Julio del 2019 se realiza la visita a la Alcaldía de Tocaima, para conocer los sitios de posible Museo arqueológico.

El 12 de agosto del 2009 se realiza solicitud manejo y tenencia del material arqueológico. Según el No. De Radicado 4576.

El 12 de agosto del 2019 solicitud adendo de modificación de personal. Radicado No. 4575.

Entre el 01 de septiembre de 2019 al 30 de septiembre de 2019 se realizaron los siguientes trámites ante el ICANH.

-Asunto: Manejo y tenencia del material arqueológico. Autorización 5640 Según los No. De Radicado 5392 y 5393 con fecha 17 de septiembre del 2019.

-Asunto: Modificación de personal. Autorización 5640. No de radicado. Fecha 30 de septiembre.

Las actividades de arqueología preventiva para las UF 1, 2, 3, 4, 5, ya han terminado, está pendiente la entrega del informe final.

Tabla 78 Resumen Tramites ante el ICANH enero 2021

Trámites ante el ICANH							
N°	SECTOR	TIPO DE PERMISO A TRAMITAR	RADICADO ANTE EL ICANH		RADICADO RTA ICANH		ESTADO
1	1	Evaluación y Autorización Licencia Arqueológica Tramo Flandes - Girardot	10-feb-15	502	17-abr-15	1613	Aprobado
2	2	Evaluación y Autorización Licencia Arqueológica Tramo Girardot -Guataquí	10-feb-15	503	17-abr-15	1614	Aprobado
3	3	Intervención Arqueológica	12-feb-15	545	17-abr-15	1617	Aprobado
4	4	Intervención Arqueológica	12-feb-15	546	17-abr-15	1615	Aprobado
5	1	Evaluación y Autorización Licencia Arqueológica Tramo Flandes - Girardot	20-mar-15	1229	17-abr-15	1613	Aprobado
6	2	Intervención Arqueológica	20-mar-15	1231	17-abr-15	1614	Aprobado
7	3	Intervención Arqueológica	20-mar-15	1228	17-abr-15	1617	Aprobado
8	4	Intervención Arqueológica	20-mar-15	1230	17-abr-15	1615	Aprobado
9	5	Intervención Arqueológica	21-abr-15	1660	12/05/2015	2072	Aprobado
10	1	Informe final de prospección y PMA Tramo Flandes - Girardot	17-jun-15	2620	10-jul-15	3143	Aprobado
11	5	Plan Manejo Arqueológico	26-jun-15	2818	15-jul-15	3144	Aprobado

Trámites ante el ICAHN							
N°	SECTOR	TIPO DE PERMISO A TRAMITAR	RADICADO ANTE EL ICAHN		RADICADO RTA ICAHN		ESTADO
12	2	Plan Manejo Arqueológico	6-jul-15	2919	23-jul-15	3222	Aprobado
13	3	Plan Manejo Arqueológico	13-jul-15	3039	4-ago-15	3469	Aprobado
14	4	Plan Manejo Arqueológico	16-jul-15	3112	6-ago-15	3540	No Aprobado
15	1,2,3,4,5	Prospección Arqueológica zonas de ZODMES - Corredor vial	9-sep-15	3966	2-oct-15	4687	Aprobado
16	4	Correcciones al Plan de Manejo Arqueológico	25-sep-15	4245	22-oct-15	4996	No Aprobado
17	4.1	Plan Manejo Arqueológico autorizaciones temporales QBN-15032X y QBN-15031(Materiales de Construcción - UF 4.1	9-oct-15	4488	5-nov-15	5243	Aprobado
18	1	Plan Manejo Arqueológico	26-oct-15	4763	5-feb-16	485	Aprobado
19	4	Correcciones al Plan de Manejo Arqueológico	28-oct-15	4831	5-nov-15	5295	Aprobado
20	4.1	Plan Manejo Arqueológico autorizaciones temporales QBN-15032X y QBN-15031(Materiales de Construcción - UF 4.1	18-dic-15	5681	8-ene-16	117	No Aprobado
21	1,2,3	Autorización Intervención arqueológica	22-feb-16	814	11-mar-16	1087	No Aprobado
22	4.1	Plan Manejo Arqueológico autorizaciones temporales QBN-15032X y QBN-15031(Materiales de Construcción - UF 4.1	22-feb-16	813	11-mar-16	1084	No Aprobado
23	1,2,3	Autorización Intervención Arqueológica	16-mar-16	1256/1257	1-abr-16	1351	Aprobado

Trámites ante el ICAHN							
N°	SECTOR	TIPO DE PERMISO A TRAMITAR	RADICADO ANTE EL ICAHN		RADICADO RTA ICAHN		ESTADO
24	4,5	Ejecución del PMA fase Construcción	6-abr-16	1603	20-abr-16	1611	Aprobado
25	4.1	Plan Manejo Arqueológico autorizaciones temporales QBN-15032X y QBN-15031(Materiales de Construcción - UF 4.1	11-abr-16	1673	No Aprobado	No Aprobado	No Aprobado
26	4	Adendo modificadorio 001 a la autorización de trabajos de arqueología 5681	2-may-16	2071	24-abr-16	2262	Aprobado
27	4	Adendo modificadorio 002 a la autorización de trabajos de arqueología 5681	21-jun-16	2996	8-jul-16	3089	Aprobado
28	4.1	Solicitud de evaluación de informe arqueológico predio QBN-15032X y QBN-15031(Materiales de Construcción - UF 4.1	23-jun-16	3049	11-jul-16	3104	Aprobado
29	4	Adendo modificadorio 003 a la autorización de trabajos de arqueología 5681	14-jul-16	3479/3650	5-ago-16	3653	Aprobado
30	4	Adendo modificadorio 004 a la autorización de trabajos de arqueología 5681	19-jul-16	4129	13-sep-16	4361	Aprobado
31	3	Solicitud de adendo de exclusión	10-nov-16	5677	24-nov-16	-5677	Aprobado
32	4	Adendo modificadorio 005 a la autorización de trabajos de arqueología 5681	6-dic-16	6216	6-ene-17	35	Aprobado
33	4	Adendo modificadorio 006 a la autorización de trabajos de arqueología 5681	15-dic-16	6382	11-ene-17	66	Aprobado
34	1,2 y 3	Adendo modificadorio 006 a la autorización de	4-abr-17	1789	11-abr-17	2015	Aprobado

Trámites ante el ICAHN							
N°	SECTOR	TIPO DE PERMISO A TRAMITAR	RADICADO ANTE EL ICAHN		RADICADO RTA ICAHN		ESTADO
		trabajos de arqueología 5640					
35	3,4 y5	Adendo modificadorio 007 (2) a la autorización de trabajos de arqueología 5681	19-abr-17	1983	11-may-17	2014	Aprobado
36	3,4 y5	Adendo modificadorio 007 a la autorización de trabajos de arqueología 5681	15-ago-17	4082	26-oct-17	4330	Aptobado
37	4.1	Solicitud autorización arqueológica para prospección scv09031	5-sep-17	4470	23-oct-17	4820	Aprobado
38	5	Adendo modificadorio 008 a la autorización de trabajos de arqueología 5681	15-nov-17	5789	29-dic-17	6017	Aprobado-condicionado
39	3,4y5	Adendo modificadorio 009 a la autorización de trabajos de arqueología 5681	25-may-18	2678	6-jul-18	3391	Aprobado
40	1,2	Adendo modificadorio personal intervención 5640	26-feb-18	934	2 –may-18	1975	Aprobado
41	1,2	Respuesta Informe ejecutivo	26-feb-18	9345	24–may-18	2365	Con recomendaciones
42	1,2	Adendo de modificación N° 9 Prorroga	23-mar-18	1494	2 –may-18	1976	Aprobado
43	1,2	Convenios profesionales externos	29–may-18	2728	6-jul-18	3371	Aprobado
44	1,2	Periodo de vacaciones arqueóloga titular	29–may-18	2729	4-jul-18	2729	Aprobado
45	1,2	Propuesta análisis de hallazgos en laboratorio	3-sep-18	4625	5-oct-18	5036	Aprobado
46	1,2	Adendo Modificación personal	3-sep-18	4626	5-oct-18	5036	Aprobado
47	3,4y5	Adendo modificadorio 011 a la autorización de trabajos de arqueología 5681	11-mar-19	1251	16-abr-19	1793	Aprobado

Trámites ante el ICAHN							
N°	SECTOR	TIPO DE PERMISO A TRAMITAR	RADICADO ANTE EL ICAHN		RADICADO RTA ICAHN		ESTADO
48	1,2	Adendo prorroga Autorización	18-mar-19	1418	16-abr-19	1770	Aprobado
49	1,2	Adendo Modificación personal	18-mar-19	1419	16-abr-19	1770	Aprobado
50	1,2	Comunicación	12-ago-19	4576	18-oct-19	5949	Aprobado
51	1,2	Comunicación	17-sep-19	5392 y 5393	18-oct-19	5950	Aprobado
52	1,2	Modificación de adendo 13	30-sep-19	571	21-oct-19	6025	Aprobado

Las actividades de arqueología preventiva para las UF 1 y 2 han terminado, el día 14 de mayo de 2021 el ICAHN remitió una comunicación donde realizan la aprobación del informe final donde manifiesta:

“En consecuencia, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia – ICAHN aprueba el informe final de la Autorización de Intervención Arqueológica No.5640 para el proyecto”

EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANEJO ARQUEOLÓGICO PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR HONDA – PUERTO SALGAR – GIRARDOT. UNIDADES FUNCIONALES 1, 2 Y 3.

Por lo tanto, se ha dado cumplimiento a las obligaciones contraídas con la Autorización de Intervención Arqueológica No. 5640 expedida a su nombre y el informe final ha sido enviado a la Biblioteca especializada del ICAHN para su consulta pública”

Las actividades de arqueología para las UF 3,4 y 5 Han terminado, se está a la espera del informe final.

2.3.17 PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIOPREDIAL

2.3.1.1 ACTIVIDAD N° 1 Seguimiento del Plan de Compensaciones Socioeconómicas

Actividad N° 1: En relación con las unidades sociales con factores de compensación para el mes de junio del 2021 no se presentaron fichas sociales a interventoría.

Tabla 79 Identificación Unidades sociales con factores sociales junio 2021

PREDIO No.	RELACION CON EL INMUEBLE	TIPO DE UNIDAD SOCIAL			RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOCIAL	FACTOR RECOMENDADO (VALORES)			ACRDO DE RCTO (d/m/a)	FIRMA DE DIAGNOSTICO SOCIOECONOMICO (INTERVENTORIA)
		US R	USP	OUS		FARV (\$)	FAMOV (\$)	FARME (\$)		
N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A

Fuente: Concesión Alto Magdalena S.A.S., 2021

2.3.1.2 Visitas a Unidades Sociales beneficiarias del Factor de Apoyo al Restablecimiento de Vivienda y Factor de Apoyo por Movilización

Durante el mes de junio no se realizaron visitas de identificación de necesidades a las Unidades Sociales para el traslado.

2.3.1.3 Gestión a oferta inmobiliaria

Durante el mes no se realizaron gestiones de oferta inmobiliaria.

Gestiones UF2 - UF3 – UF 5

Durante el mes se realizaron seguimientos mediante visitas con las unidades sociales, verificando las condiciones de traslado, el proceso de adaptación al inmueble y la continuidad de las actividades productivas

Gestión y avances de traslados a Unidades sociales:

A continuación, se relacionan las unidades sociales ubicadas en los predios a intervenir por obras en los sectores de Puerto Bogotá (Realineamiento costado izquierdo) y Sector Glorieta hacia Norcasia – La Dorada, cuyos insumos prediales están en proceso de aprobación por la interventoría, sin embargo, aceptaron el traslado anticipado a las viviendas de reposición.

Tabla 80 Gestión inmobiliaria y procesos Unidades Sociales Realineamiento UF 5.1

PREDIOS		PROPIETARIO	RESPONSABLE DE LA US	RELACIÓN CON EL INMUEBLE	FICHA SOCIAL APROBADA	UNIDAD SOCIAL TRASLADADA SI /NO	FACTOR RESTABLECIMIENTO DE VIVIENDA PAGADO	OBSERVACIONES
ANTES	AHORA							
ALMA-40163	ALMA-5-0253	Municipio de Guaduas	Rubén Pescador	Mejoratorio	No	Si	No	Unidad social trasladada a la vivienda definitiva en el municipio de Mariquita - Tolima.
		Municipio de Guaduas	Pedro Pablo Romero	Mejoratorio	No	Si	No	Unidad social trasladada a la vivienda definitiva en la inspección de Puerto Bogotá.
		Municipio de Guaduas	Nancy Beltrán Caicedo	Mejoratorio	No	Si	No	Unidad social trasladada a la vivienda definitiva en la inspección de Puerto Bogotá.
		Municipio de Guaduas	William Basabe	Mejoratorio	No	Si	No	Unidad social trasladada a la vivienda definitiva en la inspección de Puerto Bogotá.
		Municipio de Guaduas	Martha Barrero	Mejoratorio	No	Si	No	Trasladada a la vivienda de reposición en Puerto Bogotá
		Municipio de Guaduas	Luis Ángel Ardila	Mejoratorio	No	Si	No	Unidad Social trasladada a la vivienda definitiva en la inspección de Puerto Bogotá.
		Municipio de Guaduas	Rosa Hermila Andrade	Mejoratorio	No	Si	No	Unidad Social trasladada a la vivienda definitiva en la ciudad de Ibagué
		Municipio de Guaduas	Blanca Lilia Gordillo	Mejoratorio	No	Si	No	Unidad social trasladada con arriendo a la misma vivienda de reposición hasta terminar la gestión de compra definitiva con los vendedores
		Municipio de Guaduas	Carlos Erasmo Guzmán	Mejoratorio	No	Si	No	Unidad social trasladada a la vivienda definitiva en el barrio Bogotá - Honda.

PREDIOS		PROPIETARIO	RESPONSABLE DE LA US	RELACIÓN CON EL INMUEBLE	FICHA SOCIAL APROBADA	UNIDAD SOCIAL TRASLADADA SI /NO	FACTOR RESTABLECIMIENTO DE VIVIENDA PAGADO	OBSERVACIONES
ANTES	AHORA							
ALMA-4-0164	ALMA-5-0254	Municipio de Guaduas	Pedro Pablo Mejía	Mejoratorio	No	Si	No	Unidad social trasladada a la vivienda definitiva en el municipio de Honda.
ALMA-4-0168	ALMA-5-0258	Municipio de Guaduas	Olga María Hernandez	Mejorataria	No	SI	No	Unidad Social trasladada a la vivienda definitiva en la inspección de Puerto Bogotá.
ALMA-4-0169	ALMA-5-0259	Municipio de Guaduas	Sandra Rodríguez	Mejorataria	No	Si	No	Unidad social trasladada a la vivienda definitiva en el municipio de Honda.
	ALMA-5-0261	Transito Mahecha	Teresa Gloria Lopez	Mejorataria	Si	SI	Si	Unidad social trasladada a la vivienda definitiva en el municipio de Honda.
	ALMA-5-0265	Shirley Rey Acuña	Ligia Acuña	Mejorataria	SI	SI	SI	Unidad Social trasladada a la vivienda definitiva en la inspección de Puerto Bogotá.
	ALMA-5-0268	Weimar Palacios y Otros	Diana Paola Palacio	Propietario	Si	SI	Si	Unidad social trasladada a la vivienda definitiva en el municipio de Honda.
ALMA-4-0179	ALMA-5-0269	Félix Antonio Curacas	Félix Antonio Curacas	Propietario	SI	Si	SI	Unidad social trasladada a la vivienda definitiva en el municipio de Honda.
ALMA-4-0182	ALMA-5-0272	Leydy Johana Aguirre Ruiz y Dagoberto Aguirre	Leydy Johana Aguirre	Propietaria	SI	Si	SI	Unidad Social trasladada a la vivienda definitiva en la inspección de Puerto Bogotá.

Fuente: Concesión Alto Magdalena S.A.S., 2021

A la fecha se tienen diez (10) familias identificadas en el sector de la Glorieta Norcasia UF 5.2. Con el propósito de adelantar las obras de construcción de la vía, de manera voluntaria las unidades sociales aceptaron el traslado temporal a las mismas viviendas de reposición, las cuales ya finalizaron con el proceso de escrituraron.

Tabla 81 Gestión con unidades sociales a trasladar La Dorada sector glorieta Norcasia

PREDIO	PROPIETARIO	RESPONSABLE DE LA US	RELACIÓN CON EL INMUEBLE	FICHA SOCIAL APROBADA	UNIDAD SOCIAL TRASLADADA SI /NO	FACTOR RESTABLECIMIENTO DE VIVIENDA PAGADO	OBSERVACIONES
ALMA-5-0075	Municipio de La Dorada	DALLYRA PEREZ	Mejorataria	Si	Si	SI	Unidad social trasladada
ALMA-5-0066	HOSPITAL SAN FELIX	EDWAR ALAPE RUIZ	Mejoratorio	Si	Si	Si	Unidad social trasladada
		LUZ MARINA LAPE RUIZ	Mejorataria	Si	Si	Si	Unidad social trasladada
		NEIFFY ESTRELLA	Mejorataria	Si	Si	Si	En proceso de traslado
ALMA-5-0125	MUNICIPIO DE LA DORADA	JAIME LEONEL RAMIREZ	Mejoratorio	Si	Si	Si	Unidad social trasladada
		BARBARA HERRERA	Mejorataria	Si	Si	Si	Unidad social trasladada
ALMA-5-0126	MUNICIPIO DE LA DORADA	EVER IRREÑO CORTES	Mejoratorio	Si	Si	Si	Unidad social trasladada
		MARTHA JARAMILLO	Mejoratorio	Si	Si	Si	Unidad social trasladada
		JESUS OVIDIO RUA	Mejoratorio	Si	Si	Si	Unidad social trasladada
ALMA-5-0137	DAVID	ROSA ATEHORTUA	Mejoratorio	Si	Si	Si	Unidad social trasladada

Fuente: Concesión Alto Magdalena S.A.S., 2021

Acompañamiento en firma de escrituras de la vivienda de reposición:

Durante este período no se realizaron acompañamientos para firma de escrituras públicas

Acompañamiento en el proceso de restablecimiento de servicios sociales:

Durante este período no se efectuaron acompañamientos para el restablecimiento de servicios sociales a las unidades sociales, por no aplicar esta condición para el presente mes.

Seguimiento a Unidades Sociales Trasladas

Visita N° 1 visita seguimiento

Tabla 82 Visita N° 1 de seguimiento US trasladadas

PREDIO ADQUIRIDO	BENEFICIARIO (trasladado)	TIPO DE UNIDAD SOCIAL	ACTIVIDAD DESARROLLADA
N.A	N.A	N.A	N.A

Fuente: Concesión Alto Magdalena S.A.S., 2021

Visita N°2 visitas de seguimiento

Durante este mes se realizaron 3 visitas de seguimiento No 2.

- 1- Se realizó segunda visita de seguimiento con el responsable de la Unidad Social Residente **Rosa Elvia Atehortua** del predio ALMA-5-0137, el día 26-05-2021, durante la visita se evidencia que continua contento con el cambio y se ha adaptado muy bien con sus nuevos vecinos.

Tabla 83 Unidades Sociales Trasladas

PREDIO ADQUIRIDO	BENEFICIARIO (trasladado)	TIPO DE UNIDAD SOCIAL	ACTIVIDAD DESARROLLADA
ALMA-5-0137	Rosa Atehortua	USR	Visita segundo Seguimiento a la vivienda de reposición

Fuente: Concesión Alto Magdalena S.A.S., 2021

Visita N°3 visitas de seguimiento y cierres

Durante este mes se realizaron las siguientes visitas de cierre:

- 1- Se realizó visita de Cierre con el responsable de la Unidad Social Residente y productiva **Irma Garzón** del predio ALMA-2-0119, el día 16-06-2021, durante la visita se evidencia que el responsable de la USR y USP está contenta con el cambio, aunque manifiesta que no pudo continuar con su actividad productiva. Por último se les recomienda no vender ni arrendar la casa.
- 2- Se realizó visita de Cierre con el responsable de la Unidad Social Residente y productiva **Jacobo Zarta** del predio ALMA-2-0121-1, el día 16-06-2021, durante la visita se evidencia que el responsable de la USR y USP está contento con el cambio, aunque manifiesta que cambio de actividad productiva, ya que en la zona urbana no le permiten tener sus galpones ni marraneras, actualmente tiene una pequeña venta de bisutería. Por último se les recomienda no vender ni arrendar la casa.
- 3- Se realizó visita de Cierre con el responsable de la Unidad Social Residente Amelia Trujillo del predio ALMA-2-0163, el día 16-06-2021, durante la visita se evidencia que la responsable de la USR está agradecida con el cambio. Por último se les recomienda no vender ni arrendar la casa.

- 4- Se realizó visita de Cierre con el responsable de la Unidad Social Productiva **Elizabeth Bonilla** del predio ALMA-5-0267, el día 16-06-2021, durante la visita se evidencia que la responsable de la USP está agradecida con el cambio, manifiesta que cuenta con 2 actividades productivas y que el cambio fue muy positivo para ella y su esposo.
- 5- Se realizó visita de Cierre con el responsable de la Unidad Social Residente **Henry Garzón** del predio ALMA-2-0118, el día 30-06-2021, durante la visita se evidencia que la responsable de la USR está agradecido con el cambio. Por último, se les recomienda no vender ni arrendar la casa.

Tabla 84 Visitas de cierre a seguimientos

PREDIO ADQUIRIDO	BENEFICIARIO (trasladado)	TIPO DE UNIDAD SOCIAL	ACTIVIDAD DESARROLLADA
ALMA-2-0119	Irma Garzón	USR USP	Cierre de los seguimientos por parte del Concesionario
ALMA-2-0121-1	Jacobo Zarta	USR USP	Cierre de los seguimientos por parte del Concesionario
ALMA-2-0163	Amelia Trujillo	USR	Cierre de los seguimientos por parte del Concesionario
ALMA-5-0267	Elizabeth Bonilla	USP	Cierre de los seguimientos por parte del Concesionario
Alma-2-0118	Henry Garzón	USR	Cierre de los seguimientos por parte del Concesionario

Fuente: Concesión Alto Magdalena S.A.S., 2021

Con relación a los seguimientos de las unidades sociales de las reubicaciones temporales, se aclara que se debe esperar sean aprobados los insumos prediales, para continuar los seguimientos exigidos contractualmente, del acompañamiento a la gestión socio predial, y/o proceso de compra de las viviendas de reposición, proyectando el Concesionario informe descriptivo de la situación que aclare las fechas de traslados temporales y definitivos.

Por otro lado, se realizaron las visitas de verificación a las unidades sociales trasladadas anticipadamente que estaban ubicadas en la inspección de Puerto Bogotá –Realineamiento UF5.1

Tabla 85 Verificación de traslados anticipados UF5

N°	PREDIO ADQUIRIDO	BENEFICIARIO (trasladado)	TIPO DE UNIDAD SOCIAL	FECHA DE VISITA	MUNICIPIO DE TRASLADO
1	ALMA-5-0253	Rosa Ermila Andrade	USR	19/02/2019	Ibague
2		Nancy Beltrán	USR	19/02/2019	Honda
3		Carlos Erasmo Guzmán	USR	19/02/2019	Honda
4	ALMA-5-0253	William Basabe	USR	19/02/2019	Puerto Bogotá

N°	PREDIO ADQUIRIDO	BENEFICIARIO (trasladado)	TIPO DE UNIDAD SOCIAL	FECHA DE VISITA	MUNICIPIO DE TRASLADO
5		Pedro Pablo Romero	USR	19/02/2019	Puerto Bogotá
6		Blanca Lilia Gordillo	USR	19/02/2019	Puerto Bogotá
7		Luis Ángel Ardila	USR	19/02/2019	Puerto Bogotá
8	ALMA-5-0254	Pedro Pablo Mejía	USR	19/02/2019	Puerto Bogotá
9	ALMA-5-0267	Saúl Calderón	USR	19/02/2019	Puerto Bogotá
10	ALMA-5-0256	Olga Hernández	USR	19/02/2019	Puerto Bogotá

Fuente: Concesión Alto Magdalena S.A.S., 2021

Reuniones interinstitucionales:

Durante este período no se efectuaron reuniones interinstitucionales en relación con los acompañamientos y seguimientos a las unidades sociales de las unidades funcionales.

2.3.18 PLAN DE COMPENSACIONES SOCIO ECONÓMICAS

Se relaciona a continuación el resumen de las actividades desarrolladas por el área de gestión Socio - predial, durante este periodo para las Unidades Funcionales N° 2 – 3 – 4 y 5.

Tabla 86 Resumen de Actividades Gestión Socio-Predial

ACTIVIDAD	CANTIDAD
Atención a propietarios/mejoratorios en oficina	0
Reuniones en predios	0
Acompañamiento Gestión Inmobiliaria	0
Proyección Respuesta PQR	0
Revisión Ficha Social F.12	0
Revisión Ficha Social F.13	0
Revisión Ficha Social F.14	0
Revisión Ficha Social F.15	0
Revisión Ficha Social F.16	0
Revisión de Acuerdos de reconocimiento	0
Acompañamiento a equipo técnico y jurídico en la organización de reuniones con la comunidad/levantamiento actas de reunión/caracterización socioeconómica...	0
Actualización del Plan de Compensaciones	1
Comité Socio-predial	0

Fuente: Concesión Alto Magdalena S.A.S., 2021

A continuación, se presenta un resumen por Unidad Funcional del número total de predios, Unidades Sociales identificadas y pago de compensaciones realizadas en el mes de junio 2021.

Tabla 87 Resumen Unidades Funcionales

Unidad Funcional	N° Total de predios	N° Total de Unidades sociales	N° Total de Unidades sociales productivas	N° Total de Unidades sociales residentes	Valor compensaciones Pagadas
UF1	18	3	1	2	\$ 5,515,640.00
UF2	144	98	38	58	\$ 1,774,687,592.20
UF3	135	72	16	44	\$ 416,358,744.90
UF4.1	6	0	0	0	\$ -
UF4.2	70	8	3	4	\$ 57,256,914.00
UF 5.1	86	95	10	78	\$ 54,068,283.00
UF 5.2	44	60	18	30	\$ 633.190.076.00
UF 5.3	2	0	0	0	\$ -
UF 5.4	30	2	1	1	\$ 10,156,146.00
TOTAL	535	338	87	217	\$ 3.651,233,396.10

Fuente: Concesión Alto Magdalena S.A.S., 2021

A continuación, se describen las actividades realizadas por parte del equipo socio predial del Concesionario, frente a la aplicación de los factores de compensación socioeconómica, definidos en la Resolución 545 de 2008 del INCO, hoy Agencia Nacional de Infraestructura ANI y la Resolución 1776 de 2015 de la ANI, los cuales son otorgados a los responsables de las Unidades Sociales identificadas dentro de los predios requeridos, con el objeto de mitigar el impacto socioeconómico causado por la ejecución del proyecto.

2.3.1.4 Insumos

Frente a la elaboración de insumos sociales en el mes de abril de 2021, no se levantaron fichas sociales.

Es importante tener en cuenta que el levantamiento de la Ficha Social, así como la elaboración del Registro Fotográfico y del Diagnostico Socioeconómico, está sujeto a la revisión y aprobación por parte de la Interventoría de la Ficha Predial, el Estudio de Títulos y el Avalúo.

Tabla 88 Resumen Fichas Sociales por Unidad Funcional

UNIDAD FUNCIONAL	GCSP-F-012	GCSP-F-013	GCSP-F-014	GCSP-F-015	GCSP-F-016
UF 1	0	0	0	0	0
UF 2	0	0	0	0	0
UF 3	0	0	0	0	0
UF 4	0	0	0	0	0
UF 5	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0	0	0	0

Fuente: Concesión Alto Magdalena S.A.S., 2021

2.3.1.5 Seguimiento del Plan de Compensaciones Socioeconómicas

En el mes de junio de 2021 se realizó la recomendación de factores sociales a través del formato F-016 Diagnostico Socioeconómico.

En el mes de junio de 2021 no se proyectaron Acuerdos de Reconocimiento de Compensaciones Socioeconómicas.

Tabla 89 Acuerdos de reconocimientos elaborados

PREDIO	TIPO DE U.S	BENEFICIA RIO	FAV(\$)	FAMOR(\$)	FAMOV (\$)	FARME (\$)	FAA (\$)	TOTAL	FECHA APROBACIO N
N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A

Fuente: Concesión Alto Magdalena S.A.S., 2021

2.3.19 FICHAS APROBADAS POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

En el mes de junio de 2021, se presentó un alcance al Diagnostico Socioeconómico del mejoratario N° 9 de predio ALMA-3-0069

Tabla 90 Fichas Sociales aprobadas por la interventoría

PREDIO ADQUIRIDO	BENEFICIARIO (trasladado)	TIPO DE UNIDAD SOCIAL	VISITA N°	FORMATO
ALMA-2-0119	Irma Garzon	USR-USP	3	GCSP-F-147
ALMA-2-0121-1	Jacobo Zarta	USR-USP	3	GCSP-F-147
ALMA-2-0163	Amelia Trujillo	USR	3	GCSP-F-147

Fuente: Concesión Alto Magdalena S.A.S., 2021

2.3.20 INFORME DE APLICACIÓN DE COMPENSACIONES SOCIOECONÓMICAS

Durante el mes de junio de 2021, la Concesión Alto Magdalena S.A.S realizó el pago de los siguientes factores sociales:

Tabla 91 Pago de compensaciones socioeconómicas

PREDIO	RESPONSABLE	FAV	FAMOR	FAMOV	FME	FAA	VALOR RECOMENDADO DIAGNOSTICO SOCIOECONOMICO	VALOR CANCELADO	VALOR CON DESCUENTO
ALMA-2-0136-1	Jairo Reyes	\$ 52,335,396	\$ 0	\$ 877,803	\$ 5,266,818	\$ 0	\$58,480,017	\$6,144,621	\$5,091,257*
ALMA-2-0136-1	Priscila Gaitan	\$ 73,800,844	\$ 0	\$ 908,526	\$ 5,451,156	\$ 0	\$80,160,526	\$6,359,682	\$5,269,451*
ALMA-2-0136-1	Fernando Nuñez	\$ 58,198,581	\$ 0	\$ 877,803	\$ 10,533,636	\$ 0	\$69,610,020	\$11,411,439	\$9,304,712*
ALMA-2-0136-1	Myriam Malaver	\$ 0	\$ 5,451,156	\$ 908,526	\$ 5,451,156	\$ 0	\$11,810,838	\$11,810,838	\$9,630,375*

Fuente: Concesión Alto Magdalena S.A.S., 2021

* Queda pendiente un pago para completar el valor de la compensación.

** Ultimo pago por parte de compensación socioeconómica

***Por parte de la DIAN se realizó un descuento del 20%

Tabla 92 Plan de compensaciones socio económicas

PLAN DE COMPENSACIONES SOCIO ECONÓMICAS							
FACTORES DE APOYO (VALOR ESTIMADO)							
Unidad Funcional	FARV (\$) Restablecimiento de Vivienda	FAMOR (\$) Moradores	FAMOV (\$) Movilización	FARME (\$) Restablecimiento de Medios Economicos	FARR (\$) Arrendadores	TOTAL	
UF 1	\$ -	\$ -	\$ 1,378,910	\$ 4,136,730	\$ -	\$ 5,515,640.00	
UF 2	\$ 1,551,241,404.20	\$ 58,007,616	\$ 48,786,996	\$ 167,348,718	\$ 1,650,000	\$ 1,827,034,734.20	
UF 3	\$ 182,249,756.90	\$ 95,023,077	\$ 37,471,171	\$ 84,507,720	\$ 17,812,242	\$ 417,063,966.90	
UF 4.1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
UF 4.2	\$ 24,464,271	\$ 11,718,630	\$ 3,909,559	\$ 16,264,454	\$ 900,000	\$ 57,256,914.00	
UF 5.1*	\$ 1,378,689,457	\$ 98,778,018	\$ 65,900,877	\$ 43,667,232	\$ 6,480,000	\$ 1,593,515,584.00	
UF 5.2	\$ 416,324,829	\$ 61,264,023	\$ 32,362,774	\$ 107,462,598	\$ 20,830,245	\$ 638,244,469.00	
UF 5.3	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
UF 5.4	\$ -	\$ 4,687,452	\$ 781,242	\$ 4,687,452	\$ -	\$ 10,156,146.00	
TOTAL	\$ 3,552,969,718	\$ 329,478,816	\$ 190,591,529	\$ 428,074,904	\$ 47,672,487	\$ 4,548,787,454.10	
VALOR ESTIMACION PLAN DE COMPENSACIONES SOCIO ECONÓMICAS ENERO 2021						\$ 4,548,787,454	
VALOR ESTIMACION PLAN DE COMPENSACIONES SOCIO ECONÓMICAS JULIO 2020						\$ 4,610,200,486	
VALOR ESTIMACION PLAN DE COMPENSACIONES SOCIO ECONÓMICAS ENERO 2020						\$ 4,698,939,461	
VALOR ESTIMACION PLAN DE COMPENSACIONES SOCIO ECONÓMICAS AGOSTO 2019						\$ 4,408,272,684	
VALOR ESTIMACION PLAN DE COMPENSACIONES SOCIO ECONÓMICAS ENERO 2019						\$ 4,269,844,007	
VALOR ESTIMACION PLAN DE COMPENSACIONES SOCIO ECONÓMICAS OCTUBRE 2018						\$ 4,082,203,809	
VALOR ESTIMACION PLAN DE COMPENSACIONES SOCIO ECONÓMICAS JULIO 2018						\$ 3,659,717,301	
VALOR ESTIMACION PLAN DE COMPENSACIONES SOCIO ECONÓMICAS FEBRERO 2018						\$ 3,195,179,944	
VALOR ESTIMACION PLAN DE COMPENSACIONES SOCIO ECONÓMICAS 2015						\$ 3,082,374,453	
SALDO PENDIENTE						\$ (1,466,413,001.10)	

Fuente: Concesión Alto Magdalena S.A.S., 2021

A Los valores se han aumentado, debido a que se ha realizado el levantamiento de la información y ya hay varios avalúos aprobadas para identificar el valor real de las compensaciones económicas a aplicar. Sin embargo, cada mes estos valores tienden a varias de acuerdo con la información levantada en campo.

A continuación, se presenta el Informe ejecutivo “Matriz – Plan de Compensaciones socioeconómicas” del mes de junio 2021. El cual esta con los valores actualizados a 2021, excepción de los pagos realizados en años anteriores continuación.

Tabla 93 Matriz de Compensaciones Socio-Economicas

 Agencia Nacional de Infraestructura		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN					CÓDIGO	GCSP-F-203	
		PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE					VERSIÓN	001
		FORMATO	MATRIZ - PLAN DE COMPENSACIONES SOCIOECONÓMICAS - INFORME EJECUTIVO					FECHA	30/09/2015
Proyecto									
CONCESION ALTO MAGDALENA S.A.S									
Fecha									
PERIODO JUNIO 2021									
SECTOR	FACTOR CANCELADO (VALORES)								
	FARV (\$)	FAMOR (\$)	FAMOV (\$)	FARR (\$) ARRENDADORES	FARME (\$)	TOTAL			
UF 1	\$ -	\$ -	\$ 1,378,910.00	\$ -	\$ 4,136,730.00	\$ 5,515,640.00			
UF 2	\$ 1,516,050,923.20	\$ 58,191,954.00	\$ 47,062,113.00	\$ 1,650,000.00	\$ 151,732,602.00	\$ 1,774,687,592.20			
UF 3	\$ 182,249,756.90	\$ 95,115,248.00	\$ 36,673,778.00	\$ 17,812,242.00	\$ 84,507,720.00	\$ 416,358,744.90			
UF 4.1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
UF 4.2	\$ 24,464,271.00	\$ 11,718,630.00	\$ 3,909,559.00	\$ 900,000.00	\$ 16,264,454.00	\$ 57,256,914.00			
UF 5.1	\$ 551,930,797.00	\$ 98,778,018.00	\$ 53,212,236.00	\$ 6,480,000.00	\$ 43,667,232.00	\$ 754,068,283.00			
UF 5.2	\$ 412,178,239.00	\$ 61,264,023.00	\$ 31,484,971.00	\$ 20,800,245.00	\$ 107,462,598.00	\$ 633,190,076.00			
UF 5.3	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -			
UF 5.4	\$ -	\$ 4,687,452.00	\$ 781,242.00		\$ 4,687,452.00	\$ 10,156,146.00			
TOTAL	\$ 2,686,873,987.10	\$ 329,755,325.00	\$ 174,502,809.00	\$ 47,642,487.00	\$ 412,458,788.00	\$ 3,651,233,396.10			
SECTOR	FACTOR PENDIENTE POR CANCELAR (VALORES)								
	FARV (\$)	FAMOR (\$)	FAMOV (\$)	FARR (\$)	FARME (\$)	TOTAL			
UF 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
UF 2	\$ 35,190,481.00	\$ (184,338)	\$ 1,724,883	\$ -	\$ 15,616,116	\$ 52,347,142.00			
UF 3	\$ -	\$ (92,171)	\$ 797,393	\$ -	\$ -	\$ 705,222.00			
UF 4.1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
UF 4.2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
UF 5.1	\$ 826,758,660.00	\$ -	\$ 12,688,641	\$ -	\$ -	\$ 839,447,301.00			
UF 5.2	\$ 4,146,590.00	\$ -	\$ 877,803	\$ 30,000	\$ -	\$ 5,054,393.00			
UF 5.3	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
UF 5.4	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
TOTAL	\$ 866,095,731.00	-\$ 276,509.00	\$ 16,088,720.00	\$ 30,000.00	\$ 15,616,116.00	\$ 897,554,058.00			
SECTOR	MEJORATARIOS		PROPIETARIOS		MORADORES				
	Cantidad	\$FARME	Cantidad	\$FARME	Cantidad	\$FARME			
UF 1	1	\$ 4,136,730.00	0	\$ -	0	\$ -			
UF 2	17	\$ 107,824,314.00	4	\$ 19,031,052.00	5	\$ 24,877,236.00			
UF 3	3	\$ 14,343,600.00	2	\$ 9,374,904.00	12	\$ 60,789,216.00			
UF 4.1	0		0	\$ -	0	\$ -			
UF 4.2	0	\$ -	2	\$ 11,838,152.00	1	\$ 4,426,302.00			
UF 5.1	1	\$ 4,968,696.00	3	\$ 14,082,450.00	5	\$ 24,616,086.00			
UF 5.2	5	\$ 28,115,286.00	0	\$ -	12	\$ 79,347,312.00			
UF 5.3	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -			
UF 5.4	0	\$ -	0	\$ -	1	\$ 4,687,452.00			
TOTAL	27	\$ 159,388,626.00	11	\$ 54,326,558.00	36	\$ 198,743,604.00			
Nota 1: Valores actualizados de acuerdo al Plan de Compensaciones Socioeconómicas, presentado a Interventoría con corte a 31 de enero de 2021									
Nota 2: Los valores de la UF 3 se modificaron, debido a que se actualizo con valores 2021, la compensación del predio ALMA-3-0064, razón por la cual los valores cambiaron y se realizara la actualización en la próxima presentación del Plan de Compensaciones Socioeconómicas.									

Fuente: Concesión Alto Magdalena S.A.S., 2021

2.3.21 ACTAS DE VECINDAD

No se realizaron actas de vecindad iniciales en el mes de junio de la presente anualidad.

Tabla 94 Relación actas de vecindad junio 2021

UF	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	TIPO	CANTIDAD	OBSERVACIONES
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

Fuente: Concesión Alto Magdalena S.A.S., 2021

No se realizaron actas de vecindad de seguimiento en el mes de junio de la presente anualidad.

Tabla 95 Atención de actas de vecindad en junio 2021

UF	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	PQRS	ALMA
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

Fuente: Concesión Alto Magdalena S.A.S., 2021

2.4 AVANCE GESTIÓN PREDIAL

De acuerdo con lo adelantado en la identificación predial por parte del Concesionario, la cual con base en fuentes secundarias, así como en los reconocimientos de campo realizados y considerando el ancho de la línea de compra según lo estipulado en los otros 7 y 8, en donde se rectificaron los sectores que componen las unidades funcionales, en pasos urbanos y centros poblados, de igual forma teniendo en cuenta los ajustes necesarios en la franja de utilidad pública, se encuentra que la cantidad de predios necesarios para dar cumplimiento a la gestión predial del proyecto son 535 predios distribuidos por cada una de las respectivas unidades funcionales de la siguiente manera:

Tabla 96 Inventario de predios por unidad funcional

UNIDAD FUNCIONAL	SECTOR	TOTAL
1	N/A	18
2	N/A	144
3	N/A	135
4	4.1	6
	4.2	70
5	5.1	86
	5.2	44
	5.3	2

UNIDAD FUNCIONAL	SECTOR	TOTAL
	5.4	30
TOTAL		535

Para el final del mes de junio de 2021, se tienen 535 predios afectados por el proyecto.

A continuación, se presenta el estado de avance de la gestión predial de la Concesión respecto de cada uno de los entregables relacionados con las diferentes etapas del proceso de adquisición.

2.4.1 AVANCE INSUMOS PEDIALES

Al 30 del mes de junio de 2021, el estado de avance en cuanto a insumos prediales (fichas prediales y estudios de títulos) por unidad funcional es el siguiente:

UNIDAD FUNCIONAL	INSUMOS APROBADOS	INSUMOS EN INTERVENTORIA	INSUMOS EN AJUSTE	INSUMOS EN GESTIÓN	TOTAL GENERAL
UF 1	18	0	0	0	18
UF 2	144	0	0	0	144
UF 3	135	0	0	0	135
UF 4 (4.1)	6	0	0	0	6
UF 4 (4.2)	70	0	0	0	70
UF 5 (5.1)	81	0	0	5	86
UF 5 (5.2)	44	0	0	0	44
UF 5 (5.3)	0	0	0	2	2
UF 5 (5.4)	30	0	0	0	30
TOTAL	528	0	0	7	535

Tabla 97 Avance insumos prediales

Se incluyen los 4 predios de la unidad funcional 1 que ya son propiedad de la ANI.

Análisis en porcentaje de avance:

Para la UF 1 los insumos prediales se encuentran aprobados al 100%.

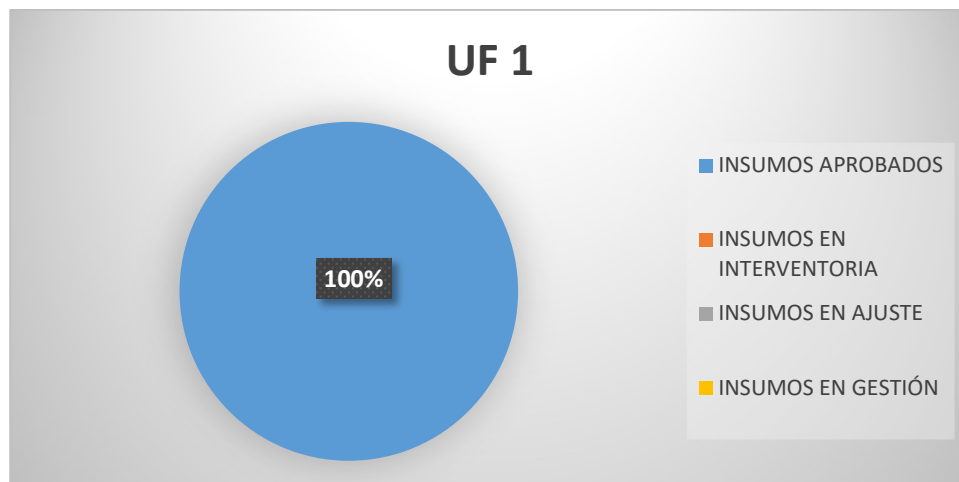


Ilustración 5 Avance de gestión UF 1

Para la unidad funcional 2 se presenta un avance de insumos aprobados del 100%.

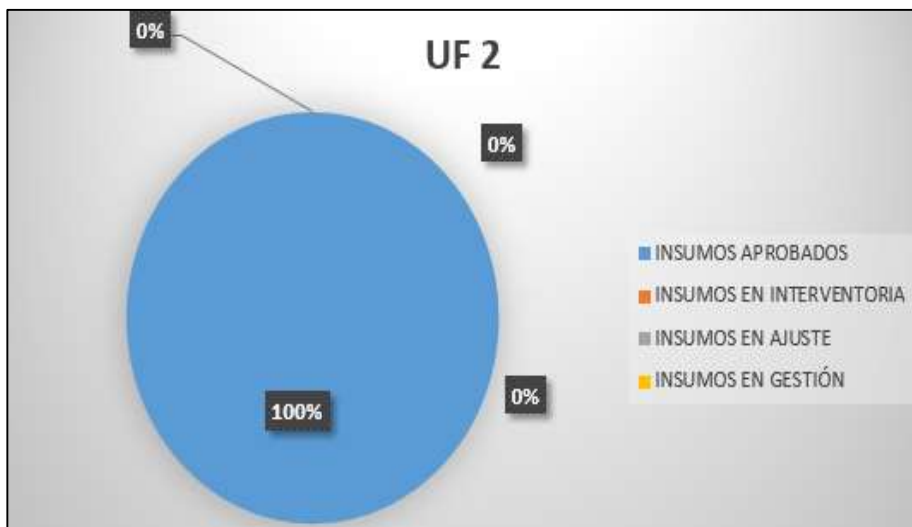


Ilustración 6 Avance de gestión UF 2

Para la unidad funcional 3 se presenta un avance de insumos aprobados del 100%

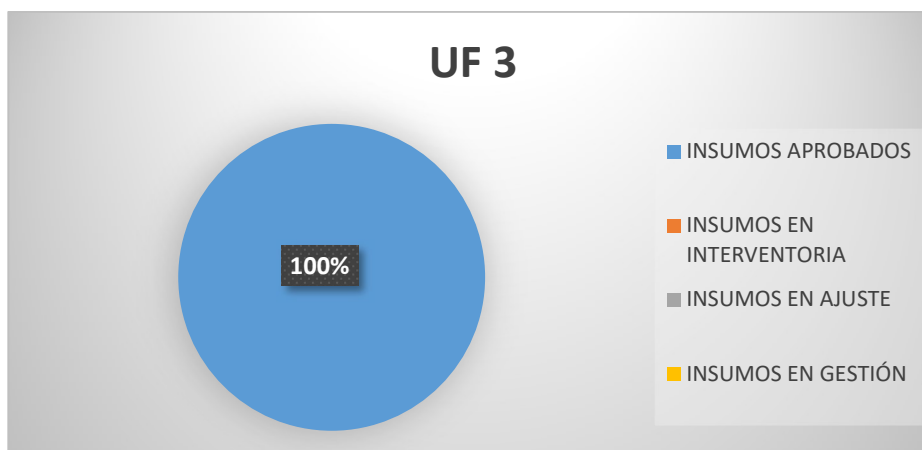


Ilustración 7 Avance de gestión UF 3

La unidad funcional 4, sector 4.1 presenta un avance del 100 % en insumos aprobados, se mantiene constante.

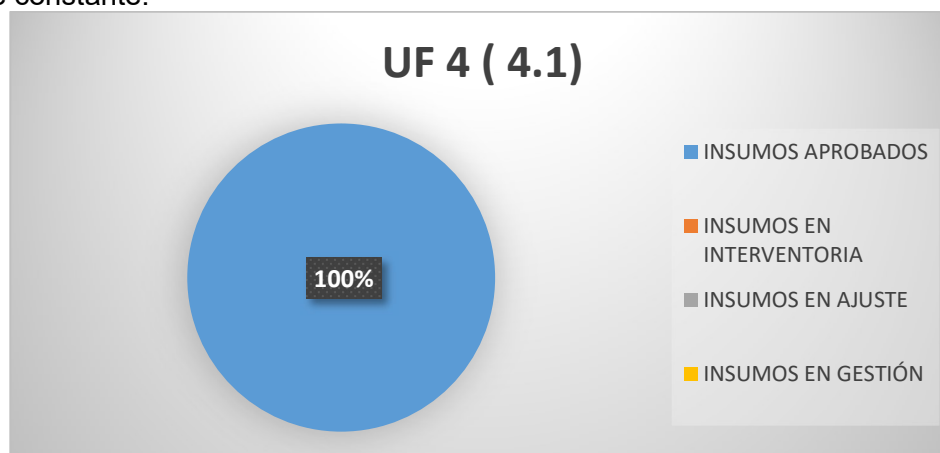


Ilustración 8 Avance de gestión UF 4.1

La unidad funcional 4, sector 4.2 sector presenta un avance del 100 % en insumos aprobados.

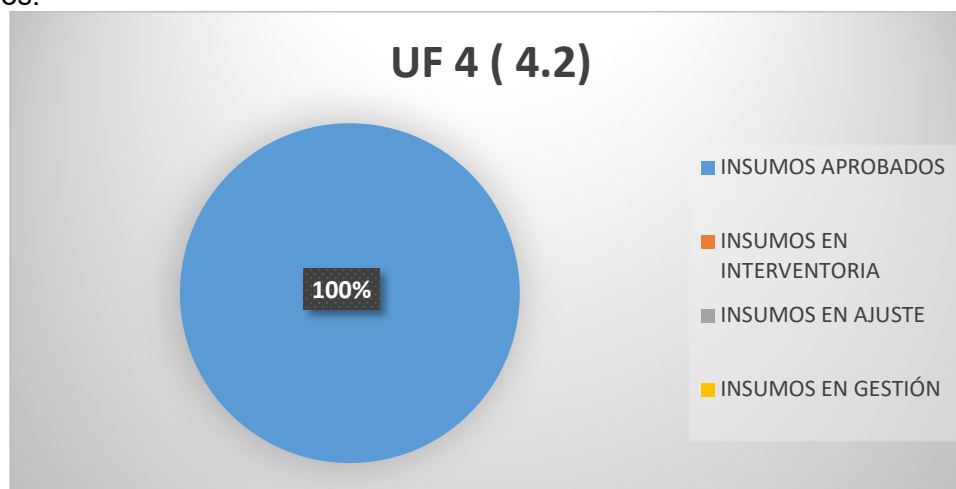


Ilustración 9 Avance de gestión UF 4.2

La unidad funcional 5, sector 5.1 presenta un avance del 94% en insumos aprobados y 6% sin insumos.

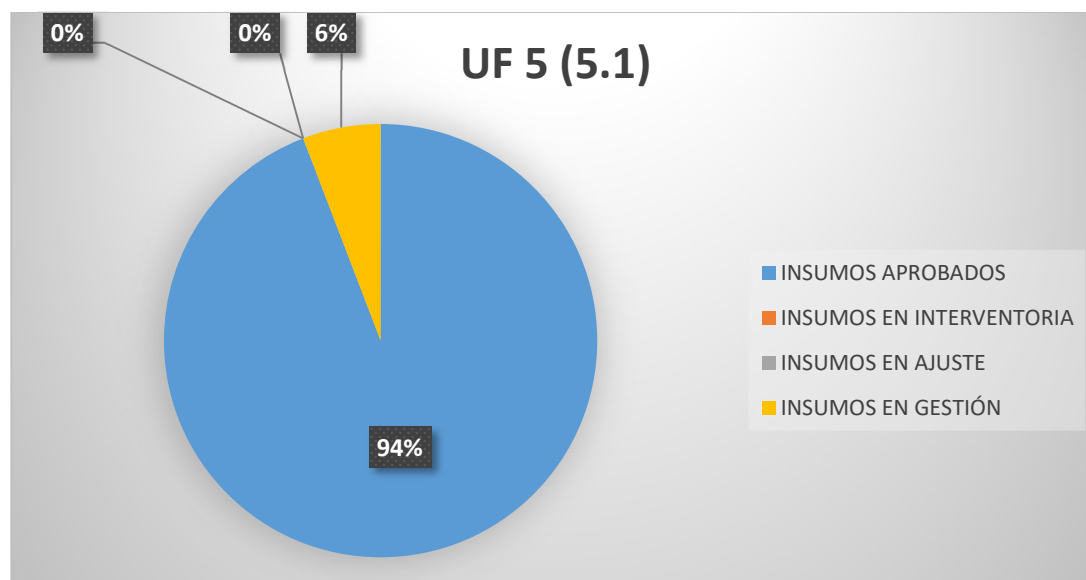


Ilustración 10 Avance de gestión UF 5.1

Resumen de aquellos predios faltantes por aprobación de insumos dentro de la Unidad Funcional 5.1:

PREDIO	ESTADO	OBSERVACION
ALMA-5-0253	INSUMO EN GESTIÓN	TITULADO PENDIENTE DE ACLARACION COORDENADAS PARA ELABORARA INSUMOS
ALMA-5-0254	INSUMO EN GESTIÓN	TITULADO PENDIENTE DE ACLARACION COORDENADAS PARA ELABORARA INSUMOS
ALMA-5-0258	INSUMO EN GESTIÓN	TITULADO PENDIENTE DE ACLARACION COORDENADAS PARA ELABORARA INSUMOS
ALMA-5-0259	INSUMO EN GESTIÓN	TITULADO PENDIENTE DE ACLARACION COORDENADAS PARA ELABORARA INSUMOS
ALMA-5-0266	INSUMO EN GESTIÓN	SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE TITULACION POR PARTE DEL MUNICIPIO DE GUADUAS

Nota: Se informa que la administración debido al fallo de tutela entrego la información de la titulación de los predios ALMA-5-0254, ALMA-5-0253, ALMA-5-0258 y ALMA-5-0259, las resoluciones de titulación tienen diferencias en las coordenadas de titulación con las coordenadas del área requerida y se solicitó la corrección de las resoluciones para que el concesionario pueda elaborar los respectivos insumos.

La unidad funcional 5, sector 5.2 presenta un avance de aprobación de insumos del 100%.

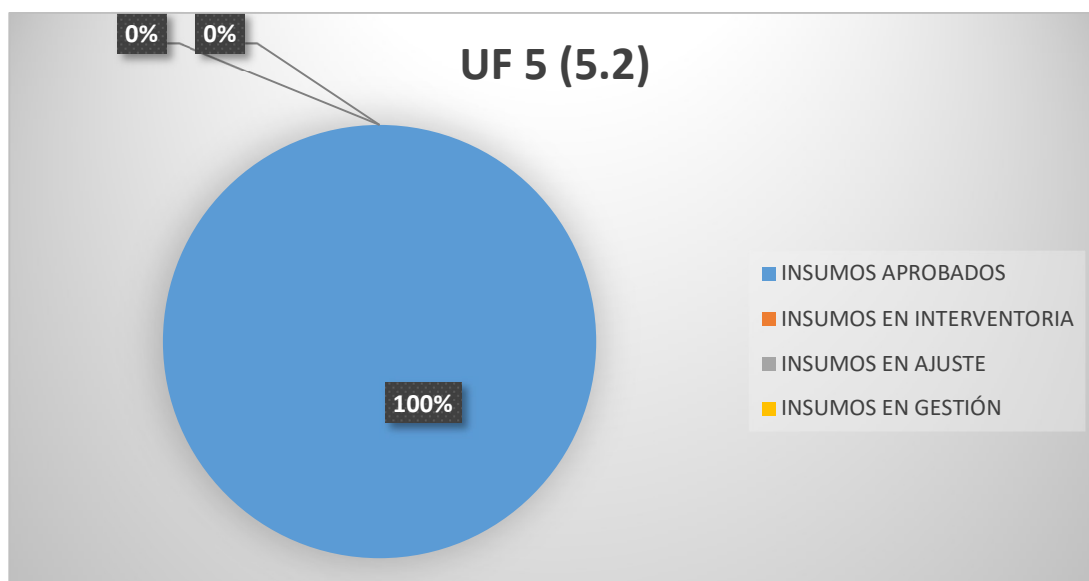


Ilustración 11 Avance de gestión UF 5.2

La unidad funcional 5, sector 5.3 presenta una característica particular, estos predios los está gestionando INVIAS, actualmente se encuentran procesos adelantados por la entidad en el tema de adquisición, sin embargo, se sigue a la espera de la liberación efectiva.

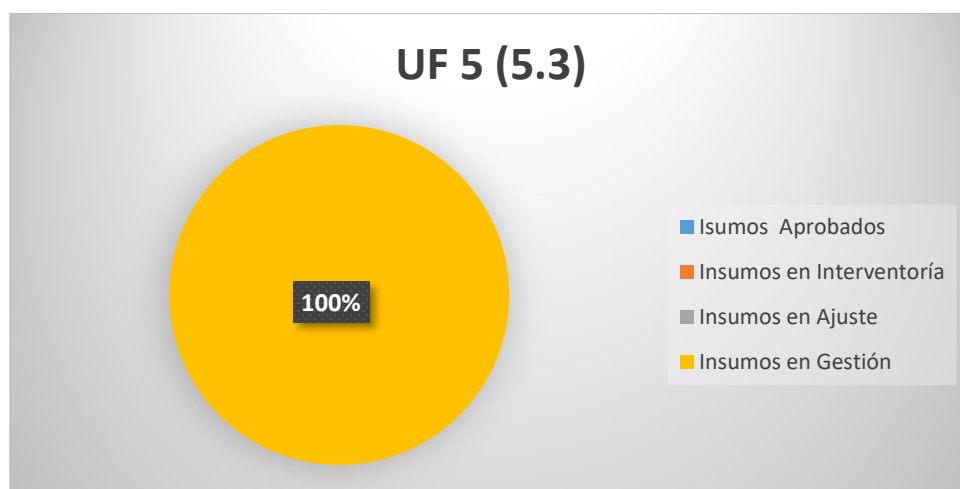


Ilustración 12 Avance de gestión UF 5.3

Resumen de aquellos predios faltantes por aprobación de insumos dentro de la Unidad Funcional 5.3:

PREDIO	ESTADO	OBSERVACION
ALMA-5-0114	INSUMOS EN GESTION	PREDIOS PERTENECIENTES A LA GLORIETA OCCIDENTAL, A PESAR DE ESTAR DENTRO DEL REQUERIMIENTO PARA EL PROYECTO LA GESTION PREDIAL ESTA A CARGO DEL INVIAS
ALMA-5-0115	INSUMOS EN GESTION	PREDIOS PERTENECIENTES A LA GLORIETA OCCIDENTAL, A PESAR DE ESTAR DENTRO DEL REQUERIMIENTO PARA EL PROYECTO LA GESTION PREDIAL ESTA A CARGO DEL INVIAS

La unidad funcional 5, sector 5.4 presenta un avance de aprobación de insumos del 100%.

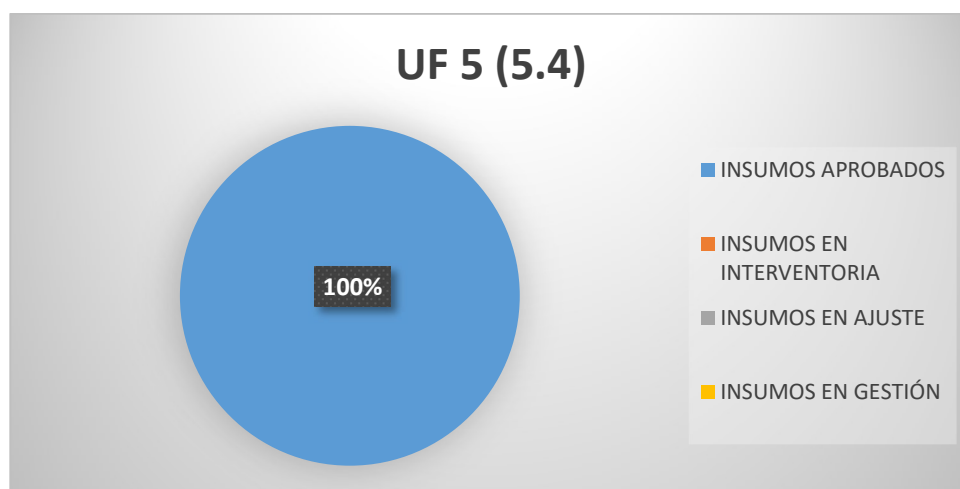


Ilustración 13 Avance de gestión UF 5.4

Tabla 98 Longitud y área requerida de las fichas técnicas prediales aprobadas.

UNIDAD FUNCIONAL	ÁREA TERR. REQ. (m2)	UNIDAD FUNCIONAL (Sector)	LONGITUD EFECTIVA (Km)
UF 1	555 329	UF 1	6.80
UF 2	588 196	UF 2	36.00
UF 3	697 282	UF 3	48.90
UF 4 (4.1)	71 143	UF 4 (4.1)	1.10
UF 4 (4.2)	677 812	UF 4 (4.2)	42.50
UF 5 (5.1)	65 812	UF 5 (5.1)	3.30
UF 5 (5.2)	58 910	UF 5 (5.2)	3.20
UF 5 (5.3)	5 445	UF 5 (5.3)	0.60

UNIDAD FUNCIONAL	ÁREA TERR. REQ. (m2)	UNIDAD FUNCIONAL (Sector)	LONGITUD EFECTIVA (Km)
UF 5 (5.4)	834 946	UF 5 (5.4)	15.50
SUBTOTAL	3 554 875	TOTAL	157.90

El Concesionario se encuentra realizando las labores que se encuentran a su cargo para que el municipio de Guaduas realice la respectiva aclaración y titulación de los predios pendientes de insumos en la UF5 sector 5.1, que a la fecha se encuentran pendientes de elaboración.

2.4.2 AVANCE AVALÚOS COMERCIALES CORPORATIVOS

Al 30 de junio de 2021, el estado de avance en cuanto a avalúos por unidad funcional es el siguiente:

Tabla 99 Estado de avance avalúos Comerciales Corporativos

Unidad Funcional	Avaluos Aprobados	Avalúos entregados a interventoría	Avalúo en ajuste	Avalúo en gestion	Sin insumos aprobados	Total
UF 1	18	0	0	0	0	18
UF 2	144	0	0	0	0	144
UF 3	135	0	0	0	0	135
UF 4 (4.1)	6	0	0	0	0	6
UF 4 (4.2)	70	0	0	0	0	70
UF 5 (5.1)	81	0	0	0	5	86
UF 5 (5.2)	44	0	0	0	0	44
UF 5 (5.3)	0	0	0	0	2	2
UF 5 (5.4)	29	0	0	1	0	30
Subtotal	527	0	0	1	7	535

Se incluyen los 4 predios de la unidad funcional 1 que son propiedad de la ANI.

A continuación, se representa en imágenes el estado de los avalúos en cada una de las unidades funcionales:

Para la unidad funcional 1 tenemos un avance del 100% en avalúos aprobados (incluyendo los 4 predios que pertenecen a la ANI).

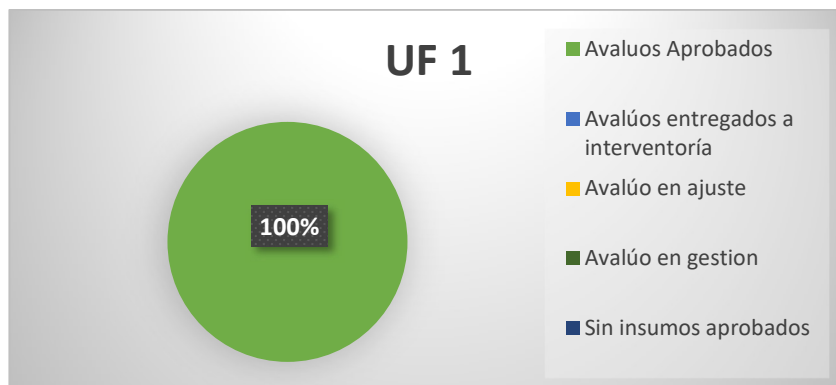


Ilustración 14 Avance de avalúos UF 1

Para la UF 2 el avance de aprobación de avalúos es de 100% aprobados

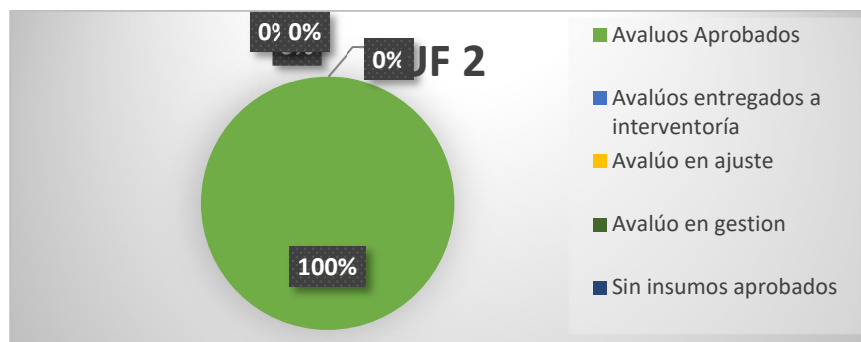


Ilustración 15 Avance de avalúos UF 2

Para la UF 3 el avance de avalúos aprobados es del 100%

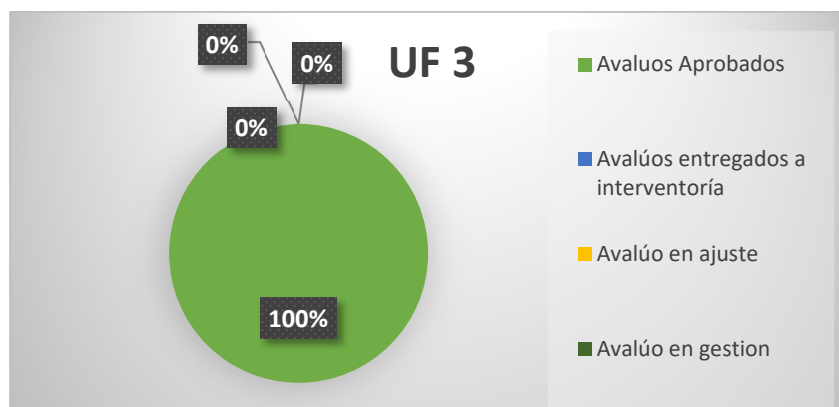


Ilustración 16 Avance de avalúos UF 3

Para la UF 4, sector 4.1 el avance de avalúos aprobados es del 100%.

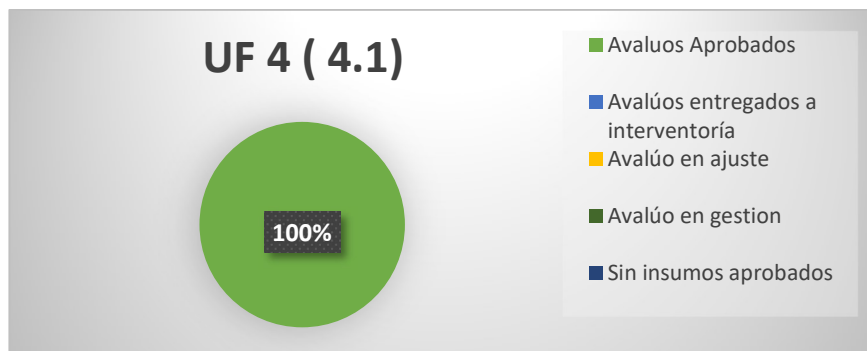


Ilustración 17 Avance de avalúos UF 4, sector 4.1

Para la UF 4, sector 4.2 el avance en los avalúos aprobados es del 100%

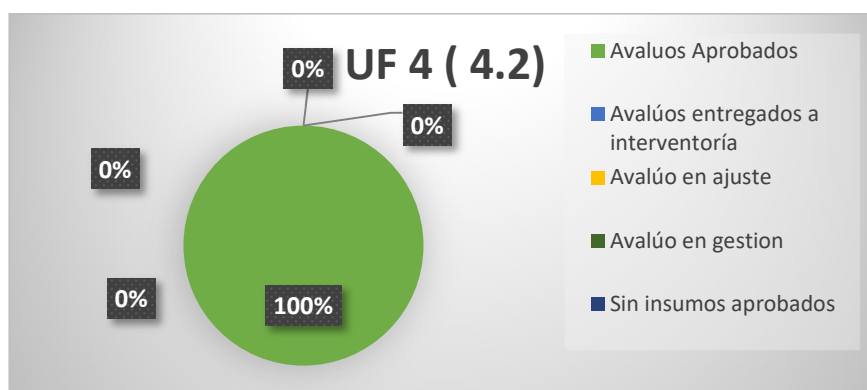


Ilustración 18 Avance de avalúos UF 4, sector 4.2

Para la UF 5, sector 5.1 el avance de aprobación de avalúos es de 94% aprobados 6% de estos insumos aun no cuentan como aprobados.

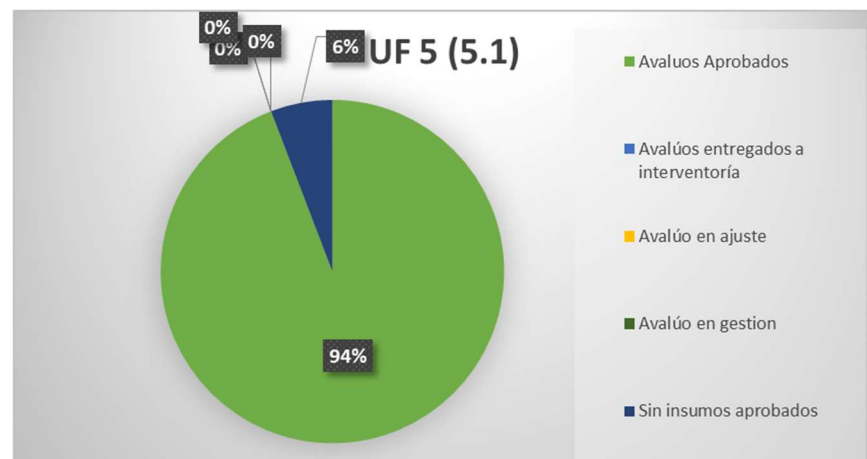


Ilustración 19 Avance de avalúos UF 5.1

Para la UF 5, sector 5.2 el avance de aprobación de avalúos es del 100%.

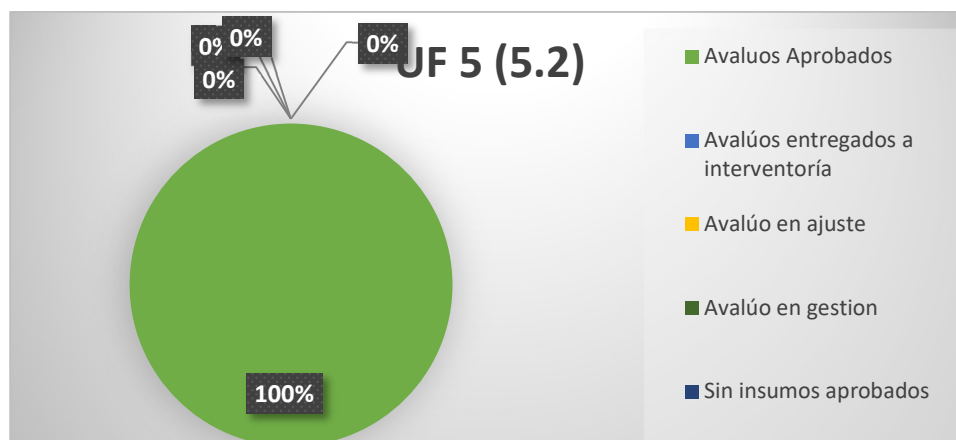


Ilustración 20 Avance de avalúos UF 5.2

Respecto a los avalúos correspondientes a los predios ALMA-5-0012 y ALMA-5-0063, propiedad del INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS), se informa que estos no requieren de algún avalúo comercial aprobado. Razón por la cual se vienen realizando las respectivas gestiones en conjunto con la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, para dar titularidad a e estos inmuebles a favor de la ANI. Los soportes de esta gestión fueron entregados a interventoría en los anexos del informe ejecutivo de abril.

Para la UF 5, sector 5.3 el porcentaje de aprobación de avalúos es del 0% debido a que son predios a cargo de INVIAS.




Ilustración 21 Avance de avalúos UF 5.3

Para la UF 5, sector 5.4 el avance de aprobación aprobados es del 97%, un 3% se encuentra en gestión por parte del concesionario.

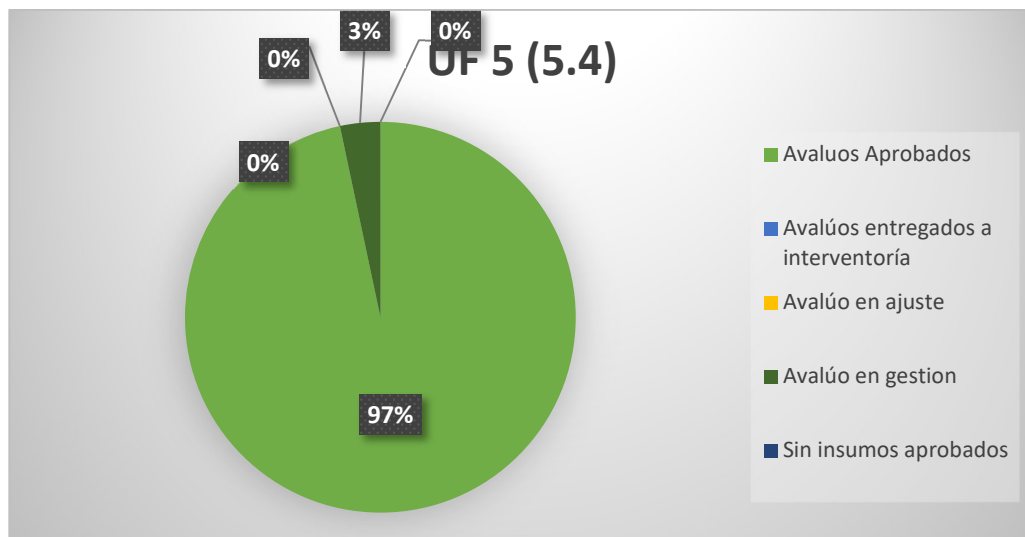


Ilustración 22 Avance de avalúos UF 5.4

Respecto al avalúo correspondiente al predio ALMA-5-0111-1, propiedad del INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS), se informa que este no requiere de algún avalúo comercial aprobado. Razón por la cual se vienen realizando las respectivas gestiones en conjunto con la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, para dar titularidad a este inmueble a favor de la ANI. Los soportes de esta gestión fueron entregados a interventoría dentro de los documentos anexos del informe ejecutivo de abril.

El predio ALMA-5-0105, a pesar de tener un avalúo aprobado, es necesario realizar uno nuevo en atención a la actualización que tuvo la ficha predial.

2.4.3 INFORME AVANCE DE GESTIÓN (EER) DEL PROYECTO

2.4.3.1 UNIDAD FUNCIONAL 1:

De acuerdo con el acta de declaratoria de evento eximente para la UF1 se día para el predio ALMA-1-0001 el cual se encuentra en el siguiente estado:

ALMA-1-0001

Nombre del propietario:

Sociedad PROYECTOS URBANÍSTICOS GUTIERREZ S.A.S ubicado en la Unidad Funcional 1 del Proyecto.

1. **Resolución de expropiación:** 152 de 25 de enero de 2019.
2. **Fecha de ejecutoria de la Resolución de expropiación:** 27 de marzo de 2019.
3. **Fecha de presentación de la demanda:** 2 de abril de 2019.
4. **Número de radicado (Juzgado):** 2019-0080.
5. **Juzgado:** Primer Civil del Circuito de Girardot.
6. **Fecha de admisión de la demanda:** 30 de mayo de 2019.

7. **Fecha de consignación del valor del avalúo al Juzgado:** 7 de junio de 2019.
8. **Auto fija fecha de entrega anticipada:** 12 de junio 2019.
9. **Entrega real y material del predio:** 27 de junio 2019, no se presentó oposición.
10. **Notificación de Demanda:** nos encontramos en trámite de notificación de la demanda.
11. **Designación de Curador:** pendiente contestación demanda por parte del curador

La demanda de expropiación del predio **ALMA-1-0001**, cursa en el Juzgado Primero Civil del Circuito de Girardot, mediante radicado 2019-0080 y a la fecha cuenta con entrega anticipada y notificación de una de las partes (PROYECTOS URBANISTICOS); y actualmente se está emplazando a CONDOMINIO CAMPESTRE CAMPOSOL.; tan pronto se culminen las labores de emplazamiento y no acudan los demandados al Despacho judicial se les nombrará un curador que los represente, conforme lo prevé el estatuto procesal.

Al 30 de junio de 2021, se dictó sentencia a favor de la ANI el 17 de junio de 2021, en elaboración de los oficios para inscripción de la sentencia en la ORIP de Girardot.

2.4.3.2 UNIDAD FUNCIONAL 3

Mediante la comunicación ALMA-2020-0224, radicada el 29-01-2020, en la Agencia Nacional de Infraestructura, el concesionario notifico la existencia de un Evento eximente de responsabilidad, en atención la imposibilidad de adquirir los predios ALMA-3-0077, ALMA-3-146, propiedad de los Municipio de Beltrán y Municipio de San Juan de Rio Seco respectivamente, así como los predios Baldíos solicitados en adjudicación a la ANT, ALMA-3-0059, ALMA-3-0064 y ALMA-3-0114.

El acta de declaratoria del Evento Eximente de Responsabilidad fue firmada el día 16 de abril de 2020, para los predios que se encuentran en trámite de adjudicación ante la ANT, identificados con el ALMA-3-0059, ALMA-3-0064 y ALMA-3-0114.

Mediante la comunicación ALMA-2020-1559, en la cual se manifiesta la imposibilidad de realizar un cronograma para los predios que dieron origen al EER, en atención a que el trámite se encuentra en cabeza de terceros.

Dentro del trámite de adjudicación solicitado la Agencia Nacional de Tierras por la ANI, los expedientes cuenta hasta el momento con visita de inspección ocular realizada el día 30 de agosto de 2019.

Los predios ALMA-3-0059 cuenta con resolución de adjudicación por parte de la ANT, con la resolución No 7794 de 2020. Se encuentra pendiente el registro para obtener folio a nombre de la ANI.

Los predios ALMA-3-0064 cuenta con resolución de adjudicación por parte de la ANT, con la resolución No 7793 de 2020. Se encuentra pendiente el registro para obtener folio a nombre de la ANI.

Los predios ALMA-3-0114 cuenta con resolución de adjudicación por parte de la ANT, con la resolución No 22557 de 2020. Se encuentra pendiente el registro para obtener folio a nombre de la ANI.

2.4.3.3 UNIDAD FUNCIONAL 4

A continuación, se tiene la información de cada predio que compone la unidad funcional 4 con su respectivo avance:

Para la fecha de elaboración del presente informe se cuenta con 52 predios con Folio ANI, 2 en enajenación voluntaria y 22 predios en expropiación.

1) Folios ANI.

N	PREDIO	N	PREDIO	N	PREDIO
1	ALMA-4-0001	21	ALMA-4-0037	41	ALMA-4-0060
2	ALMA-4-0002	22	ALMA-4-0038	42	ALMA-4-0061
3	ALMA-4-0004	23	ALMA-4-0039	43	ALMA-4-0064
4	ALMA-4-0005	24	ALMA-4-0040	44	ALMA-4-0071
5	ALMA-4-0006	25	ALMA-4-0041	45	ALMA-4-0073
6	ALMA-4-0007	26	ALMA-4-0042	46	ALMA-4-0074
7	ALMA-4-0008	27	ALMA-4-0043	47	ALMA-4-0076
8	ALMA-4-0009	28	ALMA-4-0046	48	ALMA-4-0078
9	ALMA-4-0010	29	ALMA-4-0047	49	ALMA-4-0096
10	ALMA-4-0012	30	ALMA-4-0047-1	50	ALMA-4-0096-1
11	ALMA-4-0013	31	ALMA-4-0048	51	ALMA-4-0096-3
12	ALMA-4-0014	32	ALMA-4-0049	52	ALMA-4-0096-4
13	ALMA-4-0016	33	ALMA-4-0050		
14	ALMA-4-0017	34	ALMA-4-0051		
15	ALMA-4-0019	35	ALMA-4-0052		
16	ALMA-4-0024	36	ALMA-4-0054		
17	ALMA-4-0025	37	ALMA-4-0056		
18	ALMA-4-0026	38	ALMA-4-0058		
19	ALMA-4-0031	39	ALMA-4-0059		
20	ALMA-4-0036	40	ALMA-4-0059-1		

2) Enajenación Voluntaria:

No	PREDIO	OBSERVACION
1	ALMA-4-0044	Se tenía en cronograma para firma de escritura el 24 de octubre de 2018. Predio en negociación con la SAE. La oferta se encuentra aún en revisión por parte del comité de enajenación temprana de la SAE. Según correo remitido por la encargada del tema en dicha Entidad se reprogramo como fecha tentativa para el 12 de octubre de 2018. Se realizó reunión en la SAE el día 8 de octubre para conocer el estado de la negociación, pero la respuesta era que continuaban en espera de comité de enajenación temprana. La solicitud antes mencionada se reiteró el 19 de octubre de 2018 donde se informó el estado de la gestión para la escritura pública (lo anterior sin respuesta). Según comentó la SAE registro devuelve las escrituras debido a que no existe un código registral para registrar las compraventas- están tramitando un código registral para eso. Se remite oficio a la SAE el día 22 de enero de 2019 iniciando el proceso de expropiación Se radica en interventoría el 5 de abril de 2019. Se presentó nuevamente a Interventoría el 24 de abril de 2019 luego de aclaraciones tenidas en cuenta en reunión de la ANI del 12 de abril de 2019. Razón por la cual el día 10 de mayo de 2018, se radica ante la la Agencia Nacional de Infraestructura, la carpeta para dar inicio a los trámites pertinentes para la expropiación del inmueble de acuerdo con la establecido conforme lo prevé el artículo 58 de la Constitución Política y el artículo 399 del Código General del Proceso, en concordancia con lo dispuesto en la Ley 9 de 1989, Ley 388 de 1997, Ley 1682 de 2013 y Ley 1742 del 2014. Posteriormente el día 10 de junio de 2019, la Súper Intendencia de Notariado y Registro expide la resolución N° 7159, con la cual se crea y adopta un código de especificaciones para un acto objeto de registro ante las Oficinas la Instrumentos Públicos, el cual permite la Inscripción del acto administrativo que trasfiere el dominio expedido por La Sociedad de Activos Especiales S.A.S- S.A.E. En vista de lo anterior la Agencia Nacional de Infraestructura, mediante la comunicación ANI-2019606024301, con radicado interno ALMA-R-

	20191835 del día 30 de julio de 2019, hace la devolución de la carpeta y solicita se inicie los trámites pertinentes con La Sociedad de Activos Especiales S.A.S- S.A.E. Atendiendo la solicitud la Concesión Alto Magdalena S.A.S., se solicita mesa de trabajo con la Sociedad de Activos Especiales S.A.S- S.A.E., a fin de retomar el trámite que permita adquirir las áreas de terreno requeridas para el proyecto, llevándose a cabo el día 26 de julio de 2019. El día 30 de julio de 2019, mediante correo electrónico la Sociedad de Activos Especiales S.A.S- S.A.E., remite seis predios que se encuentran bajo su administración y de los cuales se puede retomar el respectivo trámite, dentro del cual se encuentra el predio a nombre del señor JORGE ELIECER BUSTOS ORDOÑEZ CC. 19.489.907, identificado con número de Matrícula Inmobiliaria 162-20720, así mismo, solicita se informe el estado actual de los mismos. El día 1 de agosto de 2019, se remite el estado actual de los predios y se informa que solo tres predios son actos para reanudar el trámite de enajenación temprana con dicha entidad. El día 4 de septiembre mediante comunicación telefónica la Sociedad de Activos Especiales S.A.S- S.A.E., solicita el shape del área requerida y remanente del predio ALMA-4-0044, el cual es remitido ese mismo día mediante correo electrónico y a su vez la Sociedad de Activos Especiales S.A.S- S.A.E., remite la información al área técnica de ellos para iniciar con dicho predio el trámite de enajenación temprana y el cual concluye con la imposibilidad de establecer un término para dicho trámite. El 13 de marzo de 2020, mediante comunicación telefónica la SEA, solicita el estado de cuenta predial el cual remite mediante correo electrónico el mismo día. El día 16 de marzo de 2020, remiten mediante correo electrónico modelo de minuta de escritura pública para que se elabore la respectiva minuta por el concesionario y se envíe para revisión de la SAE. El día 18 de marzo se remitió la minuta elaborada por el concesionario para revisión y complementación de la SAE. El día 30 de marzo de 2020, solicitan mediante correo electrónico el envío de la escritura # 179 del 22 de marzo de 2009, la cual se remite inmediatamente. La minuta de la escritura se encuentra aprobado por ambas partes está pendiente el pago de los impuestos para solicitar paz y salvo y que en el folio se inscriba las respectivas resoluciones para continuar con el trámite de escrituración.
--	--

		Minuta aprobada por las partes en espera de folio de matrícula actualizado con la inscripción de la resolución de autorización al frisco.
2	ALMA-4-0062	El día 31 de agosto no se radicaron los insumos debido a que como se le comunico a la interventoría, se había solicitado al registrador de guaduas que se abriera folio de matrícula al predio 4-0062 y que el área del 4-0063 quedara sobre el folio de mayor extensión. En vista de la negativa del registrador de abrir nuevo folio (según correo electrónico enviado) se presentaron los insumos a la interventoría del predio 4-0062 englobando el área del 4-0063 el 31 de octubre de 2018. Fue devuelto el expediente por Interventoría el 26 de noviembre y se radicó de nuevo el 28 de diciembre de 2018. Expediente revisado en mesa de trabajo del martes 15 de enero de 2019 y se radicó el 1 de febrero de 2019. Avalúo se presentó el 26 de marzo de 2019. No obstante debido a los cambios de englobe con el otro predio se está nuevamente elaborando el avalúo. Se presenta el avalúo por primera vez el 29 de septiembre de 2019 a la interventoría, el cual fue devuelto el día 26 de septiembre de 2019. Se corrigen las observaciones y el día 28 de octubre se radica nuevamente para revisión a la interventoría, la cual lo devuelve el día 8 de noviembre con observaciones que se deben corregir. El día 26 de diciembre se radica el avalúo para revisión de la interventoría, el cual fue devuelto el día 14 de enero de 2020. Posteriormente se radica el día 26 de febrero de 2020 con para revisión y aprobación fue devuelto el día 11 de marzo de 2020. El avalúo se encuentra aprobado y está en trámite de notificación de la oferta. Se encuentra en términos de notificación por aviso, una vez se cumpla el término se radicara en la ORIP para inscripción de la Oferta de Compra. Se radica en la ORIP de Guaduas el día 24 de septiembre para inscripción de la oferta se compra.

	El día 5 de octubre quedo inscripta la oferta de compra en proceso para presentar a la interventoría. Se encuentra en trámite de notificación del alcance de la oferta debido a que en la inicial no se incluyó el área remanente. Se encuentra en trámite de inscripción del alcance de la oferta ante la ORIP de Guaduas. Se encuentra la carpeta en proceso de actualización de estudio de títulos de acuerdo a las observaciones de la interventoría. Se radico en la interventoría para aprobación de la actualización del estudio de títulos.
--	--

3) Predios en expropiación:

ALMA-4-0003	EXPROPIACION	CON ENTREGA ANTICIPADA
ALMA-4-0011	EXPROPIACION	CON SENTENCIA
ALMA-4-0015	EXPROPIACION	CON ENTREGA ANTICIPADA
ALMA-4-0018	EXPROPIACION	CON FECHA PARA ENTREGA
ALMA-4-0020	EXPROPIACION	DEMANDA ADMITIDA
ALMA-4-0021	EXPROPIACION	CON SENTENCIA
ALMA-4-0022	EXPROPIACION	CON FECHA PARA ENTREGA
ALMA-4-0023	EXPROPIACION	CON ENTREGA ANTICIPADA
ALMA-4-0027	EXPROPIACION	CON ENTREGA ANTICIPADA
ALMA-4-0030	EXPROPIACION	CON ENTREGA ANTICIPADA
ALMA-4-0034	EXPROPIACION	CON ENTREGA ANTICIPADA
ALMA-4-0053	EXPROPIACION	CON ENTREGA ANTICIPADA

ALMA-4-0061	EXPROPIACION	CON SENTENCIA
ALMA-4-0063-1	EXPROPIACION	CON SENTENCIA
ALMA-4-0067	EXPROPIACION	CON SENTENCIA
ALMA-4-0072	EXPROPIACION	CON ENTREGA ANTICIPADA
ALMA-4-0075	EXPROPIACION	CON ENTREGA ANTICIPADA
ALMA-4-0084	EXPROPIACION	CON ENTREGA ANTICIPADA
ALMA-4-0096-2	EXPROPIACION	CON ENTREGA ANTICIPADA
ALMA-4-0028	EXPROPIACION	DEMANDA ADMITIDA
ALMA-4-0032	EXPROPIACION	DEMANDA ADMITIDA
ALMA-4-0057	EXPROPIACION	DEMANDA ADMITIDA
ALMA-4-0035	EXPROPIACION	DEMANADA PRESENTADA

2.4.4 PREDIOS EN PROCESO DE ADQUISICIÓN

Para efectos del presente informe, se entiende por predios en proceso de adquisición, aquellos predios que por lo menos ya cuentan con oferta notificada. A continuación, se muestra el avance en cada una de las etapas del proceso de adquisición.

Tabla 100 Detalle de avance proceso de adquisición

Unidad funcional	Pedio con oferta notificada	Pedio con oferta inscrita	Predios con promesa de compraventa	Predios Escriturados	Predios ANI
UF 1	18	18	17	17	17
UF 2	144	143	95	94	87
UF 3	134	134	115	111	95
UF 4 (4.1)	6	6	5	5	5
UF 4 (4.2)	70	70	53	51	47
UF 5 (5.1)	80	80	73	73	70
UF 5 (5.2)	44	43	37	37	36
UF 5 (5.3)	0	0	0	0	0
UF 5 (5.4)	29	29	19	19	19
Subtotal	525	523	414	407	376

Se incluyen los 4 predios de la unidad funcional 1 que ya son propiedad de la ANI, se presentan predios que pasaron directamente a escrituración y que presentan sentencia de expropiación.

2.4.5 PREDIOS DISPONIBLES CON PERMISOS DE INTERVENCIÓN VOLUNTARIA Y ADQUISICIÓN PREDIAL.

Con el objetivo de obtener la disponibilidad de las áreas requeridas para alcanzar la disponibilidad del 40%, El Concesionario determinó la estrategia de gestionar la consecución de permisos de intervención voluntaria; sin embargo, debido al éxito de la estrategia y ante la posibilidad de establecer contacto con los propietarios en el desarrollo del proceso de identificación y adquisición predial, se determinó que en la medida de lo posible se suscribirían los permisos de intervención voluntaria pertinentes en los casos en los cuales los propietarios estuvieran dispuestos a suscribirlos.

A la fecha de corte de este informe se tienen los siguientes permisos de intervención y promesas suscritas en cada una de las unidades funcionales:

Tabla 101 Permisos de intervención y disponibilidad (adquisición) por unidad funcional

Unidad funcional	predios requeridos	Disponibilidad
1.1	18	18
2.1	144	138
3.1	135	128
4.1	6	6
4.2	70	70
5.1	86	83
5.2	44	44
5.3	2	2
5.4	30	27
Total	535	516

Se incluyen los 4 predios de la unidad funcional 1 que ya son propiedad de la ANI.

Se incluyen los 2 predios que pertenecen a la unidad funcional 5 subsector 5.3, estos predios presentan permiso por parte de INVIAS para intervención y se tiene soporte cargado en Drive.

Las cifras aquí indicadas corresponden únicamente a permisos de intervención suscritos e incluyen aquellos inmuebles disponibles mediante la suscripción de promesas de compraventa y/o escrituras y entregas anticipadas

2.4.6 DISPONIBILIDAD PARA CONSTRUCCIÓN

Al 30 de Junio de 2021, fecha de corte para elaboración de este informe, se cuenta con una disponibilidad del 100% de los predios requeridos para la construcción divididos entre permisos de intervención, predios con escritura, predios con promesa suscrita escritura pública y/o entrega anticipada, quedando solo 19 predios para completar las disponibilidad en las fajas de exclusión.

2.4.7 PREDIOS EN EXPROPIACIÓN JUDICIAL O ADMINISTRATIVA.

A la fecha de corte de este informe se reportan 118 predios con avance en tema de expropiación indicando el estado de la expropiación en cada uno de ellos, vale aclarar que en la matriz de expropiaciones procesos activos solo son 112 ya 6 predios se encuentran adquiridos.

Tabla 102 Avance predios expropiables y/o predios problema

DATOS GENERALES DEL INMUEBLE			OBSERVACIONES JUNIO DE 2021	EN TRAMITE DE APELACIÓN DE SENTENCIA
NO.	NO. FICHA PREDIAL	NOMBRE PROPIETARIO		
1	ALMA-1-0001	PROYECTOS URBANISTICOS GUTIERREZ SAS	17-06-21- SE DICTÓ SENTENCIA EN FAVOR DE LA ANI // 21-05-21 AL DESPACHO PARA FIJAR FECHA INTERROGATORIO Y SENTENCIA // 21-04-21- AUTO CORRE TRASLADO AVALÚO // 23-02-21- AUTO CORRIGE ACTUACIÓN CURADORA // 21-01-21 SE SOLICITÓ AL JUZGADO ADELANTAR EL INTERROGATORIO A PERITOS.	
2	ALMA-2-0001	MUNICIPIO DE GIRARDOT	10-06-21 SE ESTÁ TRAMITANDO EL PAGO // 28-05-21- AUTO ADMITE DEMANDA // 04-05-21 SE RADICÓ DEMANDA //RESOLUCIÓN NOTIFICADA, PENDINETE EJECUTORIA.	
3	ALMA-2-0001-1	MUNICIPIO DE GIRARDOT	26-04-21 SE TRAMITÓ EL PAGO EN EL JUZGADO // 12-03-21- AUTO ADMITE DEMANDA (EN TRÁMITES DE PAGO)// 22-01-21 - DEMANDA PRESENTADA // EL RESOLUCIÓN EJECUTORIADA.	
4	ALMA-2-0001-2	MUNICIPIO DE GIRARDOT	26-04-21 SE TRAMITÓ EL PAGO EN EL JUZGADO // 12-03-21- AUTO ADMITE DEMANDA (EN TRÁMITES DE PAGO)// 22-01-21 - DEMANDA PRESENTADA // EL RESOLUCIÓN EJECUTORIADA.	
5	ALMA-2-0001-3	MUNICIPIO DE GIRARDOT	26-04-21 SE TRAMITÓ EL PAGO EN EL JUZGADO // 12-03-21- AUTO ADMITE DEMANDA (EN TRÁMITES DE PAGO)// 22-01-21 - DEMANDA PRESENTADA // EL RESOLUCIÓN EJECUTORIADA.	

DATOS GENERALES DEL INMUEBLE			OBSERVACIONES JUNIO DE 2021	EN TRAMITE DE APELACIÓN DE SENTENCIA
NO.	NO. FICHA PREDIAL	NOMBRE PROPIETARIO		
6	ALMA-2- 0001-4	MUNICIPIO DE GIRARDOT	26-04-21 SE TRAMITÓ EL PAGO EN EL JUZGADO // 12-03-21- AUTO ADMITE DEMANDA (EN TRÁMITES DE PAGO)// 22-01-21 - DEMANDA PRESENTADA // EL RESOLUCIÓN EJECUTORIADA (EN ELABORACIÓN DE DEMANDA)	
7	ALMA-2- 0001-5	MUNICIPIO DE GIRARDOT	26-04-21 SE TRAMITÓ EL PAGO EN EL JUZGADO // 12-03-21- AUTO ADMITE DEMANDA (EN TRÁMITES DE PAGO)// 22-01-21 - DEMANDA PRESENTADA // EL RESOLUCIÓN EJECUTORIADA.	
8	ALMA-2- 0001-6	MUNICIPIO DE GIRARDOT	26-04-21 SE TRAMITÓ EL PAGO EN EL JUZGADO // 12-03-21- AUTO ADMITE DEMANDA (EN TRÁMITES DE PAGO)// 22-01-21 - DEMANDA PRESENTADA // EL RESOLUCIÓN EJECUTORIADA.	
9	ALMA-2- 0001-7	MUNICIPIO DE GIRARDOT	26-04-21 SE TRAMITÓ EL PAGO EN EL JUZGADO // 12-03-21- AUTO ADMITE DEMANDA (EN TRÁMITES DE PAGO)// 22-01-21 - DEMANDA PRESENTADA // EL RESOLUCIÓN EJECUTORIADA.	
10	ALMA-2- 0001-8	MUNICIPIO DE GIRARDOT	26-04-21 SE TRAMITÓ EL PAGO EN EL JUZGADO // 12-03-21- AUTO ADMITE DEMANDA (EN TRÁMITES DE PAGO)// 22-01-21 - DEMANDA PRESENTADA // EL RESOLUCIÓN EJECUTORIADA.	
11	ALMA-2- 0004-1	CERRO COLORADO S.A.S Y OTROS	29-04-21- SE DICTÓ SENTENCIA // AUTO 14-04-21 FIJA FECHA PARA AUDIENCIA DE FALLO PARA EL 29-04-21 //19-03-21- SE SOLICITÓ PROGRAMAR NUEVAMENTE LA DILIGENCIA DE AVALÚO // 25-02-20- SE APLAZÓ LA DILIGENCIA POR SOLICITUD DEL APODERADO DE LOS DEMANDADOS.	
12	ALMA-2- 0004-2	CERRO COLORADO S.A.S Y OTROS	19-03-21- SE SOLICITÓ PROGRAMAR NUEVAMENTE LA DILIGENCIA DE AVALÚO // 03-03-20- SE SOLICITÓ FECHA PARA DICTAR SENTENCIA YA QUE NO SE CONTESTÓ LA DEMANDA//NOTIFICADA, ESPERA DE CONTESTACION DE LA DEMANDA//05-09-2019 SE LLEVO A CABO LA ENTREGA ANTICIPADA.	
13	ALMA-2- 0006	CERRO COLORADO S.A.S Y OTROS	03-02-21 SE RADICARON OFICIOS PARA REGISTRO DE SENTENCIA// ESPERA DE OFICIOS PARA REGISTRO DE SENTENCIA//20/09/2019 DECLARA DESIERTO EL RECURSO DE APELACIÓN// (PROCESO EN ETAPA DE APELACIÓN DE SENTENCIA) 10/07/2019 AUDIENCIA DE SUSTENTACION DE AVALUO Y RESOLUCION DE NULIDAD/.	18-02-2021- SE PRESENTÓ EN INTERVENTORIA (CUMPLE HASTA AVALÚO)

DATOS GENERALES DEL INMUEBLE			OBSERVACIONES JUNIO DE 2021	EN TRAMITE DE APELACIÓN DE SENTENCIA
NO.	NO. FICHA PREDIAL	NOMBRE PROPIETARIO		
14	ALMA-2-0007	CERRO COLORADO S.A.S Y OTROS	//(EXPEDIENTE EN PREPARACIÓN DE CARPETA BLANCA) // PROCESO TERMINADO FOLIO ANI NO. 307-108722//04-10-18- SE DICTÓ SENTENCIA EN FAVOR DE LA ANI - PENDIENTE EXPEDIR FOLIO // 03-09-2018. AUTO FIJA FECHA PARA DILIGENCIA DE SUSTENTACION DE AVALUO PARA EL 04 DE OCTUBRE DE 2018 // 29-AGOSTO-2018 AUTO CORRE TRASLADO DEL AVALUO DE LOS DEMANDADOS //	
15	ALMA-2-0026	GONZALO RAMIREZ PEREZ (HEREDEROS)	09-06-21 EN TRÁMITES DE NOTIFICACIÓN // 19-05-21 DILIGENCIA ENTREGA ANTICIPADA //14-04-21- AUTO SEÑALA FECHA DE ENTREGA ANTICIAPDA PARA EL 19-05-21 // 25-02-2021 SE SOLICITA UNA VEZ MAS LA ENTREGA ANTICIPADA // 11 -11-2020 SE APLAZÓ LA DILIGENCIA DE EA//	
16	ALMA-2-0026-1	OSCAR ALFREDO GUERRA CASTRO, GERMAN LAGUNA CURACO, ALONSO OVIEDO RODRIGUEZ, MARIA AURORA LAGUNA ARTEAGA, GONZALO RAMIREZ PEREZ	04-03-21- SE RADICÓ LA DEMANDA (PENDIENTE ADMISIÓN) //23-02-21 RESOLUCIÓN NOTIFICADA Y EJECUTORIADA // EN TRAMITES DE NOTIFICACIÓN POR AVISO DE LA RESOLUCIÓN DE EXRPOIACIÓN.	
17	ALMA-2-0027	ALICIA MILENA HERNANDEZ ALBARRACÍN, HECTOR HERNANDEZ ALBARRACÍN, DIEGO HERNANDEZ ALBARRACÍN	14-05-21 - AL DESPACHO // 05-03-20- SE REMITIERON LOS AVISOS DE NOTIFICACIÓN// 02-10-20- EN TRAMITES DE NOTIFICACIÓN PERSONAL DE LA DEMANDA// 13/02/2020 ENTREGA ANTICIPADA//19/12/2019 AUTO ORDENA ENTREGA ANTICIPADA//01/10/2019 APORTA CONSIGNACION EN EL JUZGADO//	
18	ALMA-2-0030	EDGAR FORERO PARDO Y OTROS	04-03-21 - SE REITERA REQUERIMIENTO // 08-03-21 - SE SOLICITA REQUERIR AL CURADOR // 12-09-2020- NOMBRA REPLAZO CURADOR // 24-07-20, SE SOLICITÓ REMOVER AL CURADOR // 28-02-20- REQUIEREN NUEVAMENTE AL CURADOR// 20/11/2019 DESIGNAN CURADOR //EN NOTIFICACION DE LA DEMANDA.	
19	ALMA-2-0037	SHIRLEY YVONNE RINCON BAQUERO	03-03-21 SE REITERÓ REQUERIMIENTO PARA EMPLAZAR // 06-03-20- SE SOLICITÒ EL EMPLAZAMIENTO DE LA DEMANDADA // EN TRAMITES DE NOTIFICACION// 04/12/2019 ENTREGA ANTICIPADA//13/11/2019 AUTO FIJA FECHA Y HORA PARA DILIGENCIA DE ENTREGA ANTICIPADA//	

DATOS GENERALES DEL INMUEBLE			OBSERVACIONES JUNIO DE 2021	EN TRAMITE DE APELACIÓN DE SENTENCIA
NO.	NO. FICHA PREDIAL	NOMBRE PROPIETARIO		
			18/10/2019 SE REALIZA PAGO Y SE APORTA EN EL JUZGADO	
20	ALMA-2-0046-2	LUIS HERNANDO BALLESTAS RINCON	09-03-21- SE REMITIERON LOS AVISOS PARA NOTIFICAR AL DEMANDADO // 14-07-20 EN NOTIFICACIÓN DE LA DEMANDA // 25-02-20- SE LLEVÓ A CABO LA DILIGENCIA DE ENTREGA ANTICIPADA// 19/11/2019 AUTO ORDENA ENTREGA ANTICIPADA COMISIONA NARIÑO (25/02 /2020).	
21	ALMA-2-0085	EDGAR DANIEL RINCON ANGEL	13-03-20- EN TRAMITES DE NOTIFICACION POR AVISO// 19/12/2019 AUTO ORDENA LA ENTREGA ANTICIPADA// 4/12/2019 SE REALIZA PAGO Y SE APORTA EN EL JUZGADO// 19/11/2019 TRAMITES PAGO CONCESION//15/11/2019 AUTO ADMITE DEMANDA//06/08/2019 PRESENTA DEMANDA .	
22	ALMA-2-0087	EDGAR DANIEL RINCON ANGEL	10-06-21 EN TRÁMITES DE PAGO // 21-05-21- SE ADMITIÓ DEMANDA // 19-03-21- SE RADICÓ DEMANDA // 05-02-21 RESOLUCIÓN NOTIFICADA Y EJECUTORIADA // EN TRAMITES DE NOTIFICACIÓN POR AVISO DE LA RESOLUCIÓN DE EXPROPIACIÓN.	
23	ALMA-2-0088	WALDIN JESÚS RIVADENEIRA PINTO	14-06-21-EN TRÁMITES DE ENVÍO DEL AVISO PARA NOTIFICAR LA RESOLUCIÓN DE EXPROPIACIÓN. // EN TRÁMITES DE ENVÍO DE LA CITACIÓN PARA NOTIFICAR LA RESOLUCIÓN DE EXPROPIACIÓN.	
24	ALMA-2-0089	SHIRLEY YVONNE RINCON BAQUERO	11-05-21- DESPACHO COMISORIO AL JUZGADO DE NARIÑO PARA EA.// 24-02-21 -SE SOLICITÓ FIJAR FECHA DE ENTREGA ANTICIPADA // 29-10-2020- AUTO ADMITE DEMANDA // DEMANDA PRESENTADA EN EL JUZGADO DE GIRARDOT EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020	
25	ALMA-2-0090	WALDIN JESÚS RIVADENEIRA PINTO	(EXPEDIENTE EN PREPARACIÓN DE CARPETA BLANCA)//04-04-19 PROCESO TERMINANDO FOLIO ANI 307-102987//04/06/18- SE SOLICITÓ A LA ORIP GIRARDOT CANCELAR LA OFERTA FORMAL DE COMPRA, YA QUE NO LO REALIZÓ.	18-02-2021- SE PRESENTÓ EN INTERVENTORIA (CUMPLE HASTA AVAÚO)
26	ALMA-2-0091	EDGAR DANIEL RINCON ANGEL	20-05-21 SE RADICÓ DEMANDA // 23-04-21 NOTIICADA //18-03-21 EN TRÁMITES DE NOTIFICACIÓN POR AVISO // EN TRÁMITES DE ENVÍO DE CITACIÓN PARA NOTIFICAR.	
27	ALMA-2-0102	LUIS EDUARDO MEDINA (HEREDEROS)	02-03-21- SE REQUIRIÓ AL JUZGADO PARA QUE INFORME ACERCA DEL EMPLAZAMIENTO // 24-07-20, SE SOLICITÓ NUEVAMENTE EMPLAZAMIENTO //13-	

DATOS GENERALES DEL INMUEBLE			OBSERVACIONES JUNIO DE 2021	EN TRAMITE DE APELACIÓN DE SENTENCIA
NO.	NO. FICHA PREDIAL	NOMBRE PROPIETARIO		
			03-20 SE SOLICITÓ EMPLAZAMIENTO// EN TRAMITES DE NOTIFICACION//19/12/2019 AUTO ORDENA ENTREGA ANTICIPADA//01/10/2019 APORTA CONSIGNACION EN EL JUZGADO.	
28	ALMA-2-0103	GUILLERMO BONILLA PARRA (HEREDEROS)	(EN TRAMITES DE REGISTRO DE SENTENCIA) 17-03-21- SE DICTA SENTENCIA EN FAVOR DE LA ANI// 16-02-2021 AUTO NOMBRA CURADOR Y FIJA GASTOS // 24-07-20, SE SOLICITÓ NUEVAMENTE EMPLAZAMIENTO // 13-03-20 SE SOLICITÓ EMPLAZAMIENTO//EN NOTIFICACION// 28/11/2019 ENTREGA ANTICIPADA	
29	ALMA-2-0104	BERTHA CELIS CELIS	04-06-21- SE SOLICITÓ IMPULSO PROCESAL // 12-02-2021 - AUTO RELEVA CURADOR // 13-07-20, NOTIFICACIÓN DE LA DEMANDA // 25-02-20- SE LLEVÓ A CABO LA DILIGENCIA DE ENTREGA ANTICIPADA// 22/11/2019 AUTO OREDENA ENTREGA ANTICIPADA, COMISIONA A NARIÑO (25/02/2020)// 18/10/2019 SE REALIZA PAGO Y APORTA EN EL JUZGADO.	
30	ALMA-2-0106	ALFONSO MONTENEGRO HERRERA (HEREDEROS)	10-03-21- SE ENVIARON LOS AVISOS PARA NOTIFICAR A LOS DEMANDADOS // 13-07-20, NOTIFICACIÓN DE LA DEMANDA // 25-02-20- SE LLEVÓ A CABO LA DILIGENCIA DE ENTREGA ANTICIPADA//16/01/2020 ENTREGA ANTICIPADA COMISIONA NARIÑO (25/02/2020)//04/12/2019 REALIZA PAGO Y APORTA AL JUZGADO//02/10/2019 TRAMITE PAGO CONCESION.	
31	ALMA-2-0106-1	RAFAEL MEDINA BAJONERO (HEREDEROS)	25-02-2020 - SE REITERÓ LA SOLICITUD DE OCICIOS A LA ORIP DE GIRARDOR // 23-10-20- FIJA FECHA PARA DILIGENCIA DE SUSTENTACIÓN DE AVALUO PARA EL 01-12-20// 05-03-20 ENTRÓ AL DESPACHO// SE ENCUENTRA EN NOTIFICACION (EMPLAZAMIENTO)// 4/06/2019 ENTREGA ANTICIPADA 27 DE JUNIO DE 2019 A LAS 10:00 AM	
32	ALMA-2-0106-2	JACOBO WAGNER MURCIA	16-03-21- SE ENVIARON LOS AVISOS PARA NOTIFICAR A LOS DEMANDADOS // 13-07-20, NOTIFICACIÓN DE LA DEMANDA // 25-02-20- SE LLEVÓ A CABO LA DILIGENCIA DE ENTREGA ANTICIPADA// 23/01/2020 AUTO ORDENA ENTREGA ANTICIPADA COMISIONA NARIÑO//15/01/2020 SE REALIZA PAGO Y SE APORTA EN EL JUZGADO//15/11/2019 TAMITE PAGO CONCESION	

DATOS GENERALES DEL INMUEBLE			OBSERVACIONES JUNIO DE 2021	EN TRAMITE DE APELACIÓN DE SENTENCIA
NO.	NO. FICHA PREDIAL	NOMBRE PROPIETARIO		
33	ALMA-2- 0106-3	ORLANDO DAZA TRIANA	02-06-20 - SE REITERÓ SOLICITUD DE OFICIOS //28-10-2020- SE SOLICITARON OFICIOS PARA REGISTRO DE SENTENCIA //17-09-20- SE DICTA SENTENCIA EN FAVOR DE LA ANI //17-02-20- LA CURADORA CONTESTÒ LA DEMANDA// 19-01-20- SE NOMBRO CURADORA// EN TRAMITES DE NOTIFICACION DE DEMANDA (EMPLAZAMIENTO)	
34	ALMA-2- 0106-4	FREDY ALBERTO PUERTO MONCADA FREDY HORACIO REYES SANCHEZ	28-05-2021- SE INSISTIÓ ANTE EL JUZGADO EL REGISTRO DE LA SENTENCIA // 25-02-2021 - SE REITERÓ LA SOLICITUD DE OCICIOS A LA ORIP DE GIRARDOR // 24-09-20 AUDIENCIA DE INTERROGATORIO DE PERITOS Y SENTENCIA // 03-09-20- AUTO PROGRAMA DILIGENCIA DE SUSTENTACION AVALUOS PARA EL 24-SEP-20// 04-03-20- ENTRÓ AL DESPACHO//	
35	ALMA-2- 0106-5	HECTOR FRANCO DUQUE, WILLIAM DE JESUS CARDENAS, SIGIFREDO TRUJILLO ARIAS,LUIS EDUARDO MUÑOZ ALVAREZ	26-05-21 SE SOLICITÓ NOMBRAR CURADOR // 16-03-21- SE ENVIARON LOS AVISOS PARA NOTIFICAR A LOS DEMANDADOS // 13-07-20, NOTIFICACIÓN DE LA DEMANDA // 25-02-20- SE LLEVÓ A CABO LA DILIGENCIA DE ENTREGA ANTICIPADA// 23/01/2020 AUTO ORDENA ENTREGA ANTICIPADA COMISIONA NARIÑO.	
36	ALMA-2- 0106-6	MARIA OMAIRA PATIÑO PATIÑO	04-06-21 - SE SOLICITÓ IMPULSO PROCESAL // 12-02-2021 AUTO REQUIERE CURADOR // 27-02-2019- REQUIEREN AL CURADOR // 18/12/2019 DESIGNAN CURADOR //EN NOTIFICACION (EMPLAZAMIENTO)//09/07/2019 AUTO AUTORIZA EL EMPLAZAMIENTO//EN TRAMITES DE NOTIFICACION DE DEMANDA.// 16/05/2019 ENTREGA ANTICIPADA DEL PREDIO.	
37	ALMA-2- 0106-7	RICARDO ELIAS WELLS ALBA	05-11-20 SE DICTÓ SENTENCIA (EN TRAMITES DE REGISTRO) // 13-03-20 SE NOMBRÓ CURADOR// EN NOTIFICACION (EMPLAZAMIENTO)//5/09/2019 ENTREGA ANTICIPADA//26/08/2019 AUTO ORDENA ENTREGA ANTICIPADA//09/08/2019 SE REALIZA PAGO Y SE APORTA EN EL JUZGADO.	
38	ALMA-2- 0106-8	RICARDO ELIAS WELLS ALBA	19-05-21 SE DICTÓ SENTENCIA (EN TRAMITES DE REGISTRO) // 06-04-21 SE NOMBRÓ NUEVO CURADOR// EN NOTIFICACION (EMPLAZAMIENTO)//4/12/2019 ENTREGA ANTICIPADA//13/11/2019 AUTO FIJA FECHA Y HORA PARA DILIGENCIA DE ENTREGA ANTICIPADA/	

DATOS GENERALES DEL INMUEBLE			OBSERVACIONES JUNIO DE 2021	EN TRAMITE DE APELACIÓN DE SENTENCIA
NO.	NO. FICHA PREDIAL	NOMBRE PROPIETARIO		
39	ALMA-2- 0106-9	MARÍA MERCEDES ZAPATA PEREZ	31-05-21- SE ENVIARON NOTIFICACIONES POR AVISO // 12-10-2020- SE ENVIARON LAS CITACIONES PARA NOTIFICAR LA DEMANDA// 25-02-20- SE LLEVÓ A CABO LA DILIGENCIA DE ENTREGA ANTICIPADA// 20/11/2019 AUTO ORDENA ENTREGA ANTICIPADA COMISIONA JUZGADO DE NARIÑO (25/02/2020)//27/08/2019 SE REALIZA PAGO Y SE APORTA CONSIGNACION EN EL JUZGADO.	
40	ALMA-2- 0106-10	JORGE ARIEL ROSAS FONSECA Y OTROS	19-05-21 TRAMITE REGISTRO NAL. DE EMPLAZADOS// 16-03-21- SE ENVIARON LOS AVISOS PARA NOTIFICAR A LOS DEMANDADOS // 12-10-2020- SE ENVIARON LAS CITACIONES PARA NOTIFICAR LA DEMANDA// 25- 02-20- SE LLEVÓ A CABO LA DILIGENCIA DE ENTREGA ANTICIPADA.	
41	ALMA-2- 0106-11	CLAUDIA BEATRIZ GAMBA TORRES Y OTROS	09-06-21- EN TRÁMITES DE ENVIO DE AVISOS PARA NOTIFICAR LA RESOLUCIÓN DE EXPROPIACIÓN. // EN TRAMITES DE NOTIFICACIÓN PERSONAL DE LA RESOLUCIÓN DE EXPROPIACIÓN.	
42	ALMA-2- 0106-12	NICOLAS VALENCIA GARCIA	01-12-20 SE DICTÓ SENTENCIA (TRAMITES DE REGISTRO) //23-10-20- FIJA FECHA PARA DILIGENCIA DE SUSTENTACIÓN DE AVALUO PARA EL 01-12-20// 03-03-20- SE SOLICITÓ NOMBRAR CURADOR// EN NOTIFICACION (EMPLAZAMIENTO) //28/11/2019 ENTREGA ANTICIPADA //06/11/2019 AUTO FIJA FECHA Y HORA PARA ENTREGA ANTICIPADA//18/10/2019	
43	ALMA-2- 0106-13	JAIME ARTURO ACOSTA PARRADO (HEREDEROS)	09-06-21 - SE DICTÓ SENTENCIA EN FAVOR DE LA ANI // 30-04-21- FIJA FECHA DILIGENCIA INTERROGATORIO Y SENTENCIA (09-06-21) // AUTO 14-04-21 TIENE POR CONTESTADA LA DEMANDA POR PARTE DEL CURADOR // 12-02-2021- AUTO REQUIERE CURADOR // 03-03-20- SE SOLICITÓ NOMBRAR CURADOR.	
44	ALMA-2- 0116	ROSAURA MARTINEZ DE FALLA	30-04-2021- AUTO AGREGA DESPACHO COMISORIO Y PONE EN CONOCIMIENTO // 22-09-20 SE SOLICITÓ DILIGENCIA DE ENTREGA ANTICIPADA// 22-07-20, PENDIENTE PAGO FIDUCIA // 25-03-20 SE ESTÁ TRAMITANDO EL PAGO ANTE LA FIDUCIA.// 11-03- 2020-AUTO ADMITE DEMANDA.	
45	ALMA-2- 0135	LUIS MARIA HERRERA (HEREDEROS)	30-04-21 NOMBRA NUEVO CURADOR AD-LITEM // 03- 03-20- SE SOLICITÓ NOMBRAR CURADOR// EN NOTIFICACION DE DEMANADA	

DATOS GENERALES DEL INMUEBLE			OBSERVACIONES JUNIO DE 2021	EN TRAMITE DE APELACIÓN DE SENTENCIA
NO.	NO. FICHA PREDIAL	NOMBRE PROPIETARIO		
			EMPLAZAMIENTO)//18/09/2019 ENTREGA ANTICIPADA//30/07/2019 FIJA FECHA PARA ENTREGA ANTICIPADA //9/07/2019 AUTO ORDENA ENTREGA ANTICIPADA DESPACHO COMISORIO GUATAQUÍ.	
46	ALMA-2-0139	HUMBERTO NUÑEZ MEJIA	FOLIO ANI//30/07/2019 SE LLEVÓ A CABO LA LA AUDIENCIA SUSTENTACION AVALUO//8/05/2019 CONTESTA LA DEMANDA LA PARTE DEMANDADA//7/05/2019 SE NOTIFICA PERSONALMENTE LA PARTE DEMANDADA//14/03/19 AGREGASE AL EXPEDIENTE DESPACHO COMISORIO//7/02/19 AUDIENCIA ENTREGA ANTICIPADA 3:00 PM.	
47	ALMA-2-0147	DIANA CECILIA SARMIENTO ESCOBAR	02-03-21- SE REQUIRIÓ AL JUZGADO PARA QUE INFORME ACERCA DEL EMPLAZAMIENTO // 24-07-20 SE SOLICITÓ NUEVAMENTE EL EMPLAZAMIENTO // 03-03-20- SE SOLICITÓ EL EMPLAZAMIENTO DE LA DEMANDADA// EN NOTIFICACION //28/11/2019 ENTREGA ANTICIPADA//15/10/2019 FIJA FECHA PARA ENTREGA ANTICIPADA //22/08/2019 SE REALIZA PAGO Y SE APORTA EN EL JUZGADO .	
48	ALMA-2-0149	CARLOS ENRIQUE SOTO (HEREDEROS)	04-03-21 SE REITERÓ SOLICITUD // 03-03-20- SE SOLICITÓ NOMBRAR CURADOR// TRAMITES DE NOTIFICACION DE LA DEMANDA (EMPLAZADO)//14/05/2019 ENTREGA ANTICIPADA DEL PREDIO//29/04/2018 AUTO ORDENA ENTREGA ANTICIPADA 14-05-19 2.00 PM.	
49	ALMA-2-0151	COMPAÑÍA PARCELADORA LIMITADA EN LIQUIDACION	26-05-21 SE LLEVÓ A CABO LA ENTREGA ANTICIPADA // 21-09-2020- DECRETA ENTREGA ANTICIPADA PARA EL 11 DE NOVIEMBRE DE 2020 /22-09-20 SE SOLICITÓ ADELANTAR LA DILIGENCIA DE ENTREGA ANTICIPADA // 05-03-20- SE APORTA EL PAGO EN EL JUZGADO// 06/02/2020 TRAMITES PAGO CONCESION//04/02/2020 AUTO ADMITE DEMANDA.	
50	ALMA-2-0157	GLORIA INES FIGUEROA BARRAGAN Y OTROS	31-05-21 DEMANDA PRESENTADA // RESOLUCIÓN EJECUTORIADA (PENDIENTE PRESENTAR DEMANDA) 23-04-21 EN TRAMITES DE AVISO // EN TRÁMITES DE ENVÍO DE CITACIÓN PARA NOTIFICAR.	
51	ALMA-2-0160	ARTURO RODRIGUEZ (HEREDEROS)	19-05-2021 AUTO TIENE POR CONTESTADA LA DEMANDA // 12-02-2021- AUTO TIENE POR CONTESTADA LA DEMANDA // . 22-09-20 SE SOLICITÓ NUEVAMENTE ADELANTAR LA DILIGENCIA DE ENTREGA ANTICIPADA // 03-03-2020 SE SOLICITÓ	

DATOS GENERALES DEL INMUEBLE			OBSERVACIONES JUNIO DE 2021	EN TRAMITE DE APELACIÓN DE SENTENCIA
NO.	NO. FICHA PREDIAL	NOMBRE PROPIETARIO		
			FIJAR FECHA ENTREGA ANTICIPADA// 03/02/2020 AUTO APLAZA ENTREGA ANTICIPADA.	
52	ALMA-2- 0166	SEMINARIO DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN Y HECTOR LUIS CUERVO CASTRO (HEREDEROS)	12-05-21 SE SOLICITÓ EL EMPLAZAMIENTO DE LOS DEMANDADOS // 18-09-20 NOTIFICACIÓN POR AVISO A LOS DEMANDOS // 17-07-20 TRAMITES DE NOTIFICACIÓN DEMANDA // 18-02-2020- SE LLEVÓ A CABO LA DILIGENCIA DE ENTREGA ANTICIPADA/	
53	ALMA-3- 0020-3	LUIS EUGENIO ALBADAN CARDENAS	11-06-21 EN TRAMITES DE NOTIFICACIÓN DE LA DEMANDA // 09-03-21- AUTO ORDENA AGREGAR AL EXPEDIENTE DESPACHO COMISORIO // 20-11-20 SE LLEVÓ A CABO LA ENTREGA ANTICIPADA // 09-10-20 FIJA ENTREGA ANTICIPADA PARA EL 20-11-20 .	
54	ALMA-3- 0020-15	LUIS HERNANDO CASAS ORTIZ	04-05-21 - SE DICTÓ SENTENCIA (EN TRAMITES DE REGISTRO) AUTO 14-04-21 FIJA FECHA PARA AUDIENCIA DE FALLO PARA EL 04-05-21 /12-02-21 AUTO TIENE POR NOTIFICADO A LUIS HERNANDO CASAS ORTIZ // 12/02/2020 EN NOTIFICACION POR AVISO DE LA DEMANDA//27/11/2019 CITACIÓN PERSONAL PARA NOTIFICAR DEMANDA	
55	ALMA-3- 0020-22	ALFONSO ESPITIA AYERBE - MARTHA CECILIA ESPITIA VELANDIA	18-03-21 SE DICTÓ SENTENCIA EN FAVOR DE LA ANI// 02-10-20- SE CONTESTÓ UN INCIDENTE DE NULIDAD PROPUESTO POR LOS DEMANDADOS.// 29-09-20- SE LLEVARÁ A CABO LA AUDIENCIA DE INTERROGATORIO A PERITOS // 22/01/01/2020 DEMANDA NOTIFICADA //18/09/2019 ENTREGA ANTICIPADA	
56	ALMA-3- 0060	JENNY PAOLA URQUIJO LOZANO	10-05-21 - EN TRAMITES DE NOTIFICACIÓN DE LA DEMANDA // 11-11-2020 SE LLEVÓ A CABO LA ENTREGA ANTICIPADA // 21-09-20- SE SOLICITÓ NUEVAMENTE DILIGENCIA PARA LLEVAR A CABO LA ENTREGA ANTICIPADA // 04-08-2020 SE SOLICITÓ ENTREGA ANTICIPADA // 21-05-2020 ADMISIÓN DE DEMANDA	
57	ALMA-3- 0062	DANIEL GORDILLO	FOLIO ANI//19/11/19 AUDIENCIA SUSTENTACION DE AVALUO//15/08/2019 FIJA FECHA PARA AUDIENCIA //21/05/2019 SE TIENE CONTESTADA LA DEMANDA POR PARTE DE DANIEL GORDILLO FALTA NOTIFICAR A LA ANT. //21/11/18, SE LLEVÓ A CABO LA DILIGENCIA DE ENTREGA ANTICIPADA CON EL JUZGADO CIVIL MUNICIPAL DE GATAQUÍ.	
58	ALMA-3- 0065	LUZ MARINA ARENAS DE PEREIRA	26-05-21 SE LLEVÓ A CABO LA DILIGENCIA DE EA // AUTO 18-12-20 FIJA FECHA DE ENTREGA ANTICIPADA	

DATOS GENERALES DEL INMUEBLE			OBSERVACIONES JUNIO DE 2021	EN TRAMITE DE APELACIÓN DE SENTENCIA
NO.	NO. FICHA PREDIAL	NOMBRE PROPIETARIO		
			PARA EL 14-10-2020- SE CONSIGNÓ A ORDENES DEL JUZGADO EL TITULO PARA LA ENTREGA ANTICIPADA // 07-09-20- AUTO ADMITE DEMANDA	
59	ALMA-3-0073-1	PALMAS, PINOS Y MINERALES DE COLOMBIA S.A.S.	18-03-21- SE SOLICITARON LOS OFICIOS DE REGISTRO DE SENTENCIA // 15-01-2021 AUTO ORDENA AGREGAR AL EXPEDIENTE LA ENTREGA DEFINITIVA (SE TRAMITARÁ EL REGISRTO DE LA SENTENCIA) 07-10-20 ENTREGA DEFINITIVA // 24-09-2020 SE SOLICITÓ COMISIONAR PARA DILIGENCIA DE ENTREGA DEFINITIVA.//11-03-2020, SE DICTO SENTENCIA EN FAVOR DE LA ANI.	
60	ALMA-3-0074	INVERSIONES Y REPRESENTACIONES ROCA S.A.S.	05-06-21 AUTO RESUELVE NULIDAD EN FAVOR DE LA ANI// 02-03-21- DEMANDADO INTERPONE INCIDENTE DE NULIDAD// 10-09-2020- SE SOLICITÓ NOMBRAR CURADOR PARA EL DEMANDADO // 02-03-2020 CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA POR PARTE DE LA DIAN //19-01-2020-EN NOTIFICACION DE DEMANDA EMPLAZADO.	
61	ALMA-3-0078	JOSE ROSEMBERG NUÑEZ CADENA	18-03-21- SE DICTÓ SENTENCIA EN FAVOR DE LA ANI // 24-02-21 FIJA FECHA PARA DILIGENCIA DE SUSTENTACIÓN DE AVALUO PARA EL DÍA 24-02-21 // 26-10-20- FIJA FECHA PARA DILIGENCIA DE SUSTENTACIÓN DE AVALUO PARA EL DÍA 11-11-20	
62	ALMA-3-0081	ANA JAEI GUAUQUE DIAZ	18-03-21- SE SOLICITA ADELANTAR DILIGENCIA DE ENTREGA ANTICIPADA (PENDIENTE ENTREGA ANTICIPADA) 26-10-20- SE APORTA PAGO EN EL JUZGADO // 08-10-20 SE ADMITE DEMANDA// DEMANDA PRESENTADA VIRTUALMENTE EL 11-09-20, EN EL JUZGADO DE LERIDA	
63	ALMA-3-0082	HERNAN ZARATE CASTILLO (HEREDEROS)	09-04-21- SE RELEVÓ DEL CARGO AL CURADOR // 05-03-2021- SE ENTREGÓ DESPACHO COMISORIO // 21-10-2020- SE CONSIGNÓ A ORDENES DEL JUZGADO EL TITULO PARA LA ENTREGA ANTICIPADA // 18-09-20- AUTO ADMITE DEMANDA (EN TRÁMITES DE PAGO) // 03-07-20 SE PRESENTÓ DEMANDA VIRTUALMENTE EN EL JUZGADO DE LERIDA	
64	ALMA-3-0086	BELMA CORTES PALMA	12-03-21 SE SOLICITÓ AL JUZGADO LA ELABORACION DE OFICIOS PARA EL REGISTRO DE SENTENCIA // 15-01-2021 AUTO ORDENA AGREGAR AL EXPEDIENTE LA ENTREGA DEFINITIVA (SE TRAMITARÁ EL REGISRTO DE LA SENTENCIA) 07-10-20 ENTREGA DEFINITIVA // 24-09-2020 SE SOLICITÓ COMISIONAR PARA DILIGENCIA	

DATOS GENERALES DEL INMUEBLE			OBSERVACIONES JUNIO DE 2021	EN TRAMITE DE APELACIÓN DE SENTENCIA
NO.	NO. FICHA PREDIAL	NOMBRE PROPIETARIO		
			DE ENTREGA DEFINITIVA.//21-02-20 AUDIENCIA DE SENTENCIA	
65	ALMA-3-0089	CONSUELO VALLEJO LEMA JAIME PATRICIO MIRA VELASQUEZ (+)	03-06-21 AUTO TIENE POR NOTIFICADOS A LOS DEMANDADOS Y ORDENA EA // 05-03-2021- SE REALIZÓ LA CONSIGNACIÓN AL JUZGADO // 29-01-21 SE GESTIONÓ EL PAGO PARA LA ENTREGA ANTICIPADA// 01-12-2020 AUTO ADMITE DEMANDA // DEMANDA PRESENTADA EN LERIDA EL 08-SEP-20.	
66	ALMA-3-0092	TECA TRANSPORTES S.A	12-03-21 SE SOLICITÓ AL JUZGADO LA ELABORACION DE OFICIOS PARA EL REGISTRO DE SENTENCIA // 19-10-20- ORDENA REGISTRO DE SENTENCIA // 24-09-2020 SE SOLICITARON NUEVAMENTE OFICIOS PARA REGISTRO DE SENTENCIA//ESPERA DE OFICIOS PARA REGISTRO DE SENTENCIA 08/08/2019 ENTREGA DEFINITIVA/	
67	ALMA-3-0094	LILIA ESTHER CÉSPEDES HOMEZ	24-09-2020 SE SOLICITARON NUEVAMENTE OFICIOS PARA REGISTRO DE SENTENCIA// ESPERA DE OFICIOS PARA INSCRIPCION DE LA DEMANDA 12/09/2019 ENTREGA DEFINITIVA DEL PREDIO //23/07/2019 AUTO ORDENA ENTREGA DEFINITIVA COMISIONA BELTRAN //11/06/19 NUEVA FECHA AUDIENCIA 10/07/19/	
68	ALMA-3-0095	ISRAEL PEREZ (HEREDEROS)	28-05-21 EN TRAMITES DE REGISTRO EN LA ORIP DE FACA // 19-10-20- ORDENA REGISTRO DE SENTENCIA // 24-09-2020 SE SOLICITARON NUEVAMENTE OFICIOS PARA REGISTRO DE SENTENCIA//ESPERA DE OFICIOS PARA ENTREGA REGISTRO DE LA SENTENCIA 08/08/2019 ENTREGA DEFINITIVA //26/06/2019 AUTO ORDENA ENTREGA DEFINITIVA DEL PREDIO COMISIONA BELTRAN	
69	ALMA-3-0100	CARLOS HERRERA MORENO (HEREDEROS)	04-06-21 SE SOLICITÓ OFICIOS DE REGISTRO DE SENTENCIA// 15-01-2021 AUTO ORDENA AGREGAR AL EXPEDIENTE LA ENTREGA DEFINITVA (SE TRAMITARÁ EL REGISRTO DE LA SENTENCIA) 07-10-20 ENTREGA DEFINITIVA // 24-09-2020 SE SOLICITÓ COMISIONAR PARA DILIGENCIA DE ENTREGA DEFINITIVA. SE SOLICITARON LOS OFICIOS PARA REGISTRO DE SENTENCIA.	
70	ALMA-3-0101	CESAR AUGUSTO AYALA MORA Y OTROS	15-05-2021- SE REALIZÓ PAGO AL JUZGADO (PENDIENTE ENTREGA ANTICIPADA) AUTO ADMITE DEMANDA 24-03-21 // DEMANDA PRESENTADA EL 02	

DATOS GENERALES DEL INMUEBLE			OBSERVACIONES JUNIO DE 2021	EN TRAMITE DE APELACIÓN DE SENTENCIA
NO.	NO. FICHA PREDIAL	NOMBRE PROPIETARIO		
			DE DICIEMBRE EN REPARTO FACATATIVA // RSOLUCION NOTIFICADA Y EJECUTORIADA	
71	ALMA-3-0102	MAPIVIAN S.A.S.	21-05-2021 FOLIO ANI // 02-10-20- SE RADICA EN REGISTRO LA SENTENCIA. 26/02/2020 ENTREGA DEFINITIVA//6/12/2019 AUDIENCIA DE SUSTENTACION DE AVALUO//08/10/2019 NUEVA FECHA DE AUDIENCIA //SE APLAZA AUDIENCIA POR SOLICITUD DEL PERITO//26/07/2019 FIJA FECHA PARA AUDIENCIA 25/09/2019	
72	ALMA-3-0103-1	JOSE ROSEMBERG NUÑEZ DIAZ MICHAEL STEVEN NUÑEZ DIAZ	12-11-2020- TRIBUNAL REQUIERE AL APELANTE SUSTENTAR EL RECURSO // 06-03-2020- TRIBUNAL DE IBAGUÉ ADMITE LA APELACIÓN -30-01-2020-DICTA SENTENCIA A FAVOR DE LA ANI, EN APELACION TRIBUNAL //19/11/2019 AUTO FIJA FECHA Y HORA PARA SUSTENTACION DE AVALUO//EN TRAMITE DE NOIFICACION	REMITIDO AL TRIBUNAL SUPERIOR DE IBAGUÉ
73	ALMA-3-0110	HERNANDO CHINCHILLA ROA (HEREDEROS)	12-03-21 SE SOLICITÓ AL JUZGADO LA ELABORACION DE OFICIOS PARA EL REGISTRO DE SENTENCIA // 07-10-20 ENTREGA DEFINITIVA // 11-03-2020, SE DICTO SENTENCIA EN FAVOR DE LA ANI// 25/02/2020 AUDIENCIA DE SUSTENTACION DE AVALUO//27/11/2019//21/08/2019 SEÑALA FECHA Y HORA DE SUSTENTACION DE AVALUO 17/10/2019.	
74	ALMA-3-0111	JORGE ADAN DOMINGUEZ LAITON	12-03-21 SE APORTÓ EL PAGO EN EL JUZGADO // 01-12-2020 AUTO ADMITE DEMANDA // DEMANDA PRESENTADA EN LERIDA EL 15 DE SEPTIEMBRE.	
75	ALMA-3-0127	ANTONIETA ESPINOZA PULECIO ANA MARIA LEHMANN MOSQUERA	30-04-2021 AUTO ADMITE DEMANDA // SE REQUIRIÓ NUEVAMENTE AL JUZGADO DE LERIDA//DEMANDA PRESENTADA EL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020	
76	ALMA-3-0128	CONSUELO URUEÑA URUEÑA	RESOLUCIÓN EJECUTORIADA (EN ELABORACIÓN DE DEMANDA) 23-04-21 NOTIFICADA // EN TRAMITES AVISO // CITACIÓN PARA NOTIFICAR LA RESOLUCIÓN DE EXPROPIACIÓN.	
77	ALMA-3-0132	JULIO CESAR ROMERO BARON HELIODORO ALVAREZ DAVID RAMIREZ	01-04-21 - AUTO REMITE A JUZGADOS DE BOGOTÁ POR COMPETENCIA // 04-02-21 SE SUBSANA DEMANDA // 02-02-21 - AUTO INADMITE DEMANDA // RESOLUCIÓN NOTIFICADA Y EJECUTORIADA - CON DEMANDA PRESENTADA EN FACATATIVA EL 12 DE OCTUBRE	LE CORRESPONDIÓ AL JUZGADO 50 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA

DATOS GENERALES DEL INMUEBLE			OBSERVACIONES JUNIO DE 2021	EN TRAMITE DE APELACIÓN DE SENTENCIA
NO.	NO. FICHA PREDIAL	NOMBRE PROPIETARIO		
78	ALMA-3-0134	REYNALDO AGUIRRE VARGAS ALEJANDRA AGUIRRE VARGAS MELKIN FERNANDO AGUIRRE VARGAS JOSE WILLIAM VARGAS	02-06-21 EN TRAMITES DE NOTIFICACIÓN // 16-04-21- SE LLEVÓ A CABO LA ENTREGA ANTICIPADA // 11-02-21- SE TRAMITÓ EL PAGO ANTE LA FIDUCIA // 09-02-2021- AUTO ADMITE DEMANDA // RESOLUCIÓN NOTIFICADA Y EJECUTORIADA - PRESENTADA EN FACATATIVA EL 19 DE OCTUBRE	
79	ALMA-3-0136	ACELLY QUINTERO DE MEDINA MARTHA QUINTERO DE OCHOA ALEJANDRO QUINTERO DE CASTRO HEREDEROS DE ARACELY CASTRO	05-04-21, NUEVAMENTE SE SOLICITO INFORMACIÓN A LOS JUZGADOS DE FACATATIVÁ ACERCA DE LA ESTA DEMANDA // PENDIENTE ADMISIÓN DE DEMANDA - CON DEMANDA PRESENTADA EN FACATATIVA EL 08 DE OCTUBRE DE 2020.	
80	ALMA-3-0147	ALVARO DUEÑEZ GONZALEZ ESPERANZA RIVAS	27-04-21 ACTA DE REPARTO CSJ (MP. TOLOSA) //05-04-21 JUZGADO DE BOGOTÁ NO AVOCA CONOCIMIENTO - REMITE A LA CORTE SUPREMA // 15-03-21-NUEVO REPARTO LE CORRESPONDIÓ AL JUZGADO 36 DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ // 11-11-2020 - RECHAZA DE PLANO LA DEMANDA, ORDENA REMITIR A BOGOTÁ	LE CORRESPONDIÓ AL JUZGADO 36 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA
81	ALMA-4-0003	JOSE CEFERINO TRUJILLO RUBIO (HEREDEROS)	31-05-21 AL DESPACHO // 12-03-21 - SE ALLEGARON NUEVAS CITACIONES A BOGOTÁ// 2-02-21- AUTO CORRIJE DATOS DE LAS NOTIFICACIONES// 04-03-2020 EN TRAMITES DE NOTIFICACIÓN PERSONAL //20/02/2020 - SE LLEVÓ A CABO LA DILIGENCIA DE ENTREGA ANTICIPADA //16/08/2019 AUTO ADMITE DEMANDA//	
82	ALMA-4-0011	RAFAEL REINA MAHECHA (HEREDEROS)	10-09-20- SE SOLICITARON OFICIOS PARA INSCRIBIR LA SENTENCIA // 12-03-2020- AUTO FIJA ENTREGA DEFINITIVA PARA EL DÌA 01-04-20// 20/02/2020 SE RADICA MEMORIAL SOLICITANDO ENTREGA DEFINITIVA//16/09/2019 AUTO SEÑALA FECHA Y HORA PARA SUSTENTACION DE AVALUO 14/11/2019/	
83	ALMA-4-0015	HEREDEROS DE LEOPOLDO AYALA TRIANA	28-05-21 SE SOLICITO IMPULSO PROCESAL //20-11-20- TIENE POR COTESTADA EXTEMPORANEAMENTE LA DEMANDA // 25-08-20 - TIENE POR ACEPTADO EL CARGO DEL CURADOR // 04-03-20- SE LLEVÓ A CABO LA DILIGENCIA DE ENTREGA ANTICIPADA// 19/11/2019 AUTO ORDENA ENTREGA ANTICIPADA//10/09/2019 TRAMIRE DE PAGO CONCESION//06/09/2019 AUTO ADMITE DEMANDA.	

DATOS GENERALES DEL INMUEBLE			OBSERVACIONES JUNIO DE 2021	EN TRAMITE DE APELACIÓN DE SENTENCIA
NO.	NO. FICHA PREDIAL	NOMBRE PROPIETARIO		
84	ALMA-4-0018	HEREDEROS DE CAMILO TRIANA OVIEDO Y SALOMON TRIANA.	EL JUZGADO APLAZÓ AUDIENCIA POR SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS//AUTO 15-04-21- SEÑALA AUDIENCIA INTERROGATORIO Y SENTENCIA PARA EL 09-06-21 // 16-02-2021- AUTO DECRETA ENTREGA ANTICIPADA PARA EL 09-03-21 // 01-09-20 FIJA FECHA PARA LLEVAR A CABO LA ENTREGA ANTICIPADA .	
85	ALMA-4-0020	HEREDEROS DE HERNANDO PALACIOS ACERO	28-05-21 SE SOLICITO IMPULSO PROCESAL // 20-11-20- TIENE POR COTESTADA EXTEMPORANEAMENTE LA DEMANDA // 01-07-20 AUTO DESIGNA CURADOR // 20/02/2020- SE RADICA MEMORIAL SOLICITANDO ENTREGA ANTICIPADA//22/08/2019 SE REALIZA PAGO Y APORTA EN EL JUZGADO //30/07/2019 TRAMITE PAGO CONCESION	
86	ALMA-4-0021	CARLOS EDISON BENITEZ	09-08-20 ORIP DE FACA DEVUELVE EL TRAMITE DE REGISTRO DE SENTENCIA (PENDIENTE DESARCHIVAR PROCESO) FOLIO ANI//10/06/2019 ENTREGA DEFINITIVA DEL PREDIO //21-02-2019 AUDIENCIA SUSTENTACION AVALUO 21 DE MAYO DE 2019	
87	ALMA-4-0022	LISANDRO BUITRAGO (FALLECIDO)	EL JUZGADO APLAZÓ AUDIENCIA POR SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS// 20-04-21 AUTO FIJA FECHA ENTREGA ANTICIPADA PARA EL 15 DE JUNIO DE 2021 // 01-07-20- AUTO FIJA NUEVA FECHA ENTREGA ANTICIPADA PARA 01-12-2020//14-/02/2019 AUTO ODENA ENTREGA ANTICIPADA PARA EL DÍA 21-05-20 //13/12/2019 TRAMITE PAGO CONCESION.	
88	ALMA-4-0023	LISANDRO BUITRAGO (FALLECIDO)	04-06-21 SE SOLICITA NOMBRAR CURADOR // 03-09-20 DADA LA VINCULACIÓN DE LOS HEREDEROS SE ESTÁN NOTIFICANDO EN BOGOTÁ// 22-02-2020- EN NOTIFICACION (EMPLAZAMIENTO)// 15/01/2019 ENTREGA ANTICIPADA//08/10/2019 AUTO ORDENA ENTREGA ANTICIPADA 15/01/2020/	
89	ALMA-4-0027	GABRIEL PUERTA PARRA Y SOCIEDAD PALMAR SANTA HELENA S.A. EN LIQUIDACION	22-06-21 SE SOLICITÓ AL JUZGADO DESVINCULAR A LA SAE// 14-05-21- NOTIFICACIÓN POR AVISO //02-09-20 SE RETOMARON NUEVAMENTE LAS LABORES DE NOTIFICACIÓN DADO QUE LAS ANTERIORES FIGURAN "NO RESIDE"// 04-03-2020- SE REMITIERON NOTIFICACION POR AVISO A LOS DEMANDADOS //02/10/2019 ENTREGA ANTICIPADA.	
90	ALMA-4-0028	A N T Y OTROS	19-04-21 SE RADICÓ EL PAGO EN EL JUZGADO // 06-03-21 TRAMITES DE PAGO // 04-12-20 AUTO ADMITE DEMANDA // 16-10-2020 EN EL JUZGADO DE	

DATOS GENERALES DEL INMUEBLE			OBSERVACIONES JUNIO DE 2021	EN TRAMITE DE APELACIÓN DE SENTENCIA
NO.	NO. FICHA PREDIAL	NOMBRE PROPIETARIO		
			GUADUAS RESOLUCIÓN NOTIFICADA Y DEMANDA PRESENTADA EL	
91	ALMA-4-0030	GABRIEL PUERTA PARRA Y LUIS GIOVANY CAICEDO TASCON	22-06-21 SE SOLICITÓ AL JUZGADO DESVINCULAR A LA SAE// 24-03-2021- SE INFORMÓ AL JUZGADO EL TRAMITE AL OFICIO // 12-01-21 SE SOLICITÓ AL JUZGADO CONMINAR LA ENTREGA DEFINITIVA DE PREDIO // 14-09-2020 SE SOLICITÓ AL JUZGADO FIJAR FECHA PARA FECHA DE SUSTENTACIÓN DE AVALÚO //	
92	ALMA-4-0032	A N T Y OTROS	19-04-21 SE RADICÓ EL PAGO EN EL JUZGADO // 16-03-21 AUTO ADMITE DEMANDA // 25-02-21- SE SUBSANÓ LA DEMANDA// 17-02-2021 AUTO INADMITE DEMANDA // DEMANDA PRESENTADA EL 11 DE DICIEMBRE EN EL JUZGADO DE GUADUAS	
93	ALMA-4-0034	SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES - FRISCO	29-04-21- SE SOLICITO FECHA PARA SENTENCIA // 07-09-20 SE SOLICITÓ IMPULSO PROCESAL EN EL SENTIDO DE TENER POR NOTIFICADA A LA ANT // 17-02-2020-EN NOTIFICACION POR AVISO//02/10/2019 ENTREGA ANTICIPADA//29/08/2019	
94	ALMA-4-0035	A N T Y OTROS	DEMANDA PRESENTADA EL 28-04-21 // RESOLUCIÓN NOTIFICADA Y EJECUTORIADA --EN TRAMITES DE NOTIFICACIÓN POR AVISO PARA NOTIFICAR LA RESOLUCIÓN DE EXPROPIACIÓN.	
95	ALMA-4-0046	JORGE ELIECER BUSTOS ORDOÑEZ (BAJO ADMINISTRACIÓN SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S - SAE)	23-07-20- ORDENA ENTREGA DE TITULOS A LA SAE// FOLIO ANI (307-38113)// 08/08/2019 SE LLEVA A CABO LA DILIGENCIA DE ENTREGA DEFINITIVA//07/05/19 AUDIENCIA DE SUSTENTACION DE AVALUO//31-01-2019- AUTO FIJA FECHA PARA SUSTENTACIÓN DE AVALÚO PARA EL 07 DE MAYO DE 2019.	
96	ALMA-4-0048	ODILIO SILVA QUIROGA (BAJO ADMINISTRACIÓN SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S - SAE)	23-07-20- ORDENA ENTREGA DE TITULOS A LA SAE// RADICADO EN ORIP ESPERA FOLIO ANI //3/10/2019 ENTREGA DEFINITIVA //24/09/2019 AUTO FIJA FECHA PARA ENTREGA DEFINITIVA EL DÍA 03-10-2019//21/08/2019 AUDIENCIA SUSTENTACION AVALUO SENTENCIA	
97	ALMA-4-0053	INPEC	27-05-21- SE SOLICITÓ IMPULSO PROCESAL // 18-09-20 SE NOTIFICÓ POR CORREO ELECTRÓNICO A LA ANT // 17-02-2020-EN NOTIFICACIONES POR AVISO //23/10/2019 ENTREGA ANTICIPADA//30/07/2019 AUTO FIJA FECHA PARA ENTREGA ANTICIPADA PARA EL 23-10-2019//	

DATOS GENERALES DEL INMUEBLE			OBSERVACIONES JUNIO DE 2021	EN TRAMITE DE APELACIÓN DE SENTENCIA
NO.	NO. FICHA PREDIAL	NOMBRE PROPIETARIO		
98	ALMA-4-0057	SOCIEDAD NIHLO & CIA S EN C.S.	19-04-21 SE RADICÓ EL PAGO EN EL JUZGADO // 03-03-2021 AUTO ADMITE DEMANDA (EN TRAMITES DE PAGO) DEMANDA PRESENTADA EL 15-12-2020 EN EL JUZGADO DE GUADUAS // RESOLUCION NOTIFICADA Y PENDIENTE EJECUTORIA	
99	ALMA-4-0061	VIAS Y CONSTRUCCIONES - VICON	19-05-21 REGISTRO DE LA SENTENCIA (FOLIO ANI) 06/02/2020 SE RADICA NUEVAMENTE PARA REGISTRO EN ORIP DE GUADUAS//ESPERANDO FOLIO ANI //02-09-2019- SE APORTA MEMORIAL INDICANDO AREA RESTANTE // 12/06/219 ORIP GUADUAS DEVUELVE TRAMITE DE REGISTRO DE SENTENCIA//04/04/19 SE SOLICITA REGISTRO DE SENTENCIA.	
100	ALMA-4-0063-1	HEREDEROS DE HERNANDO VERA VERGARA	02-04-21 SE SOLICITARON OFICIOS DE REGISTRO DE SENTENCIA // 04-02-2021 SE DICTÓ SENTENCIA EN FAVOR DE LA ANI// 13-01-21 SE LLEVÓ A CABO LA DILIGENCIA DE SUSTENTACIÓN DE AVALUO Y SE FIJO FECHA PARA LECTURA DE FALLO 04-02-21 // 19-11-2020 ASIGNA GASTOS DE CURADURÍA // 07-09-20-SE SOLICITÓ AL JUZGADO REQUERIR AL CURADOR.	
101	ALMA-4-0067	HEREDEROS DE ALFONSO TORRES RUDAS	21-04-21 - SE SOLICITÓ AUDIENCIA DE ENTREGA DEFINITIVA // 12-04-21 SE DICTÓ SENTENCIA EN FAVOR DE LA ANI // 01-02-2021 - SE LLEVÓ A CABO AUDIENCIA DE INTERROGATORIO Y ALEGATOS DE CONCLUSIÓN- FIJA FECHA SENTENCIA PARA EL 12-04-21 // 19-11-2020 ASIGNA GASTOS DE CURADURÍA // 04-09-20, CURADOR CONSTESTA DEMANDA -	
102	ALMA-4-0072	FRANKLIN ERICSON FORERO SOLANO, EINSTEIN ALBERTO FORERO SOLANO, DALTON ANDERSON FORERO SOLANO	28-04-2021 - MEMORIAL DESCORRE TRASLADO DEL RECURSO DE REPOSICIÓN // 17-02-2021- TIENE POR CONTESTADA LA DEMANDA POR PARTE DEL CURADOR // 19-11-2020 DESIGNA NUEVO CURADOR // 10-09-2020 - SE SOLICITÓ AL JUZGADO REQUERIR AL CURADOR // 01-07-20 NOMBRAN CURADOR //	
103	ALMA-4-0075	MARCO JULIO GOMEZ OROZCO	15-03-21- SE REMITIERON AVISOS AL PREDIO// 03-12-20- EN TRÁMITES DE NOTIFICACIÓN // 19-10-20 ENTREGA ANTICIPADA // 18-09-20- SE ADMITE DEMANDA (EN TRAMITE DE PAGO)// 06-07-20 SE PRESENTÓ DEMANDA VIRTUALMENTE EN EL JUZGADO DE GUADUAS	

DATOS GENERALES DEL INMUEBLE			OBSERVACIONES JUNIO DE 2021	EN TRAMITE DE APELACIÓN DE SENTENCIA
NO.	NO. FICHA PREDIAL	NOMBRE PROPIETARIO		
104	ALMA-4-0084	INVERSIONES ROBURLTDA- EN LIQUIDACION	21-05-21- SE SOLICITÓ AL JUZGADO NOMBRAR CURADOR // 09-09-20 - TRAMITES DE NOTIFICACION DE LA DEMANDA 12-03-2020-SE LLEVÓ A CABO LA DILIGENCIA DE ENTREGA ANTICIPADA// 16/01/2020 FIJA FECHA Y HORA PARA ENTREGA ANTICIPADA//11/12/2019 SE REALIZA PAGO Y SE APORTA EN EL JUZGADO//19/11/2019 TRAMITE PAGO CONCESION //14/11/2019 AUTO ADMITE DEMANDA.	
105	ALMA-4-0096-2	FENNEY CAÑON PINILLA Y FRANCISCO ARANGO PINILLA	21-05-21- SE SOLICITÓ AL JUZGADO NOMBRAR CURADOR // 03-12-20- EN TRÁMITES DE NOTIFICACIÓN // 19-10-20- ENTREGA ANTICIPADA // 10-09-20 AUTO FIJA FECHA DE ENTREGA ANTICIPADA PARA EL 19 DE OCTUBRE DE 2020 // 22/01/2020 TRAMITES PAGO CONCESION//16/01/2020 AUTO AMITE DEMANDA.	
106	ALMA-5-0069	MILLER MOLINA Y OTROS	23-06-21 SE SUBSANÓ LA DEMANDA // 15-06-21 AUTO INDAMITE DEMANDA //DEMANDA PRESENTADA EL 25-05-21 (PENDIENTE ADMISIÓN) // EN TRÁMITES DE ENVÍO DE AVISO // CITACIÓN PARA NOTIFICAR RESOLUCIÓN. -	
107	ALMA-5-0099	NELSON GONZALEZ TRIANA Y OTROS	21-06-21 EN TRAMITES DE NOTIFICACIÓN // 27-05-21- SE LLEVÓ A CABO LA DILIGENCIA DE EA // 19-02-21 AUTO ORDENA ENTREGA ANTICIPADA Y COMISIONA INSPECCIÓN DE POLICIA // 22-10-20 SE CONSIGNÓ EL TITULO EN EL JUZGADO // 25-09-20- ADMITE DEMANDA. 12-08-2020 - SE SUBSANÓ LA DEMANDA // 06-08-20202- AUTO INADMITE DEMANDA.	
108	ALMA-5-0102	CASTA AGROINDUSTRIAL GANADERA	10-06-21 AUTO REVOCA PARCIALMEMNTE // 05-02-21 SE PRESENTÓ RECURSO DE REPOSICIÓN //28-01-2020- AUTO ADMITE DEMANDA (NIEGA ENTREGA ANTICIPADA) // RESOLUCIÓN NOTIFICADA Y DEMANDA PRESENTADA EN EL JUZGADO DE LA DORADA EL 13 DE OCTUBRE DE 2020	
109	ALMA-5-0104	AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS	03-06-21 DEMANDA PRESENTADA // RESOULCIÓN EJECUTORIADA (EN ELABORACIÓN DE DEMANDA) 23-04-21 NOTIFICADA // EN TRÁMITES DE ENVÍO AVISO // CITACIÓN PARA NOTIFICAR RESOLUCIÓN.	

DATOS GENERALES DEL INMUEBLE			OBSERVACIONES JUNIO DE 2021	EN TRAMITE DE APELACIÓN DE SENTENCIA
NO.	NO. FICHA PREDIAL	NOMBRE PROPIETARIO		
110	ALMA-5-0117	SOCIEDAD AGROGANADERA MP S.A.S	JUZGADO 5 MUNICIPAL DE LA DORADA FIJA FECHA PARA EL 24 DE JUNIO DE 2021// AUTO 13-04-21 AUTO ORDENA COMISIONAR ENTREGA ANTICIPADA // 09-02-21 AUTO ADMITE DEMANDA (EN TRAMITES DE PAGO)//	
111	ALMA-5-0136	ELIZABETH ALDANA MUÑOZ	COMISIÓN DESIGNADA AL JUZGADO 04 MUNICIPAL DE GIRARDOT// AUTO 13-04-21 AUTO ORDENA COMISIONAR ENTREGA ANTICIPADA // 27-01-21 SE REQUIRIÓ NUEVAMENTE AL JUZGADO PARA LA ENTREGA ANTICIPADA // 25-11-20 SE REQUIRIÓ AL JUZGADO NUEVAMENTE LA ENTREGA ANTICIPADA /2722-09-20- SE RADICÓ EL PAGO EN EL JUZGADO PARA LA ENTREGA ANTICIPADA //	
112	ALMA-5-0200	JOSE MAHECHA HERNANDEZ (HEREDEROS)	09-04-21 AUTO NIEGA PRUEBAS SOLICITADAS POR LOS DEMANDADOS // 12-02-2021- AUTO CONCEDE RECURSO DE APELACIÓN // 11-DIC.-2020 AUTO NIEGA NULIDAD PROPUESTA // 29-10-20- NOS PRONUNCIAMOS FRENTE AL INCIDENTE// 05-10-20 SE DICTÓ SENTENCIA EN FAVOR DE LA ANI - LOS DEMANDOS APELARON.	REMITIDO AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUNDINAMARCA
113	ALMA-5-0212	OLINDA PINZON DE CRUZ	22-02-21- SE SOLICITÓ A LA ORIP EL REGISTRO DE LA SENTENCIA // 21-09-20, SE REITERÓ LA SOLICITUD DE EABORACIÓN DE OFICIOS EN EL JUZGADO// 06-03-20- SE SOLICITÓ LA ELABORACIÓN DE OFICIOS DE INSCIPCIÓN DE SENTENCIA //15/01/2020 ENTREGA DEFINITIVA.	
114	ALMA-5-0219	HERNAN BENITEZ TRIVIÑO	03-05-21 - AUTO REQUIERE AL FNA // 13-04-2 -AUTO NIEGA CONTROL DE LEGALIDAD PROPUESTO POR NUESTRA PARTE // 15-03-21- TRIBUNAL ORDENA NUEVO AVALUO (PRESENTAMOS OPOSICIÓN) // 04-08-2020 SE DICTÓ SENTENCIA EN FAVOR DE LA ANI (LA APODERADA DEL FNA APELÓ)// 10-03-20- FIJA FECHA PARA SUSTENTACIÓN DE AVALUO PARA EL DÌA 16 DE JUNIO DE 2020.	REMITIDO AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUNDINAMARCA
115	ALMA-5-0251	MARÍA BLANCA CARRANAZ DE CARRANZA	AUTO 29-04-21 FIJA FECHA PARA EL 07 DE JULIO DE 2021, AUDIENCIA DE INTERROGATORIO // 28-04-2021- SE ACREDITA AL JUZGADO LA NOTIFICACIÓN DE LA DEMANDADA // 16-04-21- SE NOTIFICA NUEVAMENTE A MARIA BLANCA CARRANZA // 05-02-21 AUTO REQUIERE CURADOR /	

DATOS GENERALES DEL INMUEBLE			OBSERVACIONES JUNIO DE 2021	EN TRAMITE DE APELACIÓN DE SENTENCIA
NO.	NO. FICHA PREDIAL	NOMBRE PROPIETARIO		
116	ALMA-5- 0251-1	MARÍA BLANCA CARRANAZ DE CARRANZA	08-06-21 EN TRAMITES DE NOTIFICACIÓN POR AVISO DE LA RESOLUCIÓN DE EXPROPIACIÓN. // EN TRAMITES DE NOTIFICACIÓN PERSONAL DE LA RESOLUCIÓN DE EXPROPIACIÓN.	
117	ALMA-5- 0252	INES OSORIO DE ENCISO Y OTROS	01-06-21 AL DESPACHO // 16-04-2020 SE ESTÁ EMPLAZANDO A LA SOCIEDAD ENCISO // 02-02-21- DEMANDA NOTIFICADA, EN TERMINOS DE CONSTESTACIÓN // 10-11-2020 - EN TRÁMITES DE NOTIFICACIÓN // 19-10-20- SE LLEVÓ A CABO LA DILIGENCIA DE ENTREGA ANTICIPADA.	
118	ALMA-5- 0276	MARIBEL PEREZ Y OTROS	02-06-21 SE RADICÓ DEMANDA // RESOLUCIÓN EJECUTORIADA (EN ELABORACIÓN DE DEMANDA) // 23-04-21 - NOTIFICADA // EN TRÁMITES DE ENVÍO DE AVISO // CITACIÓN PARA NOTIFICAR RESOLUCIÓN.	

2.4.8 GESTION DEL COMPONENTE SOCIAL

En la actualidad el concesionario realiza visitas de campo, con el objetivo de identificar posibles afectaciones de tipo social que puedan generarse por el desarrollo del proyecto, las cuales están siendo objeto de análisis para la posterior elaboración de los insumos respectivos.

A la fecha se han entregado a la interventoría los siguientes insumos sociales debidamente diligenciados:

Tabla 103 Gestión Social

Unidad Funcional	F16 Diagnostico Aprobado	F16 Diagnostico en ajuste	F16 Diagnostico entregado interventoría	Formularios F12 -F15 en Ajuste	Formularios F12 -F15 Revisados	Formularios F12 -F15 entregado a interventoría	En elaboración
UF 1	18	0	0	0	0	18	0
UF 2	144	0	0	0	0	144	0
UF 3	133	0	0	0	0	133	2
UF 4 (4.1)	6	0	0	0	0	6	0
UF 4 (4.2)	70	0	0	0	0	70	0
UF 5 (5.1)	81	0	0	0	0	81	5
UF 5 (5.2)	40	0	0	0	0	40	4
UF 5 (5.3)	0	0	0	0	0	0	2
UF 5 (5.4)	29	0	0	0	0	29	1
Subtotal	521	0	0	0	0	521	14

2.4.9 CARGUE DE INFORMACIÓN A LA PLATAFORMA OLYMPUS

A continuación, se observa el reporte actual de la gestión predial en el sistema:

Tabla 104. Reporte de Olympus.

PREDIOS CARGADOS EN PLATAFORMA OLYMPUS POR INSUMOS Y UNIDAD FUNCIONAL									Total de Predios en gestión
Unidad Funcional	En Estudio de Títulos	Con Ficha Predial	Con Uso de suelo cargado	Con Avalúo Aprobado	Predio con Ficha Social	Predio en Oferta	Predios con Escritura ANI	Predios sin cargar	
UF 1	0	0	4	0	1	0	13	0	18
UF 2	0	13	8	5	56	7	55	0	144
UF 3	4	6	10	2	25	14	74	0	135
UF 4	0	2	3	2	33	2	34	0	76
UF 5	14	16	12	6	85	5	24	0	162
Subtotal	18	37	37	15	200	28	200	0	535

En el cuadro y la gráfica siguiente nos refleja que se tienen cargados 347 permisos de intervención voluntaria suscritos, de los 535 predios totales del proyecto hasta la fecha, tal como se muestra a continuación del reporte de disponibilidad:

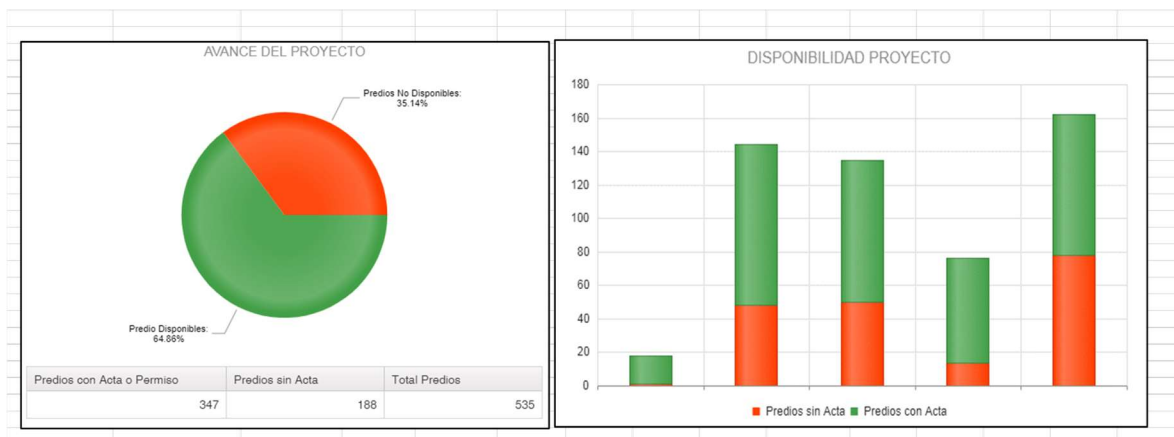


Ilustración 23 Disponibilidad cargada en Olympus.

Tabla 105. Tabla de predios con acta.

Unidad Funcional	Predios con acta	Predios sin Acta	Total predios
UF 1	17	1	18
UF 2	97	47	144
UF 3	85	50	135
UF 4	62	14	76
UF 5	86	76	162
TOTAL	347	188	535

Se aclara que se encuentran predios con permiso de intervención, pero la ficha predial se encuentra en elaboración en varios predios, por tanto, no es posible cargar los permisos de intervención que están pendientes para cargue en la plataforma Olympus ya que los predios se crean en el sistema partiendo del Estudio de Títulos y la ficha técnica que esté aprobado por la interventoría.

Tabla 106 Tabla resumen Olympus

INUSMOS	ESTADOS						
	CUMPLE	SIN CARGAR	NO REVISADO	EN REVISIÓN	NO CUMPLE	AVANCE	TOTAL
INTERVENTORIA E.T	412	0	31	0	92	77%	535
INTERVENTORIA F.P	378	18	27	36	76	71%	535
INTERVENTORIA U.D.S	365	56	78	0	36	68%	535
INTERVENTORIA A.V	348	97	22	11	57	65%	535
INTERVENTORIA F.S	345	170	9	4	7	64%	535

Dificultades con la plataforma:

- El reporte de la plataforma Olympus de sabana no refleja el estado real del cargue en cuanto a que el reporte indica el estado "NO REVISADO" para predios que no tienen información cargada, la dificultad es que no permite realmente conocer que está cargado y que se ha enviado para interventoría, de tal manera que si se quiere hacer un diagnóstico de gestión del cargue implicaría ingresar a cada uno de los predios y módulos a revisar si realmente ya se cargó información o fue enviada para revisión.
- Se tienen predios en los cuales se avanza hasta cargue de ficha social, al encontrar alguna observación en la ficha predial o avalúo genera que se tenga que realizar el cargue nuevamente desde ceros de todos los módulos del predio, es decir una nueva versión, por ejemplo: si se tiene un predio con ET- CUMPLE , FICHA PREDIAL - NO CUMPLE (con observación de linderos, lo cual no influye sobre los otros módulos posteriores), USO DE SUELO -CUMPLE, AVALÚO -CUMPLE, FICHA SOCIAL - CUMPLE, para poder subsanar dicho incumplimiento se debe generar una nueva versión y volver a cargar todos los módulos en los cuales ya se tenía la revisión de interventoría y el cumple, es decir genera el reproceso de cargar módulos en los cuales se tenía el CUMPLE y adicional a esto la interventoría debe volver a revisar información que ya había aprobado. Una solución podría ser implementar un botón de modificación para cada insumo, de tal manera que se pueda revisar y corregir cada uno de los módulos.
- Los permisos de intervención no se están guardando correctamente, el botón de guardar genera una larga espera y no se guarda la información cargada.
- El tiempo de inactividad en la sesión es muy corto y en algunos módulos genera reproceso debido a que se debe revisar información en físico, especialmente en la parte del avalúo donde los campos a ingresar son numerosos, los cuales dependen específicamente de lo avaluado en el predio.
- Al ingresar información de un avalúo que cuenta con fechas de vigencia anteriores al cargue, la plataforma no permite guardar parcialmente el avance, es decir solo permite guardar una sola y única vez, de tal manera que obliga a generar una nueva versión, esto ha generado re procesos para los avalúos con bastante información para cargar.

- Es necesario e indispensable generar la posibilidad de eliminar documentos en digital directamente desde nuestros usuarios, actualmente se debe recopilar un paquete de elementos a eliminar para realizar la solicitud, sin embargo, esto dificulta el envío nuevamente para revisión de interventoría.

2.4.10 CONSUMO PRESUPUESTAL SUBCUENTA

A la fecha de elaboración de este informe, el consumo de la subcuenta predial es el que se entrega como anexo al presente informe bajo el nombre “**Gestión Predial mayo 21.xlsx**”

Para el mes de junio de 2021 se realizaron pagos por un total de **\$ 2.447.953.633,89** pesos (Moneda legal colombiana) el cual corresponde a 27 predios gestionados.

Es importante tener en cuenta que los movimientos financieros de la subcuenta de predios van generando gravámenes financieros que se descuentan automáticamente del monto allí disponible; puede consultarse el detalle de esta información a la Fiduciaria.

De la información presentada se tienen 7 movimientos que no cuentan con OP, estos son los siguientes

PREDIO	FECHA	CONCEPTO	VALOR	GMF	UF
ALMA-2-0010		PRIMER PAGO PROMESA DE COMPRAVENTA	\$ 33 333 344.14	\$ 133 333.00	2
ALMA-2-0113			\$ 7 972 184.80		2
ALMA-2-0113			\$ 7 972 184.80		2
ALMA-1-0008	14/06/2018	REINTEGRO MAYOR GIRADO 19/05/2018 ALMA-1-0008	\$ (973 391.64)	\$ (3 894.00)	1
ALMA-5-0091	14/06/2018	REINTEGRO MAYOR GIRADO 07/10/2016 ALMA-5-0091	\$ (4 000.00)	\$ (16.00)	5
ALMA-5-0091	14/06/2018	REINTEGRO MAYOR GIRADO 07/10/2016 ALMA-5-0091	\$ (4 000.00)	\$ (16.00)	5
ALMA-5-0091	14/06/2018	REINTEGRO MAYOR GIRADO 07/10/2016 ALMA-5-0091	\$ (4 000.00)	\$ (16.00)	5

Como anexo a este informe se entregará la base de fiducia, la cual tiene la respectiva corroboración, la primera y segunda OP corresponden a un pago realizado por Fiducolombia y los otros 2 restantes corresponden a reintegros a la sub cuenta predial.

También se tienen casos en los cuales se tienen OP sin valor causado, esto se debe cheques y giros anulados.

FECHA DE PAGO	ORDEN	NUMERO DEL PREDIO SUJETO AL PAGO	VALOR BRUTO	RUBRO CONTABLE	UNIDAD FUNCIONAL
3/11/2015	292	ALMA-2-0114	\$ -	ADQUISICION Y COMPRA DE PREDIOS	2
3/11/2015	292	ALMA-2-0118	\$ -	ADQUISICION Y COMPRA DE PREDIOS	2
3/11/2015	292	ALMA-2-0119	\$ -	ADQUISICION Y COMPRA DE PREDIOS	2
26/01/2017	738	ALMA-4-0134	\$ -		5
30/03/2017	1053	ALMA-2-0135	\$ -		2
30/03/2017	1053	ALMA-2-0135	\$ -		2
30/03/2017	1053	ALMA-2-0135	\$ -		2
30/03/2017	1053	ALMA-2-0135	\$ -		2
30/03/2017	1053	ALMA-2-0135	\$ -		2
30/03/2017	1053	ALMA-2-0135	\$ -		2
30/03/2017	1053	ALMA-2-0135	\$ -		2
30/03/2017	1053	ALMA-2-0135	\$ -		2
27/04/2017	1277	ALMA-4-0151	\$ -		5
27/04/2017	1280	ALMA-4-0136	\$ -		5
17/05/2017	1289	ALMA-3-0102	\$ -	GASTOS NOTARIALES	3

FECHA DE PAGO	ORDEN	NUMERO DEL PREDIO SUJETO AL PAGO	VALOR BRUTO	RUBRO CONTABLE	UNIDAD FUNCIONAL
15/06/2017	1550	ALMA-4-0037	\$ -		4
15/06/2017	1558	ALMA-5-0088	\$ -	ADQUISICION Y COMPRA DE PREDIOS	5
10/07/2017	1584	ALMA-4-0144	\$ -		5
27/10/2017	2039	ALMA-5-0095	\$ -	GASTOS NOTARIALES	5
8/11/2017	2078	ALMA-2-0043	\$ -	GASTOS NOTARIALES	2
3/01/2018	2355	ALMA-2-0118-2	\$ -	ADQUISICION Y COMPRA DE PREDIOS	2
12/02/2018	2495	ALMA-2-0116	\$ -	ADQUISICION Y COMPRA DE PREDIOS	2
7/05/2018	2932	ALMA-3-0138	\$ -	GASTOS NOTARIALES	3
23/05/2018	3131	ALMA-2-0012	\$ -		2
23/05/2018	3136	ALMA-5-0223	\$ -		5
23/05/2018	3139	ALMA-4-0058	\$ -		4
23/05/2018	3140	ALMA-4-0059	\$ -		4
23/05/2018	3142	ALMA-5-0220	\$ -		5
23/05/2018	3142	ALMA-5-0220	\$ -		5
13/07/2018	3197	ALMA-3-0138	\$ -	GASTOS NOTARIALES	3
13/07/2018	3196	ALMA-3-0138	\$ -	GASTOS NOTARIALES	3
31/07/2018	3395	ALMA-3-0147	\$ -	GASTOS NOTARIALES	3

FECHA DE PAGO	ORDEN	NUMERO DEL PREDIO SUJETO AL PAGO	VALOR BRUTO	RUBRO CONTABLE	UNIDAD FUNCIONAL
31/07/2018	3395	ALMA-3-0147	\$ -	GASTOS NOTARIALES	3
17/09/2018	3695	ALMA-2-0006	\$ -	ADQUISICION Y COMPRA DE PREDIOS	2
17/09/2018	3695	ALMA-2-0006	\$ -	ADQUISICION Y COMPRA DE PREDIOS	2
17/09/2018	3695	ALMA-2-0006	\$ -	ADQUISICION Y COMPRA DE PREDIOS	2
17/09/2018	3695	ALMA-2-0006	\$ -	ADQUISICION Y COMPRA DE PREDIOS	2
17/09/2018	3695	ALMA-2-0006	\$ -	ADQUISICION Y COMPRA DE PREDIOS	2
17/09/2018	3695	ALMA-2-0006	\$ -	ADQUISICION Y COMPRA DE PREDIOS	2
25/10/2018	3972	ALMA-5-0206	\$ -		5
25/10/2018	3972	ALMA-5-0206	\$ -		5
25/10/2018	3972	ALMA-5-0206	\$ -		5
25/10/2018	3972	ALMA-5-0206	\$ -		5
6/11/2018	3980	ALMA-5-0110-3	\$ -		5
6/11/2018	3979	ALMA-5-0110-1	\$ -		5
2/11/2018	4006	ALMA-5-0097	\$ -	ADQUISICION Y COMPRA DE PREDIOS	5
9/11/2018	3997	ALMA-2-0160	\$ -	COMPENSACIONES SOCIOECONOMICAS	2
30/11/2018	4141	ALMA-3-0077	\$ -	GASTOS NOTARIALES	3
30/11/2018	4142	ALMA-3-0138	\$ -		3

FECHA DE PAGO	ORDEN	NUMERO DEL PREDIO SUJETO AL PAGO	VALOR BRUTO	RUBRO CONTABLE	UNIDAD FUNCIONAL
7/12/2018	4193	ALMA-3-0081	\$ -	GASTOS NOTARIALES	3
3/01/2019	4292	ALMA-5-0198	\$ -	COMPENSACIONES SOCIOECONOMICAS	5
11/03/2019	4761	ALMA-2-0121	\$ -	ADQUISICION Y COMPRA DE PREDIOS	2
8/03/2019	4760	ALMA-2-0120	\$ -	ADQUISICION Y COMPRA DE PREDIOS	2
22/03/2019	4843	ALMA-3-0111	\$ -	GASTOS NOTARIALES	3
2/04/2019	4924	ALMA-3-0104	\$ -	ADQUISICION Y COMPRA DE PREDIOS	3
4/06/2019	5292	ALMA-2-0008	\$ -		2
4/06/2019	5292	ALMA-2-0008	\$ -		2
4/06/2019	5310	ALMA-2-0120	\$ -		2
25/07/2019	5569	ALMA-3-0127	\$ -		3
25/07/2019	5569	ALMA-3-0127	\$ -		3
4/09/2019	5744	ALMA-4-0074	\$ -	ADQUISICION Y COMPRA DE PREDIOS	4
4/09/2019	5744	ALMA-4-0074	\$ -	ADQUISICION Y COMPRA DE PREDIOS	4
27/09/2019	5834	ALMA-2-0106-5	\$ -	ADQUISICION Y COMPRA DE PREDIOS	2
27/09/2019	5834	ALMA-2-0106-5	\$ -	ADQUISICION Y COMPRA DE PREDIOS	2
27/09/2019	5834	ALMA-2-0106-5	\$ -	ADQUISICION Y COMPRA DE PREDIOS	2
27/09/2019	5834	ALMA-2-0106-5	\$ -	ADQUISICION Y COMPRA DE PREDIOS	2

FECHA DE PAGO	ORDEN	NUMERO DEL PREDIO SUJETO AL PAGO	VALOR BRUTO	RUBRO CONTABLE	UNIDAD FUNCIONAL
18/10/2019	5923	ALMA-3-0122	\$ -		3
31/10/2019	5920	ALMA-2-0126	\$ -	ADQUISICION Y COMPRA DE PREDIOS	2
14/01/2020	6186	ALMA-5-0137	\$ -	GASTOS NOTARIALES	5
17/02/2020	6180	ALMA-2-0029	\$ -	ADQUISICION Y COMPRA DE PREDIOS	2
17/02/2020	6180	ALMA-2-0029	\$ -	ADQUISICION Y COMPRA DE PREDIOS	2
17/02/2020	6180	ALMA-2-0029	\$ -	ADQUISICION Y COMPRA DE PREDIOS	2
17/02/2020	6180	ALMA-2-0029	\$ -	ADQUISICION Y COMPRA DE PREDIOS	2
17/02/2020	6180	ALMA-2-0029	\$ -	ADQUISICION Y COMPRA DE PREDIOS	2
17/02/2020	6180	ALMA-2-0029	\$ -	ADQUISICION Y COMPRA DE PREDIOS	2
17/02/2020	6180	ALMA-2-0029	\$ -	ADQUISICION Y COMPRA DE PREDIOS	2
17/02/2020	6180	ALMA-2-0029	\$ -	ADQUISICION Y COMPRA DE PREDIOS	2
17/02/2020	6180	ALMA-2-0029	\$ -	ADQUISICION Y COMPRA DE PREDIOS	2

El concesionario está realizando mesa de trabajo con la Fiduciaria y se adquirieron compromisos para poder entregar en su totalidad las certificaciones de pagos en las mesas de trabajo pactadas con interventoría, es decir para los predios que cuentan con Folio ANI y no están sujetos a legalización de anticipos.

2.4.11 SALDO Y RENDIMIENTOS DE LA SUBCUENTA PREDIAL:

En consulta con la fiduciaria FIDUBOGOTA la subcuenta predial se tiene el siguiente saldo a la fecha del 30 de junio de 2021:

Tabla 107 Saldo de subcuenta predial

SALDO	
\$	33.559.454.921,25

Los rendimientos de la subcuenta para el mes de junio del año 2021 son:

Tabla 108 Rendimientos de la subcuenta predial

RENDIMIENTOS	
\$	45.513.093,00

2.4.12 PREDIOS PAGOS EN SU TOTALIDAD CERTIFICADOS POR FIDUCIA:

En consulta con la fiducia FIDUBOGOTA, se tiene los siguientes predios que se encuentran adquiridos y cuentan con sus certificados de fiducia como pagos en su totalidad.

Tabla 109 Predios pagos en su totalidad certificados por la Fiduciaria Banco de Bogotá

Unidad funcional	Pedio con oferta notificada	Pedio con oferta inscrita	Predios con promesa de compraventa	Predios Escriturados	Predios ANI	Pagos fiducia 100%
UF 1	18	18	17	17	17	16
UF 2	144	143	95	94	87	78
UF 3	134	134	115	111	95	92
UF 4 (4.1)	6	6	5	5	5	5
UF 4 (4.2)	70	70	53	51	47	46
UF 5 (5.1)	80	80	73	73	70	69
UF 5 (5.2)	44	43	37	37	36	32
UF 5 (5.3)	0	0	0	0	0	0
UF 5 (5.4)	29	29	19	19	19	18
Subtotal	525	523	414	407	376	356

2.4.13 VALOR ESTIMADO DE ADQUISICIÓN PREDIAL

El costo de adquisición aquí presentado es básicamente una estimación preliminar, ya que solo hasta que se efectúen la totalidad de avalúos comerciales corporativos, será posible determinar con precisión el valor de la adquisición predial; no obstante, conforme a la solicitud realizada por la Interventoría, se incluye esta información.

La estimación presentada se realizó considerando las siguientes premisas:

- El valor del terreno utilizado para la estimación corresponde al valor de las zonas homogéneas geoeconómicas y por cercanía para los casos en que no se tiene avalúo

aprobado; en los casos en los cuales si existe un avalúo se utiliza el valor de terreno aprobado.

- Para la proyección de la parte social, se asume el costo valor pagado y se proyecta los que está pendiente de avalúo aprobado.
- Para los imprevistos se asume 20% en los valores totales de los avalúos comerciales, los cuales se discriminan mediante el cálculo del daño emergente y lucro cesante, total de construcciones, construcciones anexas, mejoras, cultivos y especies y factores sociales y gastos por notariado beneficencia y registro.
- El ejercicio se actualizará mes a mes con los avalúos que vayan obteniendo aprobación registrados dentro de la sábana de avalúos.
- Se estima que los predios que se adquieran por enajenación voluntaria deben encontrarse pagos al 100% al 30 de junio de 2021, quedando pendiente para el segundo semestre del 2021, los pagos relacionados con los predios que se encuentren en trámite de expropiación judicial.
- Las fechas se modificaron en atención a que las oficinas de registro se están demorando un poco con la entrega de las escrituras inscriptas en los folios de matriculas

Tabla 110 Costo estimado de adquisición predial

UNIDAD FUNCIONAL	VALOR TERRENO	VALOR TERRENO REMANENTE	VALOR CONSTRUCCIONES	VALOR CONSTRUCCIONES ANEXAS	VALOR MEJORAS	VALOR CULTIVOS Y ESPECIES	VALOR DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	DAÑO EMERGENTE (GASTOS)	VALOR COMPENSACIONES	TOTAL
UF1	\$ 5,283,676,309.50	\$ -	\$ -	\$ 117,992,197.14	\$ 77,511,495.86	\$ 1,238,363,262.12	\$ 147,437,615.00	\$ 110,042,213.00	\$ 5,515,640.00	\$ 6,980,538,732.62
UF2	\$ 2,388,064,637.49	\$ 9,738,006.81	\$ 716,629,079.50	\$ 517,118,773.36	\$ 1,260,533,480.78	\$ 208,970,317.68	\$ 96,091,300.00	\$ 113,745,889.90	\$ 1,827,034,734.00	\$ 7,137,926,219.52
UF3	\$ 1,356,042,380.53	\$ 26,678,600.48	\$ 1,427,411,918.41	\$ 345,703,047.99	\$ 1,075,406,270.04	\$ 472,847,000.00	\$ 7,122,498.50	\$ 98,289,852.99	\$ 413,552,756.90	\$ 5,223,054,325.84
UF4	\$ 2,050,938,125.30	\$ 59,419,082.52	\$ 143,898,325.80	\$ 384,376,920.70	\$ 103,782,205.00	\$ 218,698,641.30	\$ 3,386,801.00	\$ 82,426,589.38	\$ 57,256,914.00	\$ 3,104,183,605.00
UF5	\$ 11,150,443,728.50	\$ 159,739,381.00	\$ 4,882,472,935.90	\$ 871,384,399.79	\$ 1,140,871,098.00	\$ 417,147,416.92	\$ 19,703,282.25	\$ 255,359,509.97	\$ 2,244,097,532.00	\$ 21,141,219,284.33
PROVISIONES POR IMPREVISTOS	\$ 4,445,833,036.26	\$ 51,115,014.16	\$ 1,434,082,451.92	\$ 447,315,067.80	\$ 713,620.94	\$ 511,205,327.60	\$ 54,748,299.35	\$ 131,972,811.05	\$ 909,491,515.38	\$ 7,986,477,144.46
SUBTOTAL	\$ 26,674,998,217.58	\$ 306,690,084.97	\$ 8,604,494,711.53	\$ 2,683,890,406.78	\$ 3,658,818,170.62	\$ 3,067,231,965.62	\$ 328,489,796.10	\$ 791,836,866.29	\$ 5,456,949,092.28	\$ 51,573,399,311.77
TOTAL										\$ 51,573,399,311.77

2.5 GESTIÓN DE SEGURIDAD SST

2.5.1 LISTADO DE PERSONAL

Tabla 111 Listado de empresas contratistas

No	EMPRESA	JUNIO	ACTIVIDAD
1	CONCESION ALTO MAGDALENA S.A.S.	288	CONTRATO DE CONCESIÓN
2	CONSORCIO DE CONSTRUCCION Y DISEÑOS ALTO MAGDALENA.	5	DISEÑO Y CONSTRUCCION
3	SISMEDICA LTDA.	29	ATENCION MEDICA
4	MECO INFRAESTRUCTURA S.A.	45	CONSTRUCCIÓN
5	VASCO SECURITY GROUP	27	VIGILANCIA FÍSICA
6	UNIÓN TEMPORAL (SIEMENS)	4	CONSTRUCCION
7	ECO-PLANNING	7	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
8	CUMPLIMIENTO AMBIENTAL	5	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
9	SAYA	2	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
10	CESVI COLOMBIA	1	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
11	EHU	2	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
12	ZERONINE	3	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
13	GEOTECNIA	3	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
14	MGM INGENIERIA	7	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
15	QVA INGENIERIA	10	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
16	COPOLSA	21	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
17	FTS TECNOLOGIA	2	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
18	PROMETALICOS	6	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
19	SEÑALIZACION GIROD	3	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
TOTAL EMPRESAS		470	

Se aclara que a la fecha el proyecto se encuentra en fase de Operación y mantenimiento; si existen actividades constructivas, son aquellas derivadas de obligaciones que se encuentran pendientes.

2.5.2 REVISIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

El Concesionario realizado la revisión del pago de seguridad social del personal vinculado al proyecto. Las planillas de pago de seguridad social están disponibles en la oficina de la Concesión Alto Magdalena S.A.S., y serán entregadas en el informe de seguridad social y pagos de salarios.

2.5.3 INDUCCIONES

Para el presente periodo se presentaron 41 ingresos, a los cuales se les realizó la respectiva inducción en SST (ver anexo 1)

Tabla 112 Ingresos

EMPRESA	N° INGRESOS
COPOLSA	18

EMPRESA	N° INGRESOS
FTS TECNOLOGIA	2
PROMETALICOS	6
ALMA	8
GEOTECNIA Y CIMENTACIONES	4
SEÑALIZACION GIROD	3
TOTAL	41

2.5.4 EXAMENES MÉDICOS

Tabla 113 Exámenes médicos

MES	INDICE DE EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES		
	Numero trabajadores aptos	Numero trabajadores evaluados	Índice mensual
JUN	41	41	100%

2.5.5 CHARLAS SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El Concesionario implemento un programa de charlas de cinco minutos enfocado principalmente a sensibilizar y concienciar a sus colaboradores y partes interesadas en la prevención y mitigación del COVID-19.

Como parte de las mejoras implementadas en el SGSST y buscando que la charla llegara al 100% del personal, se desarrollo a traves de una aplicación un video educativo el cual explica de forma ilustrativa la charla que se brinda día a día. Compartimos algunos de estos videos para su conocimiento en el anexo 2 del presente informe.

Tabla 114 Programa de Charlas Concesionario

	PROGRAMACIÓN CHARLAS 5 MIN														
	SEMANA 21										SEMANA 22				
	01-jun	02-jun	03-jun	04-jun	05-jun	06-jun	07-jun	08-jun	09-jun	10-jun	11-jun	12-jun	13-jun	14-jun	15-jun
	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P
Diez factores humanos que causan accidentes	P	E													
Errores frecuentes con el uso del tapabocas			P	E											
¡Cuidado con la radiación solar!				P	E										

	PROGRAMACIÓN CHARLAS 5 MIN																													
	SEMANA 21															SEMANA 22														
	01- jun	02- jun	03- jun	04- jun	05- jun	06- jun	07- jun	08- jun	09- jun	10- jun	11- jun	12- jun	13- jun	14- jun	15- jun	09- jun	10- jun	11- jun	12- jun	13- jun	14- jun	15- jun	09- jun	10- jun	11- jun	12- jun	13- jun	14- jun	15- jun	
	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E
Recordemos la desinfección de vehículos, motocicletas y bicicletas.							P	E																						
¡Usted y la seguridad!								P	E																					
Recomendaciones al llegar a casa										P	E																			
La protección en los pies												P	E																	
Recordemos las medidas de bioseguridad en el protocolo de la organización													P	E																
Lesiones causadas por movimientos repetitivos														P	E															
Recomendaciones para uso de gel antibacterial															P	E														
¿Sabes cuales con tus riesgos?																P	E													
Recordemos el uso y desinfección de tapabocas																				P	E									
Cuidado con el sedentarismo																					P	E								
Uso de elementos de bioseguridad																												P	E	
Primeros auxilios																													P	E

	PROGRAMACIÓN CHARLAS 5 MIN																													
	SEMANA 23															SEMANA 24														
	16- jun	17- jun	18- jun	19- jun	20- jun	21- jun	22- jun	23- jun	24- jun	25- jun	26- jun	27- jun	28- jun	29- jun	30- jun	24- jun	25- jun	26- jun	27- jun	28- jun	29- jun	30- jun	1- jul	2- jul	3- jul	4- jul	5- jul	6- jul		
	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E		
Limpieza y desinfeccion en la vivienda	P	E																												

	PROGRAMACIÓN CHARLAS 5 MIN																													
	SEMANA 23															SEMANA 24														
	16-jun	17-jun	18-jun	19-jun	20-jun	21-jun	22-jun	23-jun	24-jun	25-jun	26-jun	27-jun	28-jun	29-jun	30-jun	1-jun	2-jun	3-jun	4-jun	5-jun	6-jun	7-jun	8-jun	9-jun	10-jun	11-jun	12-jun	13-jun	14-jun	15-jun
	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P
Cuidado con los cables electricos en el suelo		P	E																											
Distanciamiento social			P	E																										
¿Qué tanto sabemos de protección personal?				P	E																									
Adopte medidas de higiene respiratoria					P	E																								
Algunas razones para no fumar						P	E																							
Cómo hablar con los niños sobre el coronavirus							P	E																						
Corrija los errores pequeños antes de que crezcan								P	E																					
Reporte de condiciones de seguridad antes de salir de su vivienda									P	E																				
Los beneficios de la actividad física										P	E																			
Recomendaciones para contener el avance de enfermedades respiratorias											P	E																		
La seguridad con los ojos												P	E																	
Recordemos las medidas de prevención con adultos mayores													P	E																
La protección de las vías respiratorias														P	E															
Adecuado uso y limpieza de telefonos																												P	E	

Tabla 115 Charla

FECHA	TEMA DE CHARLAS	EMPRESA	ASISTENTES	TIEMPO
1/06/2021	Diez factores humanos que causan accidentes	CONCESION ALTO MAGDALENA	68	10
2/06/2021	Errores frecuentes con el uso del tapabocas	CONCESION ALTO MAGDALENA	76	10

FECHA	TEMA DE CHARLAS	EMPRESA	ASISTENTES	TIEMPO
3/06/2021	¡Cuidado con la radiación solar!	CONCESION ALTO MAGDALENA	80	10
4/06/2021	Recordemos la desinfección de vehículos, motocicletas y bicicletas.	CONCESION ALTO MAGDALENA	64	10
5/06/2021	¡Usted y la seguridad!	CONCESION ALTO MAGDALENA	56	10
6/06/2021	Recomendaciones al llegar a casa	CONCESION ALTO MAGDALENA	41	10
7/06/2021	La protección en los pies	CONCESION ALTO MAGDALENA	50	10
8/06/2021	Recordemos las medidas de bioseguridad en el protocolo de la organización	CONCESION ALTO MAGDALENA	75	10
9/06/2021	Lesiones causadas por movimientos repetitivos	CONCESION ALTO MAGDALENA	81	10
10/06/2021	Recomendaciones para uso de gel antibacterial	CONCESION ALTO MAGDALENA	79	10
11/06/2021	¿Sabes cuáles con tus riesgos?	CONCESION ALTO MAGDALENA	55	10
12/06/2021	Recordemos el uso y desinfección de tapabocas	CONCESION ALTO MAGDALENA	61	10
13/06/2021	Cuidado con el sedentarismo	CONCESION ALTO MAGDALENA	31	10
14/06/2021	Uso de elementos de bioseguridad	CONCESION ALTO MAGDALENA	51	10
15/06/2021	Primeros auxilios	CONCESION ALTO MAGDALENA	66	10
16/06/2021	Limpieza y desinfección en la vivienda	CONCESION ALTO MAGDALENA	58	10
17/06/2021	Cuidado con los cables eléctricos en el suelo	CONCESION ALTO MAGDALENA	65	10
18/06/2021	Distanciamiento social	CONCESION ALTO MAGDALENA	63	10
19/06/2021	¿Qué tanto sabemos de protección personal?	CONCESION ALTO MAGDALENA	53	10
20/06/2021	Adopte medidas de higiene respiratoria	CONCESION ALTO MAGDALENA	36	10
21/06/2021	Algunas razones para no fumar	CONCESION ALTO MAGDALENA	67	10
22/06/2021	Cómo hablar con los niños sobre el coronavirus	CONCESION ALTO MAGDALENA	56	10
23/06/2021	Corrija los errores pequeños antes de que crezcan	CONCESION ALTO MAGDALENA	57	10
24/06/2021	Reporte de condiciones de seguridad antes de salir de su vivienda	CONCESION ALTO MAGDALENA	60	10
25/06/2021	Los beneficios de la actividad física	CONCESION ALTO MAGDALENA	55	10
26/06/2021	Recomendaciones para contener el avance de enfermedades respiratorias	CONCESION ALTO MAGDALENA	53	10
27/06/2021	La seguridad con los ojos	CONCESION ALTO MAGDALENA	57	10
28/06/2021	Recordemos las medidas de prevención con adultos mayores	CONCESION ALTO MAGDALENA	41	10
29/06/2021	La protección de las vías respiratorias	CONCESION ALTO MAGDALENA	40	10
30/06/2021	Adecuado uso y limpieza de teléfonos	CONCESION ALTO MAGDALENA	34	10
02/06/2021	Charla: seguridad vial, uso de elementos de canalización	CONCESION ALTO MAGDALENA	19	15

FECHA	TEMA DE CHARLAS	EMPRESA	ASISTENTES	TIEMPO
04/06/2021	Socializacion lección aprendida golpe por proyeccion de objetos.	CONCESION ALTO MAGDALENA	18	15
04/06/2021	Pausas activas, postura ideal, entrega de elementos ergonomicos	CONCESION ALTO MAGDALENA	5	20
11/06/2021	Recordemos las medidas de prevencion:distanciamiento, lavado de manos, uso de tapabocas y reporte de condiciones	CONCESION ALTO MAGDALENA	24	20
11/06/2021	Socializacion lección aprendida golpe o contucion en manos, uso de epps, cuidado de manos	CONCESION ALTO MAGDALENA	11	20
18/06/2021	¡Dile sí a la vacuna! Aplicación de encuesta	CONCESION ALTO MAGDALENA	56	15
25/06/2021	Identificación de peligros en actividades de almacen, prevencion de accidentes, uso de EPP	CONCESION ALTO MAGDALENA	1	15
28/06/2021	Socialización medidas de prevencion frente al covid-19, lavado de manos,distanciamiento, prohibido comer en oficina	CONCESION ALTO MAGDALENA	16	15
28/06/2021	Sencibilizacion camillage, medio de transporte.	CONCESION ALTO MAGDALENA	16	30
29/06/2021	Aseguramiento de escenas en caso de accidente	CONCESION ALTO MAGDALENA	8	30
30/06/2021	Trabajo seguro en alturas, kit de rescate	CONCESION ALTO MAGDALENA	2	240
01/06/2021	Concentraciones en la vía, con tráfico y conductores irresponsables.	MECO	30	15
03/06/2021	Instalación adecuada del kit de aproximación.	MECO	30	10
04/06/2021	Levantamientos de cargas, manuales y mecánicas.	MECO	30	10
05/06/2021	Preoperacional de maquinaria equipos y herramientas	MECO	30	15
08/06/2021	Importancia del cuidado y bienestar de salud y ambiental	MECO	30	15
09/06/2021	Uso obligatorio de elementos de la protección, lúdica y compartida de refrigerio.	MECO	30	15
11/06/2021	Kit de aproximación, día internacional de seguridad vial.	MECO	30	15
17/06/2021	Ambiental buena disposición de residuos, punto ecológico campaña de orden y aseo.	MECO	30	15
18/06/2021	Cuidados físicos y cuidados de materiales y equipos.	MECO	30	15
24/06/2021	Encuesta plan estratégico de seguridad vial de forma virtual.	MECO	30	15
25/06/2021	Cuidado de la fauna y la flora	MECO	30	15
26/06/2021	Gestión integral del riesgo vial.	MECO	30	15
28/06/2021	Respeto entre compañeros, tolerancia, cultura y responsabilidad al momento de manejar indiferencias.	MECO	30	15
30/06/2021	Instalación adecuada del kit de aproximación.	MECO	30	15
15/06/2021	Inspección del área de trabajo	MGM	5	10
16/06/2021	Manipulación de cargas	MGM	5	10
17/06/2021	Procedimiento de Alturas	MGM	2	10

FECHA	TEMA DE CHARLAS	EMPRESA	ASISTENTES	TIEMPO
18/06/2021	Diagnóstico de condiciones de salud	MGM	2	10
22/06/2021	Importancia del ayudador en Alturas	MGM	2	10
23/06/2021	Cuidado de manos	MGM	2	10
07/06/2021	Riesgo químico	CUMPLIMIENTO AMBIENTAL	2	10
08/06/2021	Primeros auxilios	CUMPLIMIENTO AMBIENTAL	2	10
09/06/2021	Uso adecuado de EEP	CUMPLIMIENTO AMBIENTAL	2	10
10/06/2021	Riesgo Físico	CUMPLIMIENTO AMBIENTAL	2	10
11/06/2021	Golpe de calor	CUMPLIMIENTO AMBIENTAL	2	10
12/06/2021	Fatiga por excep de trabajo	CUMPLIMIENTO AMBIENTAL	2	10
14/06/2021	Riesgo Físico	CUMPLIMIENTO AMBIENTAL	2	10
15/06/2021	Reporte de accidente o incidente	CUMPLIMIENTO AMBIENTAL	2	10
16/06/2021	Incidente laborales	CUMPLIMIENTO AMBIENTAL	2	10
17/06/2021	Riesgo biológico	CUMPLIMIENTO AMBIENTAL	2	10
18/06/2021	Riesgo biomecánico	CUMPLIMIENTO AMBIENTAL	2	10
19/06/2021	Riesgo en alturas	CUMPLIMIENTO AMBIENTAL	2	10
Junio 07/2021	Uso de EPP	COPOLSA	16	10
Junio 08/2021	Socialización ATS	COPOLSA	16	10
Junio 09/2021	Recolección de residuos	COPOLSA	16	10
Junio 10/2021	Incidente y accidente laboral	COPOLSA	16	10
Junio 11/2021	Equipos para la atención de emergencia	COPOLSA	16	10
Junio 12/2021	Prevención covid – 19	COPOLSA	16	10
Junio 15/2021	Orden y aseo	COPOLSA	16	10
Junio 16/2021	Enfermedad general y enfermedad laboral	COPOLSA	14	10
Junio 17/2021	Tareas de alto riesgo	COPOLSA	14	10
Junio 18 /2021	Reporte de condiciones de salud	COPOLSA	15	10
Junio 19 /2021	Correcto uso de tapabocas	COPOLSA	16	10
Junio 21/2021	Socialización ATS	COPOLSA	13	10
Junio 22/2021	Reporte de incidentes y accidentes laborales	COPOLSA	13	10
Junio 23/2021	Golpe de calor	COPOLSA	13	10
Junio 24/2021	Protección a la flora y fauna	COPOLSA	13	10
Junio 25/2021	Tipos de señales de prevención	COPOLSA	14	10
Junio 26/2021	Acto y condición insegura	COPOLSA	14	10
Junio 28/2021	Peligro y riesgo	COPOLSA	13	10
Junio 29/2021	Cuidar y preservar los EPP	COPOLSA	15	10
Junio 30/2021	Reglas básicas de seguridad	COPOLSA	16	10

FECHA	TEMA DE CHARLAS	EMPRESA	ASISTENTES	TIEMPO
03/06/2021	Al salir de vivienda	SISMEDICA	4	10
03/06/2021	Al salir de vivienda	SISMEDICA	5	10
04/06/2021	Al salir de vivienda	SISMEDICA	4	10
06/06/2021	Como lidiar con el stres durante COVID-19	SISMEDICA	4	10
06/06/2021	Como lidiar con el stres durante COVID-19	SISMEDICA	5	10
07/06/2021	Cerco epidemiológico	SISMEDICA	4	10
07/06/2021	Cerco epidemiológico	SISMEDICA	5	10
08/06/2021	Lavado de manos	SISMEDICA	5	10
08/06/2021	Diferencia entre aislamiento y cuarentena	SISMEDICA	5	10
09/06/2021	Recomendaciones para aislamiento preventivo	SISMEDICA	4	15
09/06/2021	Recomendaciones para aislamiento preventivo	SISMEDICA	5	15
10/06/2021	Semaforizacion COVID-19	SISMEDICA	4	15
10/06/2021	Semaforizacion COVID-19	SISMEDICA	5	15
11/06/2021	Medidas preventivas en caso sospechoso de covid	SISMEDICA	4	15
11/06/2021	Medidas preventivas en caso sospechoso de covid	SISMEDICA	5	15
12/06/2021	REGALAS DE DISTANCIAMIENTO físico	SISMEDICA	4	15
12/06/2021	REGALAS DE DISTANCIAMIENTO físico	SISMEDICA	4	15
13/06/2021	Recomendaciones con el agua para el consumo Humano	SISMEDICA	5	15
14/06/2021	Manejo de los recursos tiempos de COVID-19	SISMEDICA	3	15
14/06/2021	Manejo de los recursos tiempos de COVID-19	SISMEDICA	4	15
15/06/2021	Medidas preventivas en el transporte público	SISMEDICA	4	15
15/06/2021	Medidas preventivas en el transporte público	SISMEDICA	5	15
16/06/2021	Medidas preventivas caso sospechoso y confirmado	SISMEDICA	3	15
16/06/2021	Medidas preventivas caso sospechoso y confirmado	SISMEDICA	5	15
17/06/2021	Al dirigirse al trabajo	SISMEDICA	4	15
18/06/2021	Buen uso del tapabocas	SISMEDICA	4	15
18/06/2021	Lavado de manos	SISMEDICA	5	15
19/06/2021	Uso de gel antibacterial	SISMEDICA	4	15
19/06/2021	Aplicación de gel antibacterial	SISMEDICA	5	15
20/06/2021	Importancia del aislamiento	SISMEDICA	4	15
21/06/2021	Uso higiene epi	SISMEDICA	4	15
21/06/2021	Uso higiene epi	SISMEDICA	5	15
22/06/2021	Sintomatología	SISMEDICA	5	15
22/06/2021	Sintomatología	SISMEDICA	4	15
23/06/2021	Autocuidado	SISMEDICA	4	15

FECHA	TEMA DE CHARLAS	EMPRESA	ASISTENTES	TIEMPO
23/06/2021	Autocuidado	SISMEDICA	5	15
24/06/2021	Limpieza y desinfección de áreas comunes	SISMEDICA	4	15
26/06/2021	Refuerzo medias preventivas	SISMEDICA	4	15
27/06/2021	Refuerzo medias preventivas	SISMEDICA	4	15
27/06/2021	Uso correcto de tapabocas	SISMEDICA	5	15
28/06/2021	Saludo y distanciamiento	SISMEDICA	4	15
28/06/2021	Como evitamos la propagación del covid-19	SISMEDICA	4	15
TOTAL			2845	1900

Para este mes se invirtieron 1900 minutos en charlas de seguridad y salud en el trabajo en temas relacionados con el COVID-19 y actividades seguras.

		REGISTRO FOTOGRAFICO		F-08-03	
				Versión: 04	
				Fecha: 01-04-2016	
PROYECTO VIAL GIRARDOT HONDA PUERTO SALGAR				UF No. 4	HOJA 1 DE 17
REGISTRO FOTOGRAFICO					
					
FOTOGRAFIA N°:		1		FECHA 08/06/2021	
LUGAR:		Corredor vial			
DESCRIPCION:		Charla de 5 minutos			

	REGISTRO FOTOGRAFICO		F-08-03
			Versión: 04
			Fecha: 01-04-2016
PROYECTO VIAL GIRARDOT HONDA PUERTO SALGAR		UF No. 4	HOJA 2 DE 17
REGISTRO FOTOGRAFICO			
			
FOTOGRAFIA N°:	2	FECHA: 03/06/2021	
LUGAR:	CCO		
DESCRIPCION:	Charla de cinco minutos		

2.5.6 CAPACITACIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Para el presente mes se realizaron 21 capacitaciones al personal vinculado al proyecto y se invirtieron 3000 minutos en esta actividad. (Ver anexo 3)

Tabla 116 Capacitaciones

FECHA	TEMA DE CAPACITACIÓN	EMPRESA	ASISTENCIA	TIEMPO
01/06/2021	Sencibilización PMT y señalización vial	CONCESION ALTO MAGDALENA	31	480
17/06/2021	Capacitación higiene postural	CONCESION ALTO MAGDALENA	1	60
21/06/2021	Capacitación higiene postural	CONCESION ALTO MAGDALENA	1	60
22/06/2021	Capacitación higiene postural	CONCESION ALTO MAGDALENA	2	60

FECHA	TEMA DE CAPACITACIÓN	EMPRESA	ASISTENCIA	TIEMPO
23/06/2021	Capacitación higiene postural	CONCESION ALTO MAGDALENA	4	60
28/06/2021	Capacitación a Brigadas de emergencia, Camillage, metodos de transporte, evacuacion de pacientes	CONCESION ALTO MAGDALENA	5	480
29/06/2021	Capacitación a Brigadas de emergencia, Camillage, metodos de transporte, evacuacion de pacientes	CONCESION ALTO MAGDALENA	23	480
21/06/2021	Trabajo seguro en alturas, manejo de kit de rescate y procedimiento de rescate	CONCESION ALTO MAGDALENA	13	480
15-06-2021	Re Inducción en SG-SST, protocolo de bioseguridad COVID-19	CUMPLIMIENTO AMBIENTAL	2	120
30/06/2021	Trabajo en equipo	COPOLSA	16	60
10/06/2021	Definiciones, brigadistas, compromisos, responsabilidades para la postulación de brigadistas.	MECO	23	60
12/06/2021	Sistema de vigilancia epidemiologicas pve: auditivo	MECO	23	60
15/06/2021	Silicosis, sílice labores que se realizan con presencia de sílice.	MECO	28	60
16/06/2021	Como levantar peso adecuadamente y beneficios de las pausas activas.	MECO	25	60
28/06/2021	Cumplimiento de las normas de tránsito.	MECO	3	60
28/06/2021	Compactación de mezcla asfáltica.	MECO	5	60
29/06/2021	Actor vial comportamientos seguros conductor, pasajero, ciclista, peatón, trabajador y pasajero.	MECO	25	60
29/06/2021	Programa de seguridad del paciente	SISMEDICA	4	60
30/06/2021	RCP en pandemia	SISMEDICA	4	60
23/06/2021	Gestión de riesgos y desastres	SISMEDICA	3	60
29/06/2021	Primeros auxilios psicológicos	SISMEDICA	7	60
TOTAL			248	3000

2.5.7 INDICADORES DE SST

En cumplimiento la resolución 0312 del 2019 por la cual se definen los estándares mínimos del Sistema Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, a continuación, se presentan los indicadores a los cuales se les hace medición de forma mensual.

2.5.7.1 Cobertura de capacitacion

Mide la cantidad de personas que participaron en la capacitación/el total del personal programado.

Tabla 117 Cobertura de capacitación

MES	EMPRESA	ÍNDICE DE COBERTURA		
		PROMEDIO ASISTENTES	TOTAL POBLACION	INDICE DE COBERTURA
JUN	Sencibilizacion PMT y señalizacion vial	31	50	62%
	Capacitacion higiene postural	1	1	100%
	Capacitacion higiene postural	1	1	100%
	Capacitacion higiene postural	2	2	100%
	Capacitacion higiene postural	4	4	100%
	Capacitación a Brigadas de emergencia, Camillage, metodos de transporte, evacuacion de pacientes	5	5	100%
	Capacitación a Brigadas de emergencia, Camillage, metodos de transporte, evacuacion de pacientes	23	23	100%
	Trabajo seguro en alturas, manejo de kit de rescate y procedimiento de rescate	13	13	100%
	Re Inducción en SG-SST, protocolo de bioseguridad COVID-19	2	2	100%
	Trabajo en equipo	16	18	88.89%
	Definiciones, brigadistas, compromisos, responsabilidades para la postulacion de brigadistas.	23	45	51.1%
	Sistema de vigilancia epidemiologicas pve: auditivo	23	45	51.1%
	Silicosis, sílice labores que se realizan con presencia de sílice.	28	45	62.2%
	Como levantar peso adecuadamente y beneficios de las pausas activas.	25	45	55.5%
	Cumplimiento de las normas de tránsito.	3	45	6.7%
	Compactación de mezcla asfáltica.	5	45	11.1%
	Actor vial comportamientos seguros conductor, pasajero, ciclista, peatón, trabajador y pasajero.	25	45	55.5%
	Programa de seguridad del paciente	4	4	100%
	RCP en pandemia	4	4	100%
	Gestión de riesgos y desastres	3	5	60%
	Primeros auxilios psicológicos	7	10	70%

2.5.7.2 INDICÉ DE FRECUENCIA

Número de veces que ocurre un accidente de trabajo en el mes.

Fórmula: (Número de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes / Número de trabajadores en el mes) * 100

Tabla 118 Frecuencia de accidentalidad

MES	ÍNDICE DE FRECUENCIA DE ACCIDENTE DE TRABAJO		
	N° de AT	No Trabajadores en el Mes	Resultado
ENE	0	420	0
FEB	2	429	0.46
MAR	1	442	0.22
ABR	5	432	1.16
MAY	8	438	1.83
JUN	2	470	0.85

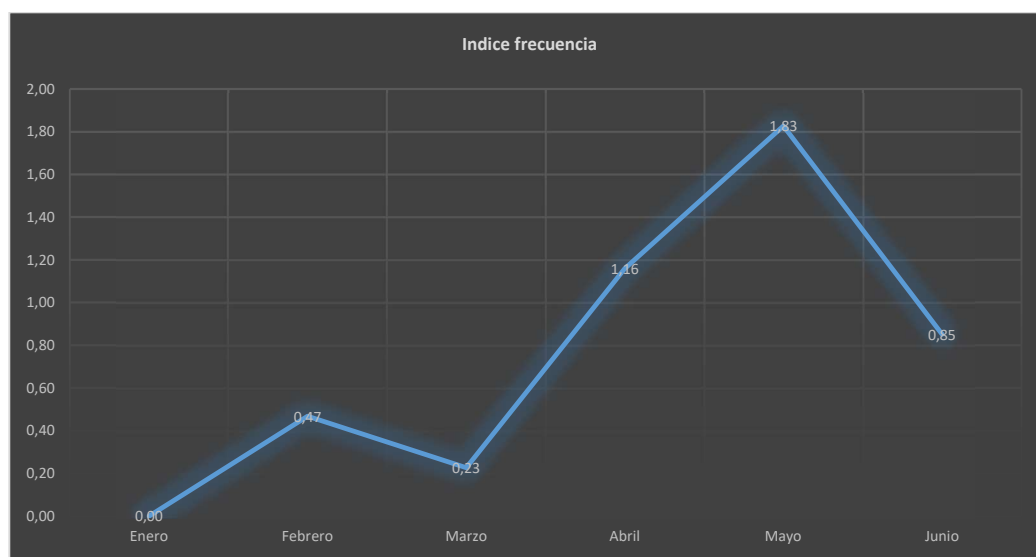


Ilustración 24 Grafica IF

El indicador se interpreta: Por cada cien (100) trabajadores que laboraron en el mes, se presentaron cero punto ochenta y cinco (0.85) accidentes de trabajo.

2.5.7.3 INDICÉ DE SEVERIDAD DE ACCIDENTE DE TRABAJO

Número de días perdidos por accidentes de trabajo en el mes.

Formula: (número de días de incapacidad por accidente de trabajo en el mes + número de días cargados en el mes / número de trabajadores en el mes) *100

Tabla 119 Índice de severidad de accidentes de trabajo

MES	ÍNDICE DE SEVERIDAD DE ACCIDENTE DE TRABAJO			
	No. de días por incapacidad laboral	No. de días cargados en el mes	No. de trabajadores en el mes	Índice de severidad
ENE	0	0	420	0
FEB	3	0	429	0.69
MAR	0	0	442	0
ABR	14	0	432	3.24
MAY	15	0	438	3.42
JUN	12	0	470	2.55

El indicador se interpreta: Por cada cien (100) trabajadores que laboraron en el mes, se perdió dos punto cincuenta y cinco (2.55) días por accidente de trabajo.



Ilustración 25 Gráfica IS

2.5.7.4 ÍNDICE DE AUSENTISMO

Número de días perdidos por ausencia por incapacidad laboral y enfermedad común.

Formula: (Número de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes / número de días de trabajo programadas en el mes) *100

Tabla 120 Ausentismo

MES	ÍNDICE DE AUSENTISMO		
	No. de días por incapacidad laboral/común	No. de días trabajados	Índice de ausencia
ENE	110	10920	1.01
FEB	141	11154	1.26
MAR	101	11492	0.88
ABR	119	11231	1.06
MAY	209	11388	1.84
JUN	159	12220	1.30

El indicador se interpreta: en el mes se perdió 1.30 días programados de trabajo por incapacidad médica.

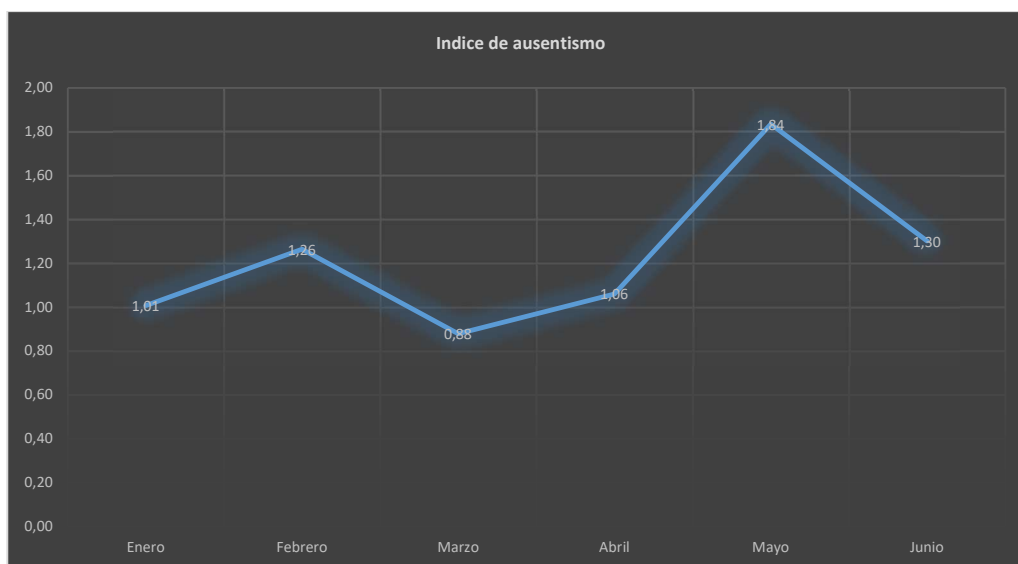


Ilustración 26 Gráfica IA

2.5.8 ESTADÍSTICAS DE ACCIDENTALIDAD LABORAL

Tabla 121 Accidentalidad

CONCEPTO	JUNIO	
Total de accidentes laborales	4	100%
CONCESION ALTO MAGDALENA S.A.S.	2	50%
CONSORCIO DE CONSTRUCCION Y DISEÑOS ALTO MAGDALENA	2	50%
CONTRATISTAS	0	0%

ID AFILIADO	NOMBRE AFILIADO	FECHA ACCIDENTE	DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE (observaciones)
C1070948756	Romero guarin alvaro enrique	10/06/2021	Siendo las 4:30pm el trabajador se encontraba descargado postes de concreto del camión hacia el punto de acopio, al descargar uno de los postes el dedo del medio queda atrapado, el trabajador procede a sacar su dedo y se quita el guante observando que aparentemente no tiene ninguna lesión, por esta razón el trabajador decide no reportar el evento. Al día siguiente sobre las 8:00am reportar que siente el dedo inflamado, negro y dormido.
C1023871035	Sanchez caviedes daniel alfredo	22/06/2021	Presuntamente el trabador reporta el día viernes 25/06/2021 sobre las 8:00pm que el día 22/06/2021 se encontraba en el taller casa lopez ubicado en la ciudad de la dorada para realizar mantenimiento a la grúa gancho. Siendo las 11:30am el trabajador accede a la plataforma de la grúa para medir el aceite del hidráulico para determinar la cantidad que se había derramado, de manera repentina se resbala lo que ocasiona que su rodilla izquierda se golpee con el boom.
79.999.624	Barrera castañeda selson daniel	16/06/21	Durante la revisión de cámaras de seguridad que se estaba realizando en el área de servicios del 18, se identificó que el domo de la cámara no estaba enviando información al CCTV por lo que se decidió verificar el trazado del cableado para así poder identificar el problema, se procede a destapar la primera caja de inspección que se encuentra en diagonal al área de cafetería con ayuda de 3 personas, dos sosteniendo la tapa y una con ayuda de la barra, se revisa el cableado sin éxito, al momento de hacer el descenso controlado de la tapa, justo en ese momento que se encuentran descargando la tapa, la persona que tiene la barra da un paso en falso hacia atrás por lo que se desestabiliza, pierde el control de la barra y se golpea con esta en la cabeza, haciéndose una laceración en la oreja izquierda.
14.322.025	Mauricio casasbuenas	17/06/2021	Siendo el día 18 de junio del año 2021 el trabajador se encontraba en el pr + 2,750 realizando tareas, de orden, aseo, limpieza y entre otros. Sobre las 11:00 am el trabajador se acerca al camión liviano eqy718 para ayudar a fijar las bancas de madera y metálicas que deben anclarse con tornillos a la carrocería, con ayuda de otras 2 colaboradores, el trabajador mauricio se posiciona en cuclillas generando una fuerza con sus brazos en los soportes de la banca hacia la carrocería para poder ser atornilladas y ancladas, donde siente un corrientazo por la parte derecha de su espalda. En ese momento del dolor el trabajador mauricio casas buenas no informa de lo sucedido. El trabajador completa su jornada laboral y en su lugar de residencia se auto medica aplicándose diclofenaco, al día siguiente se acerca al hospital san juan de dios de honda Tolima por que el dolor persiste, es de aclarar que el trabajador en mención no reporta el evento al área de sst de forma inmediata ni posterior. Luego de ser atendido el trabajador se acerca a la oficina con la orden de incapacidad causada por un lumbago no especificado donde le envían a terapias y toma de unos medicamentos. Al momento de radicar la incapacidad el trabajador manifiesta que cada vez que realiza alguna fuerza de este tipo por lo general presenta este tipo de molestias en su espalda.

2.5.9 ENTREGA DE DOTACIÓN, EPP Y ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD

El personal de la **Concesión Alto Magdalena S.A.S.**, y sus contratistas cuentan con sus respectivas dotaciones y elementos de protección personal.

Se realizó entrega y reposición de EPP. Se realizaron charlas en cuanto a la importancia del uso de los Elementos de protección personal. Se realizó la inspección del estado y uso de EPP, se realizó entrega de elementos de bioseguridad para el personal vinculado al proyecto. (Ver anexo 4)

	REGISTRO FOTOGRAFICO		F-08-03
			Versión: 04
			Fecha: 01-04-2016
PROYECTO VIAL GIRARDOT HONDA PUERTO SALGAR		UF No. 2	HOJA 3 DE 14
REGISTRO FOTOGRAFICO			
			
FOTOGRAFIA N°:	3	FECHA: 11/06/2021	
LUGAR:	Corredor vial		
DESCRIPCION:	Entrega de EPP		

	REGISTRO FOTOGRAFICO		F-08-03
			Versión: 04
			Fecha: 01-04-2016
PROYECTO VIAL GIRARDOT HONDA PUERTO SALGAR		UF No. 02	HOJA 4 DE 14
REGISTRO FOTOGRAFICO			
			

FOTOGRAFIA N°:	4	FECHA: 04/06/2021
LUGAR:	Corredor vial	
DESCRIPCION:	Entrega de EPP	

	REGISTRO FOTOGRAFICO		F-08-03
			Versión: 04
			Fecha: 01-04-2016
PROYECTO VIAL GIRARDOT HONDA PUERTO SALGAR		UF No. 3	HOJA 5 DE 14
REGISTRO FOTOGRAFICO			
			
FOTOGRAFIA N°:	5	FECHA: 25/06/2021	
LUGAR:	Corredor vial		
DESCRIPCION:	Entrega de EPP		

2.5.10 MEDIDAS ADELANTADAS POR EL CONCESIONARIO PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID 19

Dentro del P-03-25 PLAN HSEQ COVID-19 y demás protocolo no objetados por la interventoría para los constructores (MECO Y PAVIMENTOS DE COLOMBIA) se establecieron las metodologías y acciones para disminuir y mitigar el riesgo de contagio y la propagación del COVID-19 para el personal Concesión Alto Magdalena S.A.S y sus partes interesadas, para ellos se realizaron las siguientes actividades las cuales son reportadas se forma semanal a la interventoría y a la ANI.

- Entrega de elementos bioseguros para el personal de operación (guantes según actividad, tapabocas y protector visual según actividad).
- Puntos de limpieza en las áreas contractuales, el cual consta de: limpieza de calzado, lavado y desinfección de manos.
- Auto reporte de condiciones de salud antes de ingresar a las áreas contractuales y oficinas.
- Medición de temperatura.
- Limpieza y desinfección de áreas de trabajo de acuerdo a programación.

- Limpieza y desinfección de vehículos.
- Publicación de afiches indicando la limpieza de vehículos, entrada de elementos al almacén, limpieza de dispositivos electrónicos y distribución de puestos en vehículos.
- Implementación de aplicación de auto reporte antes de salir de casa.
- Puntos de limpieza de vehículos.
- Charlas diarias de 5 minutos.
- Limpieza de herramientas y equipos.

Con corte a junio en total contamos con 158 casos sospechosos. Se han realizado 104 pruebas de las cuales el 49% corresponden a casos positivos y el 51% a casos negativos.

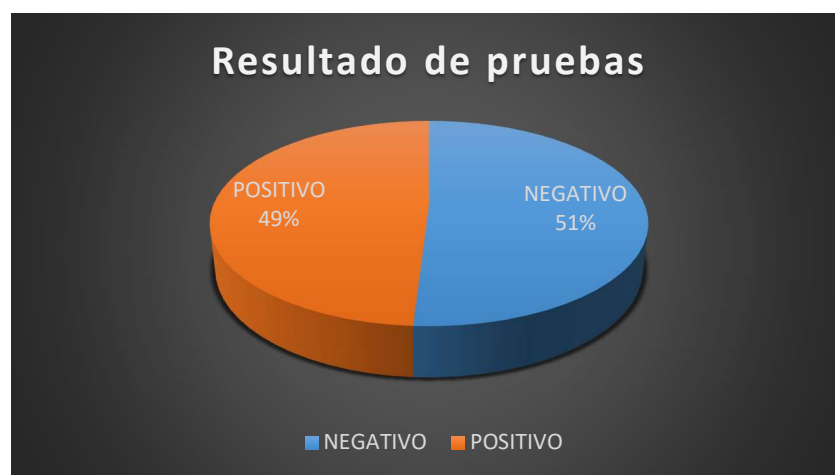


Ilustración 27 resultado de pruebas

NOMBRE	ÁREA	CARGO	FECHA INICIO DE SEGUIMIENTO	DIAGNOSTICO
Yeimy Paola Casas	Operaciones	Recolector de Peaje	2/05/2020	Diarrea funcioal
Jose Luis Ballen Bravo	Mantenimiento	Ayudante de Obra	15/05/2020	NEGATIVO
Juan Sebastian Alarcon	Ambiental	Arqueologo	15/05/2020	Gripa
Liseth Andrea Bejarano	Predial	Abogado Predial	18/05/2020	Rinitis
Alejandro Hernandez Palomino	Mantenimiento	Operador de Guadaña	18/05/2020	Gripa normal
Shirley Ladibo Cruz	Operaciones	Recolector de Peaje	21/05/2020	Infeccion urinaria
Adan Felipe Ruiz	Mantenimiento	Ayudante de Obra	8/07/2020	Fiebre no especificada
Diana Alejandra Pedraza	Predial	Auxiliar Juridico Predial	27/07/2020	Enfermedad de Vías Respiratorias
Luis Alfonso Lozano	Mantenimiento	Operador de Guadaña	10/08/2020	NEGATIVO
Carlos Andres Zarate	Predial	Conductor	10/08/2020	NEGATIVO
Daniel Bonilla Parada	Mantenimiento	Ayudante de Obra	19/08/2020	Gripe general
Daniela Morales	Administrativo	Auxiliar de Archivo	19/08/2020	Gripa leve
Jose Luis Ballen Bravo	Mantenimiento	Ayudante de Obra	24/08/2020	NEGATIVO
Santiago Lasprilla	Mantenimiento	Ayudante de Obra	14/09/2020	NEGATIVO

NOMBRE	ÁREA	CARGO	FECHA INICIO DE SEGUIMIENTO	DIAGNOSTICO
Robinson Forero	Mantenimiento	Operador Tractor Podadora	16/09/2020	Bronquitis Aguda
Rubinson Bustos	Ambiental	Auxiliar Ambiental	17/09/2020	POSITIVO
Juan Camilo Barajas	Ambiental	Profesional SIG	21/09/2020	NEGATIVO
Jorge Eduardo Beltran	Ambiental	Ing. Residente Ambiental	21/09/2020	NEGATIVO
Jose Cervera	Ambiental	Coord. Ambiental	21/09/2020	NEGATIVO
Jeinne Paola Mendez	Ambiental	Ing. Residente Forestal	21/09/2020	NEGATIVO
Tito Fabian Ruiz	Ambiental	Ing. Residente Ambiental	21/09/2020	POSITIVO
Diana Sanchez	Talento Humano	Asistente de T.H.	21/09/2020	Sinosis frontal aguda
Jessica Paola Vargas	Social	Profesional Social	21/09/2020	NEGATIVO
Jefferson Herney Guzman Patiño	Mantenimiento	Ayudante de Obra	21/09/2020	POSITIVO
Yamel Leyton Tovar	Ambiental	Ayudante de Obra	22/09/2020	NEGATIVO
Julio Cesar Sanchez	Operaciones	Operador Grúa Gancho	22/09/2020	NEGATIVO
Jair Antonio Serna	Mantenimiento	Ayudante de Obra	22/09/2020	POSITIVO
Jesus David Perez Hernandez	Mantenimiento	Residente de Mantenimiento	23/09/2020	NEGATIVO
Guillermo Elias Jaramillo	Mantenimiento	Ayudante de Obra	24/09/2020	Caso sospechoso
Jhon Rojo	Mantenimiento	Ayudante de Obra	25/09/2020	Caso sospechoso
Yenny Mateus	Operaciones	Recaudador de Peaje	25/09/2020	Gripe
Juan Miguel Osso Villanueva	SGI	Coord. HSEQ	28/09/2020	POSITIVO
Alejandra Catalina Conde Garcia	Ambiental	Aprendiz SENA	9/10/2020	POSITIVO
Edson Admin Ruiz Molina	Mantenimiento	Ayudante de Obra	14/10/2020	NEGATIVO
Carlos Gonzales	Mantenimiento	Inspector de mantenimiento	23/10/2020	NEGATIVO
Arnulfo Arias	Mantenimiento	Operador de Guadaña	24/10/2020	NEGATIVO
Jose Luis Ballen Bravo	Mantenimiento	Ayudante de Obra	3/11/2020	Caso sospechoso
Jhonnatan Fernando Murcia Rey	Operaciones	Coordinador de ITS	10/11/2020	NEGATIVO
German Daniel Castillo	Operaciones	Coordinador Operaciones	11/11/2020	NEGATIVO
Camilo Gutierrez	Operaciones	Operador de Grúa	11/11/2020	Aislamiento
Jenny Alexandra Mendieta	SGI	Aprendiz SENA	19/11/2020	POSITIVO
John Fredy Palacios	Mantenimiento	Ayudante de Obra	19/11/2020	Enfermedad general con sintomatología
Linda Yissel Ortiz	Operaciones	Radioperador	20/11/2020	POSITIVO
Samuel Laguna	Mantenimiento	Ayudante de Obra	21/11/2020	Caso sospechoso
Diana Marela Lugo	Social	Coodinador de Prgrama	23/11/2020	POSITIVO
Jorge Eduardo Beltran	Ambiental	Ing. Residente Ambiental	27/11/2020	POSITIVO
Diana Cortes	Social	Coord. del programa de S.V.	27/11/2020	POSITIVO

NOMBRE	ÁREA	CARGO	FECHA INICIO DE SEGUIMIENTO	DIAGNOSTICO
Leonardo Augusto Rueda Rey	OYM	Director de OyM	30/11/2020	POSITIVO
Jesus David Perez Hernandez	Mantenimiento	Residente de Mantenimiento	30/11/2020	POSITIVO
Fredy David Ticora	Operaciones	Supervisor Electronico	30/11/2020	POSITIVO
Juan Sebastián Riveros	Mantenimiento	Coord. de Mantenimiento	30/11/2020	POSITIVO
Jose Cervera	Ambiental	Coord. Ambiental	30/11/2020	POSITIVO
Laura Bibiana Alzate	Ambiental	Biologa Residente	2/12/2020	NEGATIVO
Jose Sandalio Sanchez Bohoquez	Operaciones	Conductor	3/12/2020	POSITIVO
Jhon Alexander Olaya	Ambiental	Ayudante de Obra	5/12/2020	POSITIVO
Yolanda Orozco	Administrativo	Servicios generales	7/12/2020	POSITIVO
Juan Camilo Barajas	Ambiental	Profesional SIG	7/12/2020	NEGATIVO
Ariel Alberto Avila	Ambiental	Ayudante de Obra	10/12/2020	NEGATIVO
Edson Admin Ruiz Molina	Mantenimiento	Ayudante de Obra	14/12/2020	POSITIVO
Luis Fernando Puentes	Operaciones	Operador de Grua	14/12/2020	POSITIVO
Guillermo Torres Ramirez	Administrativo	Coordinador Contable	7/12/2020	Caso sospechoso
Natalia Vargas Amaya	Operaciones	Radioperador	27/12/2020	NEGATIVO
Adan Felipe Ruiz	Mantenimiento	Ayudante de Obra	28/12/2020	NEGATIVO
Francisco Triana	Mantenimiento	Lider de Cuadrilla	29/12/2020	Caso sospechoso
Carlos Rincon	Operaciones	Jefe de Peaje	31/12/2020	NEGATIVO
Laura Calvo	Operaciones	Jefe de Bascula	1/01/2021	POSITIVO
Cesar Augusto Castillo Castillo	Mantenimiento	Soldador	4/01/2021	NEGATIVO
Alfonso Aragon Acuña	Mantenimiento	Ayudante de Soldador	4/01/2021	POSITIVO
Victor Alfonso Olaya	Operaciones	Inspector Junior	4/01/2021	POSITIVO
Maria Esperanza Nova	EPC	Auxiliar Administrativo	4/01/2021	Caso sospechoso
Jose Emilson Moreno Chacon	EPC	Aparejador de grúa	4/01/2021	NEGATIVO
Niyireth Leal Lennis	Administrativo	Dir. Administrativo y de P.F	6/01/2021	POSITIVO
Duvan Steven Rivera	Mantenimiento	Ayudante de Obra	6/01/2021	POSITIVO
Jose Alfredo Bravo	Operaciones	Operador Carro Taller	10/01/2021	NEGATIVO
Jose Edison Henao Puentes	Operaciones	Operador de Grua	10/01/2021	NEGATIVO
Jhon Londoño	Mantenimiento	Inspector de mantenimiento	12/01/2021	NEGATIVO
Ana Maria Calderon Nuñez	SGI	Auxiliar HSEQ	23/01/2021	NEGATIVO
Julian David Velazques Giraldo	Mantenimiento	Ayudante de obra	25/01/2021	Caso sospechoso
Luz Adriana Jimenez	Administrativo	analista de nomina	27/01/2021	NEGATIVO
Sandra Milena Payan	Operaciones	Recaudador de Peaje	4/02/2021	NEGATIVO
Gabriel Vanegas Triana	Mantenimiento	Ayudante de Obra	8/02/2021	NEGATIVO
Nelson Cardenas	Operaciones	Inspector Vial	9/02/2021	POSITIVO

NOMBRE	ÁREA	CARGO	FECHA INICIO DE SEGUIMIENTO	DIAGNOSTICO
Sandra Milena Payan	Operaciones	Recaudador de Peaje	13/02/2021	POSITIVO
Arnulfo Arias Vargas	Mantenimiento	Operador de Guadaña	22/02/2021	POSITIVO
Jairo Augusto Lopez	Ambiental	Residente Forestal	2/03/2021	Malestar general
Juan Jose Avendaño	Predial	Profesional Predial	2/03/2021	Amigdalitis
Kevin Stiven Ravagli	Operaciones	Aprendiz SENA	15/03/2021	NEGATIVO
Guillermo Pachon	Operaciones	Coordinador MYE	12/04/2021	NEGATIVO
Ingrid Caren Camargo Giraldo	Operaciones	Recaudador de Peaje	14/04/2021	NEGATIVO
Guillermo Torres Ramirez	Administrativo	Coordinador Contable	13/04/2021	POSITIVO
Jorge Antonio Isaza Ariza	Operaciones	Inspector	4/05/2021	NEGATIVO
Cesar Libardo Ramirez	Predial	Conductor	3/05/2021	NEGATIVO
Yor William Camacho	Administrativo	Almacenista	3/05/2021	NEGATIVO
Tito Garcia Hernandez	Mantenimiento	Operador de Guadaña	30/04/2021	Caso sospechoso
Luis Fernando Guisao	Mantenimiento	Operador de Guadaña	4/05/2021	POSITIVO
Jorge Antonio Isaza Ariza	Operaciones	Inspector	8/05/2021	NEGATIVO
Jhonnatan Fernando Murcia Rey	Operaciones	Coordinador de ITS	15/05/2021	NEGATIVO
Julio Arturo Cruz Piñeros	Administrativo	Coordinador Gestión Documental	26/05/2021	POSITIVO
Daniela Fernanda Morales Yaduro	Administrativo	Auxiliar Administrativo	26/05/2021	Caso sospechoso
Eimy Carolina Farias	Administrativo	Auxiliar Contable	26/05/2021	POSITIVO
John Ricardo Areavalo	Predial	Asesor Juridico de Expropiaciones	29/05/2021	POSITIVO
Carlos Rincon	Operaciones	Jefe de Peaje	29/05/2021	Caso sospechoso
Cesar Augusto Castillo Castillo	Mantenimiento	Soldador	29/05/2021	POSITIVO
Yolanda Rocio Estrada Galindo	Predial	Auxiliar Administrativo	29/05/2021	Caso sospechoso
Diana Montero	Administrativo	Contador Jr	28/05/2021	NEGATIVO
Alfonso Aragon Acuña	Mantenimiento	Auxiliar Soldadura	1/06/2021	Caso sospechoso
Jhonnathan Steven	Predial	Profesional Predial	2/06/2021	NEGATIVO
Diego Armando Acevedo	Administrativo	Coordinador de TI	4/06/2021	Caso sospechoso
Marby Romero Reyes	Operaciones	Supervisor de Peaje	9/06/2021	POSITIVO
Jefferson Andrés Garay Osorio	Operaciones	Aprendiz SENA	6/06/2021	POSITIVO
Jhon Rojo	Mantenimiento	Ayudante de Obra	10/06/2021	POSITIVO
Jhonnatan Fernando Murcia Rey	Operaciones	Coordinador ITS	11/06/2021	Contacto estrecho Esposa
John Javier Corredor	Operaciones	Operador de Carrotaller	13/06/2021	POSITIVO
Angela Maria Rivera Castillo	Operaciones	Radioperador	13/06/2021	POSITIVO
Yngrid Natalia Moreno	Operaciones	Radioperador	13/06/2021	Caso sospechoso
Cesar Gustavo Tellez Gomez	Operaciones	Conductor	14/06/2021	Caso sospechoso
John Mauricio Gonzalez	Mantenimiento	Ayudante de Obra	15/06/2021	Rinofaringitis viral

NOMBRE	ÁREA	CARGO	FECHA INICIO DE SEGUIMIENTO	DIAGNOSTICO
John Fredy Palacios	Mantenimiento	Ayudante de Obra	15/06/2021	POSITIVO
Jose Lemer Martinez	Operaciones	Ayudante de Obra	15/06/2021	POSITIVO
Natalia Vargas Amaya	Operaciones	Radioperador	15/06/2021	POSITIVO
Freddy Salguero	Mantenimiento	Conductor	16/06/2021	Caso sospechoso
Edwin Arcadio Jimenez Giraldo	Operaciones	Inspector JR	16/06/2021	POSITIVO
Anne Carolina Yara	Predial	Director predial	16/06/2021	POSITIVO
Luis Alfonso Lozano	Mantenimiento	Operador de Guadaña	17/06/2021	POSITIVO
Jessica Paola Vargas	Social	Profesional Social	17/06/2021	POSITIVO
Gustavo Mahecha	Operaciones	Operador de Carrotaller	17/06/2021	POSITIVO
Maria Carolina Rojas	Social	Coordinador social	18/06/2021	Caso sospechoso
Yolanda Rocio Estrada Galindo	Predial	Auxiliar Administrativo	18/06/2021	Caso sospechoso
Leidy Johanna Castiblanco	Social	Coordinador de PGS	18/06/2021	Caso sospechoso
Carlos Andres Zarate	Social	Conductor	18/06/2021	Caso sospechoso
Marly Rodriguez	Social	Coordinador de PGS	18/06/2021	Caso sospechoso
Diana Marcela Cortes	Social	Coordinador de PGS	18/06/2021	Caso sospechoso
Jhorman Alexander Ramirez	Mantenimiento	Ayudante de obra	17/06/2021	POSITIVO
Gabriel Vanegas Triana	Mantenimiento	Ayudante de obra	17/06/2021	Prodrromo vial
Monica Barrera	Operaciones	Radioperador	17/06/2021	Rinofaringitis aguda(resfriado comun)
Duvan Steven Rivera	Mantenimiento	Ayudante de Obra	17/06/2021	Caso sospechoso - esposa
Diego Armando Acevedo	Sistemas	Coordinador deTI	18/06/2021	POSITIVO
Andrea Liset Bejarano	Predial	Abogado Predial	18/06/2021	NEGATIVO
Claudia Lorena Algarra	Predial	Tecnico predial	18/06/2021	Caso sospechoso
Juan Jose Avendaño	Predial	Profesional Predial	18/06/2021	NEGATIVO
Jhonnathan Steven	Predial	Profesional Predial	18/06/2021	NEGATIVO
Jose Emilson Moreno Chacon	EPC	Aparejador de grúa	18/06/2021	NEGATIVO
Luz Elena Cangrejo Uribe	Administrativo	Servicios generales	18/06/2021	NEGATIVO
Oscar Yimmy Ariza	Mantenimiento	Conductor	20/06/2021	POSITIVO
Luz Adriana Jimenez	Administrativo	Analista de nomina	20/06/2021	POSITIVO
Benjamin Torres Vallejo	Administrativo	Conductor	21/06/2021	POSITIVO
Diana Patricia Vasquez Segura	Predial	Abogado Predial	18/06/2021	NEGATIVO
Jhoan Leandro Bohorquez Cortés	Mantenimiento	Ayudante de Obra	23/06/2021	Caso sospechoso
Camilo Andres Prada	Mantenimiento	Ayudante de Obra	24/06/2021	POSITIVO
Ingrid Tatiana Mosquera Samper	Operaciones	Inspector de obra	24/06/2021	POSITIVO
Leonardo Hernandez	Mantenimiento	Operador de Guadaña	24/06/2021	NEGATIVO
Diego Reyes	Operaciones	Auxiliar de seguridad vial	25/06/2021	NEGATIVO

NOMBRE	ÁREA	CARGO	FECHA INICIO DE SEGUIMIENTO	DIAGNOSTICO
Jorge Antonio Isaza Ariza	Operaciones	Inspector	28/06/2021	NEGATIVO
Javier Andres Alfaro	Operaciones	Operador Carro Taller	29/06/2021	NEGATIVO
Samir Antonio Echeverria	Mantenimiento	Ayudante de Obra	29/06/2021	POSITIVO
Jaime Saenz	Mantenimiento	Ayudante de Obra	30/06/2021	Caso sospechoso
Aldemar Cortes	Mantenimiento	Ayudante de Obra	30/06/2021	POSITIVO
Freddy Salguero	Mantenimiento	Conductor	5/07/2021	Caso sospechoso
Diana Ubaldina Monsalve Perez	Operaciones	Recaudador de Peaje	7/07/2021	NEGATIVO
Ariel Alberto Avila Garcia	Ambiental	Ayudante de Obra	7/07/2021	POSITIVO
Dennis Milena Puentes	Operaciones	Operaor de bascula	12/07/2021	NEGATIVO
Jovani Mancipe Guzman	Mantenimiento	Operador de Guadaña	12/07/2021	POSITIVO
Leonardo Rueda	Operaciones	Director de OyM	13/07/2021	Caso sospechoso
Juan Esteban Rubiano	Ambiental	Ayudante de Obra	15/07/2021	Caso sospechoso
Jaime Saenz	Mantenimiento	Ayudante de Obra	15/07/2021	Caso sospechoso
Jefferson Herney Guzman Patiño	Mantenimiento	Ayudante de Obra	15/07/2021	NEGATIVO
Freddy Salguero	Mantenimiento	Conductor	16/07/2021	NEGATIVO
Jair Antonio Serna	Mantenimiento	Ayudante de Obra	22/07/2021	Caso sospechoso

En cuantos a los contratistas, se han identificado 8 casos positivos los cuales listamos a continuación:

NOMBRE	N° CEDULA	ÁREA	CARGO	FECHA INICIO DE SEGUIMIENTO	RESULTADO
VIVIANA FORERO	28577148	Operación	SISMEDICA	11/12/2020	POSITIVO
ALBA CAPERA	1070611609	Operación	SISMEDICA	12/12/2020	POSITIVO
EDWIN AMARIS	1049320100	Operación	SISMEDICA	07/12/2020	POSITIVO
CARLOS MARTINEZ	80148675	Operación	SISMEDICA	24/12/2020	POSITIVO
MICHAEL FIDEL FLORIDO BELTRÁN	1073328543	Construcción	MECO	17/06/2021	POSITIVO
NERLY YISNEY GUZMAN HOYOS	1106712876	Operaciones	SISMEDICA	14/06/2021	POSITIVO
LINA MARIA PARRA BELTRAN	1.013.662.948	Construcción	CUMPLIMIENTO AMBIENTAL	16/06/2021	POSITIVO
JHONATAN SEGURA CORTES	1.013.585.797	Construcción	CUMPLIMIENTO AMBIENTAL	16/06/2021	POSITIVO

Los cincuenta y uno (51) casos positivos, ya cumplieron su cuarentena y se encuentran reintegrados trabajando de manera normal.

	REGISTRO FOTOGRAFICO		F-08-03
			Versión: 04
			Fecha: 01-04-2016
PROYECTO VIAL GIRARDOT HONDA PUERTO SALGAR		UF No.5	HOJA 6 DE 14
REGISTRO FOTOGRAFICO			
			
FOTOGRAFIA N°:		6	FECHA: 23/06/2021
LUGAR:		Estación de peaje brisas	
DESCRIPCION:		Inspección de extintores	

	REGISTRO FOTOGRAFICO		F-08-03
			Versión: 04
			Fecha: 01-04-2016
PROYECTO VIAL GIRARDOT HONDA PUERTO SALGAR		UFNo. 2	HOJA 7 DE 14
REGISTRO FOTOGRAFICO			
			
FOTOGRAFIA N°:		7	FECHA: 25/06/2021
LUGAR:		Peaje Cambao	
DESCRIPCION:		Cargue de desinfectante para manos	

	REGISTRO FOTOGRAFICO		F-08-03
			Versión: 04
			Fecha: 01-04-2016
PROYECTO VIAL GIRARDOT HONDA PUERTO SALGAR		UF No.4	HOJA 8 DE 14
REGISTRO FOTOGRAFICO			
			
FOTOGRAFIA N°:	8	FECHA: 23/06/2021	
LUGAR:	Corredor vial		
DESCRIPCION:	Pausa activa		

	REGISTRO FOTOGRAFICO		F-08-03
			Versión: 04
			Fecha: 01-04-2016
PROYECTO VIAL GIRARDOT HONDA PUERTO SALGAR		UF No.5	HOJA 9 DE 14
REGISTRO FOTOGRAFICO			
			
FOTOGRAFIA N°:	9	FECHA: 23/06/2021	
LUGAR:	Estación de peaje brisas		
DESCRIPCION:	Inspección de botiquín		

	REGISTRO FOTOGRAFICO		F-08-03
			Versión: 04
			Fecha: 01-04-2016
PROYECTO VIAL GIRARDOT HONDA PUERTO SALGAR		UF No.3	HOJA 10 DE 14
REGISTRO FOTOGRAFICO			
			
FOTOGRAFIA N°:	10	FECHA: 23/05/2021	
LUGAR:	Peaje Brisas		
DESCRIPCION:	Limpieza de manos		

	REGISTRO FOTOGRAFICO		F-08-03
			Versión: 04
			Fecha: 01-04-2016
PROYECTO VIAL GIRARDOT HONDA PUERTO SALGAR		UF No. 3	HOJA 11 DE 14
REGISTRO FOTOGRAFICO			
			
FOTOGRAFIA N°:	11	FECHA: 21/05/2021	
LUGAR:	Peaje Cambao		
DESCRIPCION:	Desinfección de manos		

2.5.11 INSPECCIONES DE ELEMENTOS DE EMERGENCIA

Se realizó inspección de elementos de emergencia evidenciando que estos se encuentran en buen estado para ser utilizados en la atención de emergencias. (Ver anexo 5)

Tabla 122 Inventario de elementos de emergencias

UBICACIÓN	CLASE	CAPACIDAD	FECHA DE EXPEDICION
BACULA SAN LORENZO			
Bacula Derecha - Planta Eléctrica	ABC	20 Lbs	OK
Bacula Derecha - Cuarto Electrico	HcFc	9000 gramos	OK
Bacula Derecha - Pasillo principal	CO2	30 Lbs	OK
Bacula Derecha - Pasillo principal / Baños	ABC	20 Lbs	OK
Bacula Derecha - Pasillo oficina	Solkaflam	9000 Gramos	OK
Bacula Izquierda - Oficina	HcFc	9000 gramos	OK
Bacula Izquierda - Pasillo Principal	CO2	30 Lbs	OK
Bacula Izquierda - Cuarto Rack	HcFc	9000 gramos	OK
PEAJE GUATAQUI			
Pasillo Cafetería	ABC	10 Lbs	OK
Cuarto Rack	HcFc	9000 Gramos	OK
Planta Eléctrica	ABC	20 Lbs	OK
Cuarto Eléctrico	HcFc	9000 Gramos	OK
Parte exterior Oficina Recaudo	CO2	30 Lbs	OK
Oficina de Recaudo	HcFc	9000 Gramos	OK
Caseta # 1	ABC	20 Lbs	OK
Caseta # 2 derecha	HcFc	9000 Gramos	OK
Caseta # 2 izquierda	HcFc	9000 Gramos	OK
Caseta # 3	ABC	20 Lbs	OK
AREA DE SERVICIO PR 80 + 450			
Gabinete # 1	ABC	10 Lbs	OK
Gabinete # 2	ABC	10 Lbs	OK
Gabinete # 3	ABC	10 Lbs	OK
Gabinete # 4	ABC	10 Lbs	OK
Gabinete # 5	ABC	10 Lbs	OK
Planta Eléctrica	ABC	20 Lbs	OK
Cuarto Rack	HcFc	9000 Gramos	OK
Entrada Baños	HcFc	3700 Gramos	OK
CCO			

UBICACIÓN	CLASE	CAPACIDAD	FECHA DE EXPEDICION
BACULA SAN LORENZO			
Comedor	ABC	20 Lbs	OK
Cuarto Rack	HcFc	9000 Gramos	OK
Oficina de Atención al Usuario	HcFc	9000 Gramos	OK
Pasillo Entrada CCO	HcFc	9000 Gramos	OK
Interior Oficina CCO	HcFc	3700 Gramos	OK
Planta Eléctrica	ABC	20 Lbs	OK
PEAJE CAMBAO			
Pasillo Cafetería	HcFc	9000 Gramos	OK
Cuarto Rack	HcFc	9000 Gramos	OK
Planta Eléctrica	ABC	20 Lbs	OK
Parte exterior Oficina Recaudo	CO2	30 Lbs	OK
Pasillo Oficina de Recaudo	ABC	10 Lbs	OK
Caseta # 1	ABC	20 Lbs	OK
Caseta # 2 derecha	HcFc	9000 Gramos	OK
Caseta # 2 izquierda	HcFc	9000 Gramos	OK
Caseta # 3	ABC	20 Lbs	OK
AREA DE SERVICIO PR 18 + 500			
Gabinete # 1	ABC	10 Lbs	OK
Gabinete # 2	ABC	20 Lbs	OK
Gabinete # 3	ABC	20 Lbs	OK
Gabinete # 4	ABC	20 Lbs	OK
Gabinete # 5	ABC	20 Lbs	OK
Planta Eléctrica	ABC	20 Lbs	OK
Cuarto Rack	HcFc	9000 Gramos	OK
Oficina 1	ABC	20 Lbs	OK
Oficina 2	HcFc	3700 Gramos	OK
Enfermería	ABC	20 Lbs	OK
Entrada Baños	CO2	30 Lbs	OK
PEAJE BRISAS			
Pasillo Cafetería	ABC	10 Lbs	OK

UBICACIÓN	CLASE	CAPACIDAD	FECHA DE EXPEDICION
BACULA SAN LORENZO			
Cuarto Rack	HcFc	9000 Gramos	OK
Planta Eléctrica	ABC	20 Lbs	OK
Cuarto Eléctrico	HcFc	9000 Gramos	OK
Pasillo Oficina de Recaudo	HcFc	9000 Gramos	OK
Caseta # 1 izquierda	ABC	20 Lbs	OK
Caseta # 1 derecha	CO2	30 Lbs	OK
Caseta # 2 derecha	Solkaflam	9000 Gramos	OK
Caseta # 2 izquierda	HcFc	9000 Gramos	OK
Caseta # 3	ABC	20 Lbs	OK
BASCULA BRISAS			
Bacula Derecha - Planta Eléctrica	ABC	20 Lbs	OK
Bacula Derecha - Cuarto Electrico	Solkaflam	9000 Gramos	OK
Bacula Derecha - Pasillo principal / Baños	CO2	30 Lbs	OK
Bacula Derecha - Pasillo oficina	Solkaflam	9000 Gramos	OK
Bacula Izquierda - Pasillo Principal	ABC	20 Lbs	OK
Bacula Izquierda - Pasillo Principal	CO2	30 Lbs	OK
Bacula Izquierda - Cuarto Rack	Solkaflam	9000 Gramos	OK

Tabla 123 Botiquines y camillas

ÁREA CONTRACTUAL	CANTIDAD
ESTACIÓN DE PESAJE SAN LORENZO	2
ESTACIÓN DE PEAJE GUATAQUÍ	1
ÁREA DE SERVICIO	1
CCO	1
ESTACIÓN DE PEAJE CAMBAO	1
ÁREA DE SERVICIO UF5	1
ESTACIÓN DE PEAJE BRISAS	1
ESTACIÓN DE PESAJE BRISAS	2
OFICINA HONDA	1
OFICINA BOGOTÁ	1
VEHÍCULOS	11

AREA CONTRACTUAL	CANTIDAD
TOTAL	23

2.5.12 INSPECCIONES DE SEGURIDAD VIAL

Durante el desarrollo de actividades de obra, atención de incidentes y/o accidentes sobre el corredor vial se realizó la ubicación de señalización y dispositivos de seguridad vial. El personal de Inspección vial realiza la verificación al cumplimiento de los PMT instalados, para este mes se realizaron 4 inspecciones. (Ver anexo 6).

	REGISTRO FOTOGRAFICO		F-08-03
			Versión: 04
			Fecha: 01-04-2016
PROYECTO VIAL GIRARDOT HONDA PUERTO SALGAR		UF No.4	HOJA 12 DE 14
REGISTRO FOTOGRAFICO			
			
FOTOGRAFIA N°:	12	FECHA: 12/05/2021	
LUGAR:	UF5 Corredor vial		
DESCRIPCION:	Inspeccion de kit de aproximación MECO		

	REGISTRO FOTOGRAFICO		F-08-03
			Versión: 04
			Fecha: 01-04-2016
PROYECTO VIAL GIRARDOT HONDA PUERTO SALGAR		UF No. 1	HOJA 13 DE 14
REGISTRO FOTOGRAFICO			
			

FOTOGRAFIA N°:	13	FECHA: 03/06/2021
LUGAR:		Corredor vial UF2
DESCRIPCION:		Control de PMT

2.5.13 CONTROL DE RIESGO VIAL

Dentro de los controles del PESV, cada vehiculo vinculado al proyecto cuenta con dispositivo GPS el cual nos permite realizar seguimiento a los habitos de conduccion

Tabla 124 Flota de vehiculos

EMPRESA	VEHICULOS	CANTIDAD	VEHICULOS CON DISPOSITIVO	CONDUCTORES CERTIFICADOS EN MANEJO DEFENSIVO
CONCESION ALTO MAGDALENA S.A.S	CAMIONETA	10	10	10
	CARRO TALLER	2	2	8
	AMBULANCIA	3	3	9
	GRUA PLANCHON	2	2	8
	CAMION	2	2	2
	GRUA GANCHO	2	2	8
	BUSETA	2	2	2
CONSORCIO	CAMIONETA	1	1	1
MECO	47-18 Finisher	1	N/A	N/A
	Vibro compactador	3	N/A	N/A
	42-27 Barredora	1	N/A	N/A
	Retroexcavadora	1	N/A	N/A
	Fresadora	1	N/A	N/A
	Excavadora	1	N/A	N/A
	Camión liviano	1	1	1
	Camioneta	2	2	2
	VOLQUETA	6	6	6
	CAMION TANQUE	1	1	1

2.5.14 INSPECCIONES DE VEHICULOS DE OPERACIÓN

Para este mes se desarrollaron inspecciones de vehículos de la operación con el fin de indentificar hallazgos que permitan mejor el estado de estos. (Ver anexo 7)

2.5.15 MEJORA CONTINUA

Tabla 125 mejoras al SGSST

ACCION DE MEJORA	ESTADO
Control de riesgo eléctrico	Implementado
Simulacro en alturas	Implementado

2.5.16 REALIZACION DE PAUSAS ACTIVAS

Las pausas activas se continúan realizando en los diferentes frentes de trabajo tanto para el personal administrativo como para el operativo.

	REGISTRO FOTOGRAFICO		F-08-03
			Versión: 04
			Fecha: 01-04-2016
PROYECTO VIAL GIRARDOT HONDA PUERTO SALGAR	UF No. UF 5	HOJA 14 DE 14	
REGISTRO FOTOGRAFICO			
			
FOTOGRAFIA N°:	14	FECHA: 23/06/2021	
LUGAR:	Corredor vial.		
DESCRIPCION:	Pausas activas – Charla de 5 minutos		

2.5.17 PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIA

Para el mes de junio se realizaron 148 pruebas de alcoholimetría las cuales todas fueron negativas. (Ver anexo 8)

2.6 OPERACIONES

2.6.1 ASPECTOS DE OPERACIÓN

Durante este mes, se dio continuidad a las actividades de monitoreo de vía, atención a los usuarios, incidentes y accidentes, con los recursos propios de la Concesión para tal fin, como lo son las ambulancias, grúas para movilizar vehículos pesados, grúas para movilizar vehículos livianos y carros taller para asistir a los usuarios de la vía.

En el siguiente cuadro se incluyen todas las actividades propias de la operación con los usuarios de la vía.

Tabla 126. Base de datos consolidado de Atención Operación Mensual

 CONCESION ALTO MAGDALENA		
Base de datos consolidado de Atenciones Operación Mensual		
Periodo:		01 a 31 de mayo de 2021
Fecha de actualización de informe		31-may-21
RESUMEN		
1	Servicios de Grúa	96
2	Servicios de Carro taller	19
3	Servicios de Ambulancia	23
3,1	Servicios de Ambulancia en accidentes de tránsito	20
3,2	Servicios de Ambulancia a la comunidad	3
4	Novedades en Postes S.O.S.	94
5	Cierres de la vía	6
6	Cantidad de accidentes	12
6,1	Cantidad de accidentes con muertos	0
6,2	Cantidad de muertos en accidentes de tránsito	0
6,3	Cantidad de accidentes con heridos graves	1
6,4	Cantidad de accidentes con heridos leves	8
6,5	Cantidad de heridos graves en accidentes de tránsito	1
6,6	Cantidad de heridos leves en accidentes de tránsito	11
6,7	Vehículos involucrados	16
7	Servicios de Inspección Vial	13
8	Cantidad Incidentes	0
9	Cantidad servicios cancelados de Grúa y Carro taller	0
10	Solicitudes Paso de Cargas Extradiimensionadas y/o Extrapesadas	35

2.6.2 ACCIDENTES

Durante el presente mes, se presentaron en la vía 13 accidentes de tránsito, de los cuales ninguno presento víctimas fatales, sin embargo si se presentó 1 accidente con heridos graves y 9 accidentes con heridos leves, eventos que fueron atendidos de manera eficaz por la concesión dentro de los tiempos contractuales exigidos con ayuda de los recursos de apoyo como la ambulancia, grúas, carro taller y personal de operaciones atendieron los diversos accidentes presentados a lo largo del corredor vial, en conjunto con la Policía Nacional – Dirección de Tránsito y Transporte.

La siguiente tabla consolida el histórico de accidentalidad en el corredor:

Tabla 127 Consolidado Historico de Accidentalidad a junio 2021


ATENCION ACCIDENTES Y HERIDOS																
ACCIDENTES	SERVICIOS AMBULANCIA				ACCIDENTES DE TRANSITO							UNIDAD FUNCIONAL				
	TIEMPO DE RESPUESTA	CANTIDAD ATENCIONES	SERVICIOS COMUNIDAD	PROMEDIO (KM)	TOTAL ACCIDENTES	HERIDOS GRAVES	HERIDOS LEVES	VEHICULOS IMPLICADOS	ILESOS	TOTAL HERIDOS	MUERTOS	UF1	UF2	UF3	UF4	UF5
NOVIEMBRE 2014.	00:19:12	3	0	11.60	5	0	5	3	0	5	0	0	1	0	0	4
DICIEMBRE 2014.	00:06:48	5	1	16.67	5	3	4	6	4	7	1	0	2	1	0	2
ENERO 2015.	00:06:58	36	22	13.09	14	1	15	16	1	16	0	0	11	2	1	0
FEBRERO 2015.	00:12:02	28	13	18.28	14	7	14	17	2	21	1	0	9	3	1	1
MARZO 2015.	00:14:17	18	3	15.39	17	3	18	17	7	21	0	0	9	1	3	4
ABRIL 2015.	00:18:46	17	5	17.44	14	0	15	15	13	15	0	0	4	4	2	4
MAYO 2015.	00:11:56	15	6	10.95	13	1	12	16	13	13	0	0	6	1	1	5
JUNIO 2015.	00:06:03	19	11	7.30	13	0	11	17	10	11	0	0	7	1	1	4
JULIO 2015.	00:09:46	29	16	9.30	17	3	15	21	9	18	2	0	2	1	3	11
AGOSTO 2015.	00:11:22	38	15	11.30	26	2	28	29	5	30	1	0	9	4	4	9
SEPTIEMBRE 2015.	00:11:20	18	7	12.40	16	1	13	20	6	14	1	0	4	3	1	8
OCTUBRE 2015.	00:11:02	34	15	10.76	22	2	33	32	19	35	1	0	4	5	0	13
NOVIEMBRE 2015.	00:09:28	33	18	8.70	20	1	19	26	13	20	0	0	6	5	2	7
DICIEMBRE 2015.	00:09:35	30	11	20.45	25	0	18	35	39	18	0	0	5	4	4	12
ENERO 2016.	00:11:43	35	12	19.92	30	3	31	40	26	34	0	0	10	8	4	8
FEBRERO 2016.	00:13:27	15	5	14.00	15	0	16	19	14	16	0	0	5	2	2	6
MARZO 2016.	00:14:05	23	15	20.87	13	3	9	15	12	12	0	0	4	5	2	2
ABRIL 2016.	00:13:16	30	16	12.70	17	1	20	25	24	21	1	0	6	2	3	6
MAYO 2016.	00:15:04	31	16	13.87	20	5	18	32	44	23	2	0	2	4	5	9
JUNIO 2016.	00:12:33	36	21	16,10	22	1	19	27	33	20	0	0	3	7	2	10


ATENCION ACCIDENTES Y HERIDOS																
ACCIDENTES	SERVICIOS AMBULANCIA				ACCIDENTES DE TRANSITO							UNIDAD FUNCIONAL				
	TIEMPO DE RESPUESTA	CANTIDAD ATENCIONES	SERVICIOS COMUNIDAD	PROMEDIO (KM)	TOTAL ACCIDENTES	HERIDOS GRAVES	HERIDOS LEVES	VEHICULOS IMPLICADOS	ILESOS	TOTAL HERIDOS	MUERTOS	UF1	UF2	UF3	UF4	UF5
JULIO 2016.	00:09:40	30	21	14,36	14	0	17	17	13	17	0	0	2	3	3	6
AGOSTO 2016.	00:08:18	34	21	8,56	23	1	15	31	60	16	0	0	6	2	3	12
SEPTIEMBRE 2016.	00:13:15	28	15	12,60	14	3	18	18	12	21	0	0	2	5	0	7
OCTUBRE 2016.	00:10:35	31	13	12.88	23	2	23	31	37	25	0	0	7	3	4	9
NOVIEMBRE 2016.	00:15:46	35	20	18.22	18	5	11	25	20	16	1	0	2	4	5	7
DICIEMBRE 2016.	00:08:48	24	15	11.48	22	2	16	32	53	18	0	0	2	1	5	14
ENERO 2017.	00:13:05	33	9	15.51	29	3	29	42	24	32	0	0	7	3	6	13
FEBRERO 2017.	00:10:40	18	9	9.10	11	1	11	19	48	12	0	0	3	1	2	5
MARZO 2017.	00:14:47	19	9	27.71	13	3	8	20	69	11	0	0	1	0	4	8
ABRIL 2017.	00:16:55	33	14	21.25	24	2	18	32	26	20	0	0	8	4	2	10
MAYO 2017.	00:12:49	22	4	9.76	21	1	16	24	54	17	0	0	3	5	7	6
JUNIO 2017.	00:09:00	27	15	24.21	19	1	10	27	25	11	0	0	2	2	6	9
JULIO 2017.	00:12:54	29	11	14.65	27	0	22	40	34	22	3	0	5	5	6	11
AGOSTO 2017.	00:11:07	27	14	16.66	23	0	28	30	15	28	1	0	4	2	10	7
SEPTIEMBRE 2017.	00:11:50	23	6	10.35	19	2	15	26	6	17	0	0	4	4	5	6
OCTUBRE 2017.	00:12:18	23	7	15.31	23	1	22	28	5	23	0	0	5	1	4	13
NOVIEMBRE 2017.	00:11:54	20	6	24.23	25	4	20	33	33	24	3	0	3	5	6	11
DICIEMBRE 2017.	00:14:22	24	5	26.36	26	3	22	38	52	25	1	0	2	6	4	14
ENERO 2018.	00:12:53	17	3	13.49	25	5	27	43	36	32	1	0	5	3	5	12
FEBRERO 2018.	00:13:45	12	4	24.95	15	2	16	22	4	18	0	0	2	2	4	7
MARZO 2018.	00:16:05	11	3	31.51	20	2	16	25	81	18	0	0	2	4	5	9

ATENCIÓN ACCIDENTES Y HERIDOS																
ACCIDENTES	SERVICIOS AMBULANCIA				ACCIDENTES DE TRANSITO							UNIDAD FUNCIONAL				
	TIEMPO DE RESPUESTA	CANTIDAD ATENCIONES	SERVICIOS COMUNIDAD	PROMEDIO (KM)	TOTAL ACCIDENTES	HERIDOS GRAVES	HERIDOS LEVES	VEHICULOS IMPLICADOS	ILESOS	TOTAL HERIDOS	MUERTOS	UF1	UF2	UF3	UF4	UF5
ABRIL 2018.	00:10:23	18	11	19.49	13	0	14	17	11	14	0	0	3	3	1	6
MAYO 2018.	00:09:05	11	5	14.73	14	3	17	18	7	20	0	0	2	2	3	7
JUNIO 2018.	00:05:26	14	5	12.13	13	1	11	18	10	12	0	0	1	2	1	9
JULIO 2018.	00:08:28	15	4	13.46	13	1	11	21	8	12	0	1	2	2	3	5
AGOSTO 2018.	00:11:25	12	3	13.50	11	1	11	13	7	12	2	0	1	0	4	6
SEPTIEMBRE 2018.	00:10:03	18	7	12.73	15	5	10	20	9	15	1	0	1	4	2	8
OCTUBRE 2018.	00:10:25	24	4	15.96	19	0	14	29	23	14	0	0	2	3	2	12
NOVIEMBRE 2018.	00:08:24	30	14	11.14	16	1	12	27	20	13	2	1	1	3	4	7
DICIEMBRE 2018.	00:09:50	23	7	20.84	20	1	20	29	19	21	2	1	2	3	3	11
ENERO 2019.	00:08:13	24	7	14.47	16	0	21	20	6	21	0	0	4	2	3	7
FEBRERO 2019.	00:11:40	24	8	14.90	13	0	9	18	11	9	0	0	3	1	2	7
MARZO 2019.	00:08:02	29	6	16.33	15	5	18	22	10	23	2	1	3	1	3	7
ABRIL 2019.	00:11:26	23	8	18.24	14	0	13	19	8	13	0	0	2	4	5	3
MAYO 2019.	00:07:52	22	12	22.00	10	0	11	11	7	11	0	0	2	2	2	4
JUNIO 2019.	00:11:45	16	3	18.32	12	5	6	17	3	11	1	0	1	2	3	6
JULIO 2019.	00:12:50	18	6	13.82	12	6	28	18	13	34	0	0	3	1	0	8
AGOSTO 2019.	00:10:04	32	12	20.09	17	4	15	22	6	19	0	0	3	4	3	7
SEPTIEMBRE 2019.	00:09:41	25	9	10.54	12	0	8	15	3	8	1	0	1	2	3	6
OCTUBRE 2019.	00:13:22	35	12	19.26	17	6	7	20	6	20	1	1	0	3	4	9
NOVIEMBRE 2019.	00:15:08	23	5	18.02	12	4	11	14	15	15	1	0	2	4	0	6
DICIEMBRE 2019.	00:14:53	18	2	12.03	12	1	5	18	7	6	0	0	0	2	4	6


ATENCIÓN ACCIDENTES Y HERIDOS																
ACCIDENTES	SERVICIOS AMBULANCIA				ACCIDENTES DE TRANSITO							UNIDAD FUNCIONAL				
	TIEMPO DE RESPUESTA	CANTIDAD ATENCIONES	SERVICIOS COMUNIDAD	PROMEDIO (KM)	TOTAL ACCIDENTES	HERIDOS GRAVES	HERIDOS LEVES	VEHICULOS IMPLICADOS	ILESOS	TOTAL HERIDOS	MUERTOS	UF1	UF2	UF3	UF4	UF5
ENERO 2020.	00:12:03	23	4	16.93	16	2	14	18	11	16	0	0	3	4	4	5
FEBRERO 2020.	00:09:18	24	5	11.31	20	5	9	21	3	14	0	0	2	8	1	6
MARZO 2020.	00:15:37	23	2	26.04	14	3	22	16	11	25	1	1	3	5	2	3
ABRIL 2020.	00:10:45	4	1	10.48	3	0	2	3	2	2	0	0	0	2	0	1
MAYO 2020.	00:07:53	8	1	13.37	5	2	2	7	6	4	0	1	1	0	0	3
JUNIO 2020.	00:15:35	12	0	21.30	9	2	0	11	10	2	0	0	1	2	3	3
JULIO 2020.	00:10:06	10	1	15.49	7	0	5	9	3	5	0	0	1	3	2	1
AGOSTO 2020.	00:16:00	19	9	20.98	8	0	5	8	5	5	2	0	2	2	1	3
SEPTIEMBRE 2020.	00:10:24	20	5	14.37	15	2	17	20	2	19	0	0	3	2	2	8
OCTUBRE 2020.	00:14:34	19	1	17.12	13	1	15	17	16	16	2	0	1	4	3	5
NOVIEMBRE 2020.	01:13:34	23	1	12.611	17	3	11	24	16	14	1	1	2	4	4	6
DICIEMBRE 2020.	00:16:17	25	6	15.88	13	2	12	15	13	14	1	1	2	3	3	4
ENERO 2021.	00:15:00	15	4	16.00	10	1	15	12	5	16	1	0	3	2	2	3
FEBRERO 2021	00:16:37	13	3	12.45	10	0	11	12	4	11	1	0	1	1	2	6
MARZO 2021.	00:15:00	25	4	16.36	20	2	26	25	22	28	0	0	4	5	5	6
ABRIL 2021.	00:15:17	21	0	11.03	13	1	11	18	10	12	0	0	3	2	1	7
MAYO 2021.	00:14:30	23	3	16.76	12	1	11	16	14	12	10	1	2	1	5	3
JUNIO 2021.	00:10:38	22	9	11.67	13	0	17	20	13	17	1	0	3	0	1	9

Grafica 6 Accidentalidad acumulada a mes de Junio 2021

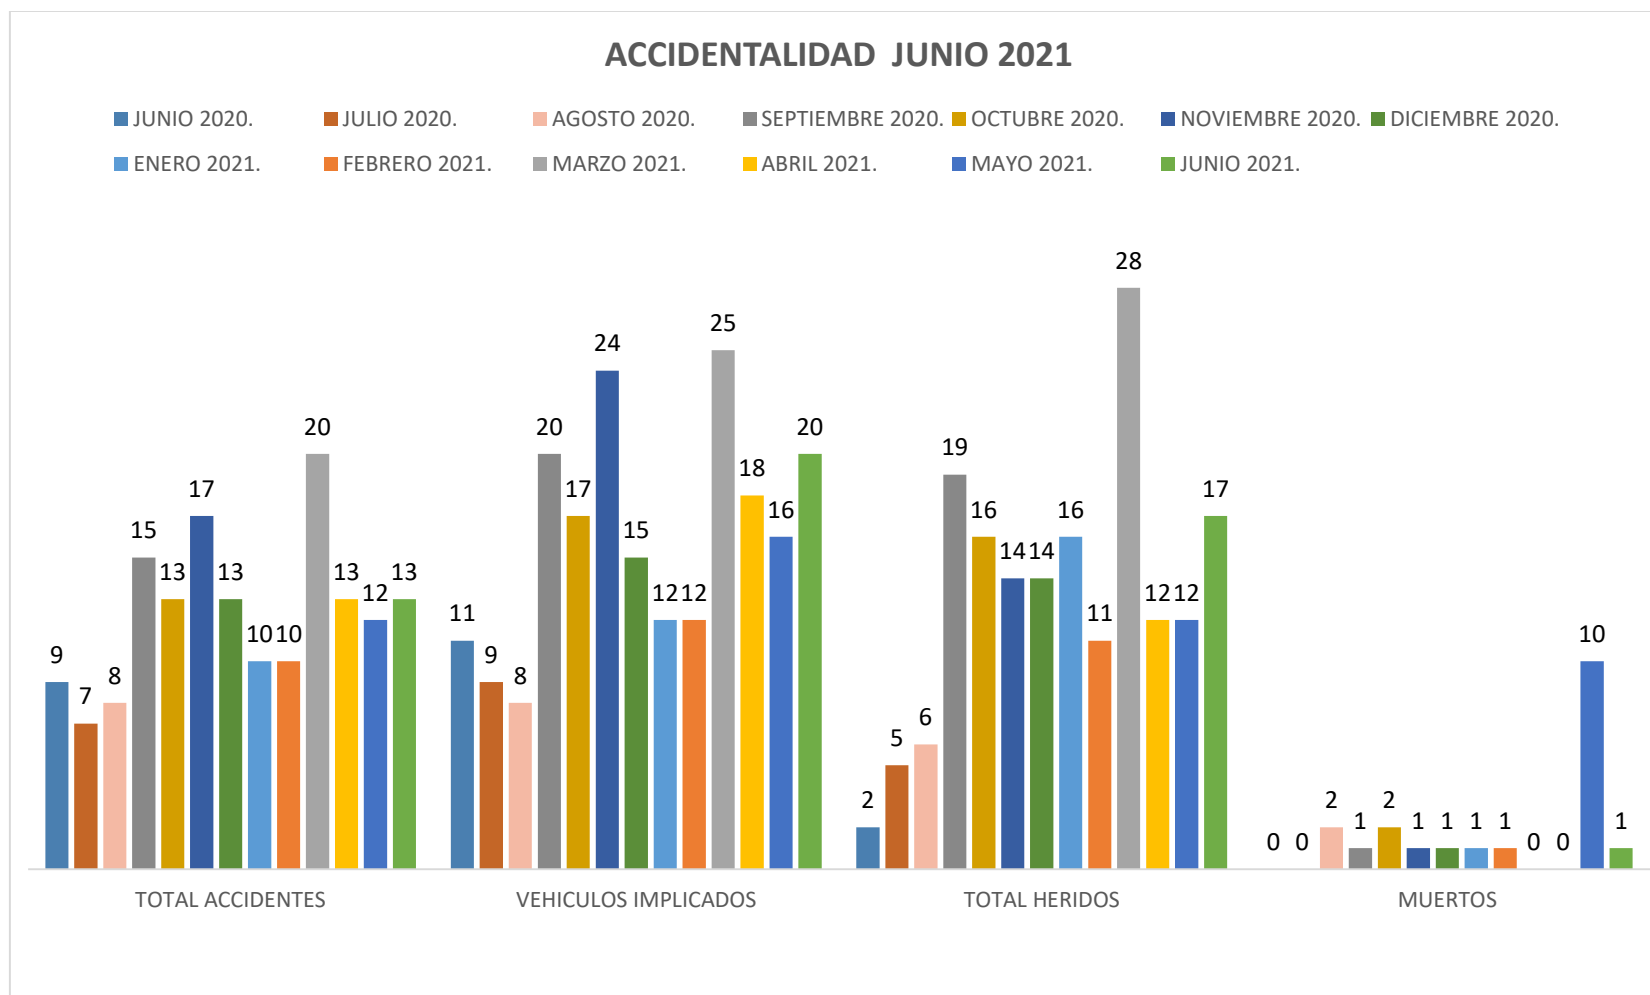

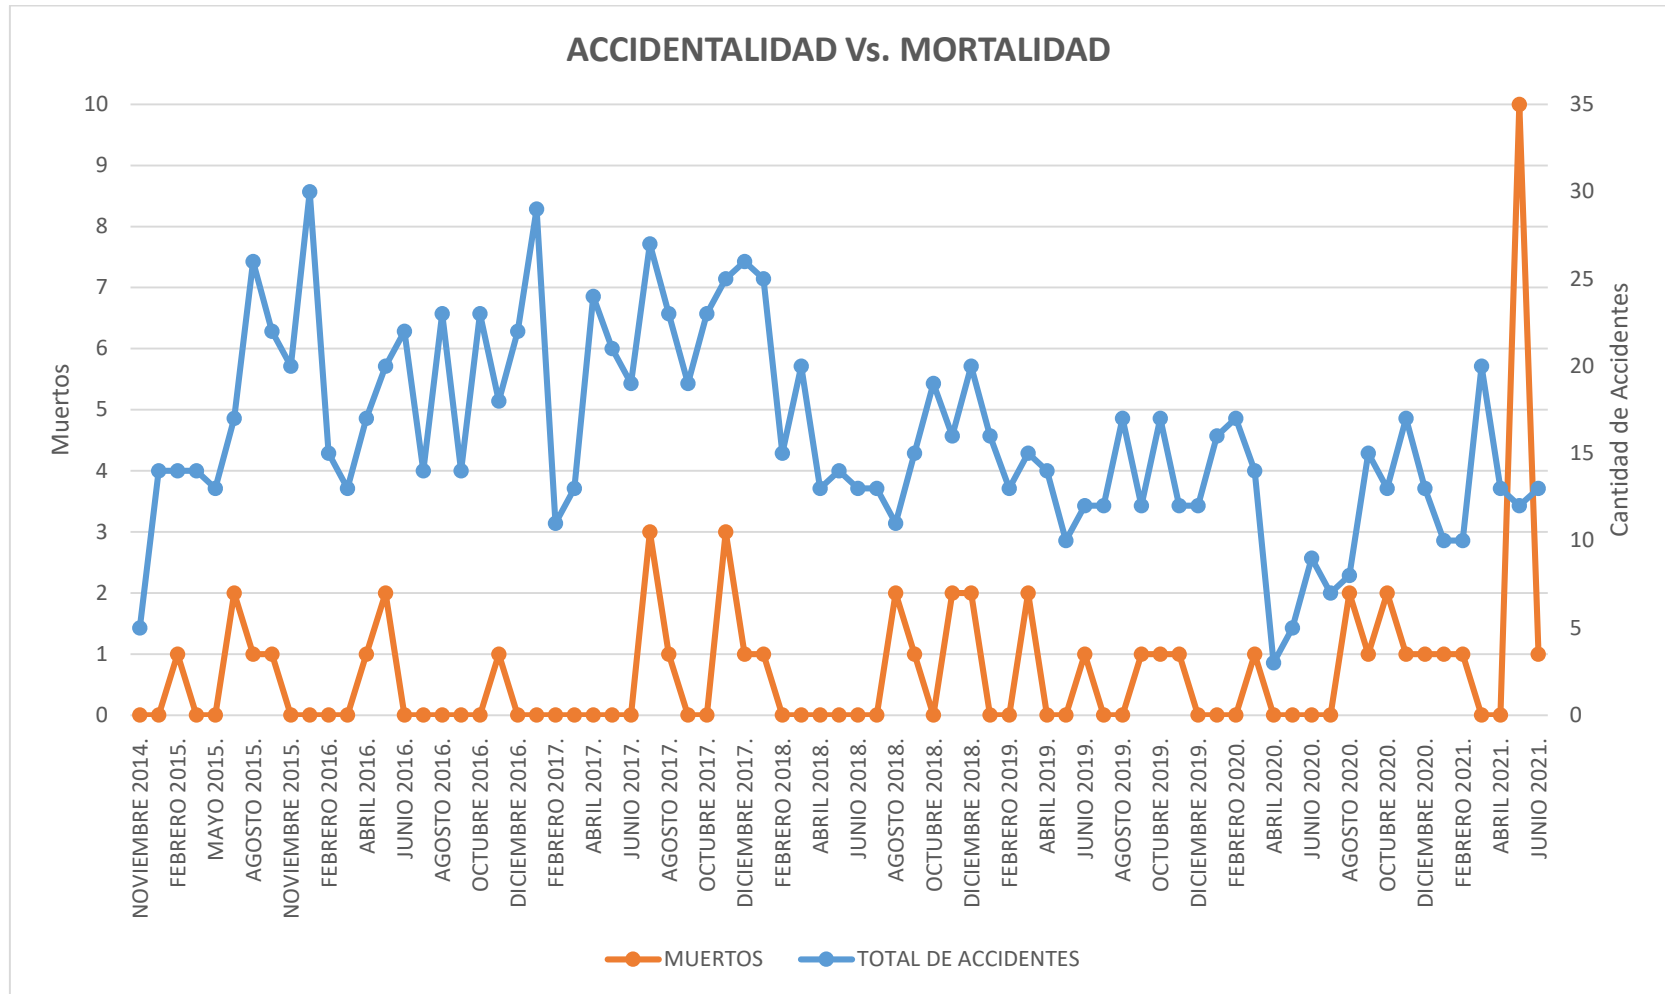

Grafica 7 Accidentalidad Vs Mortalidad acumulada

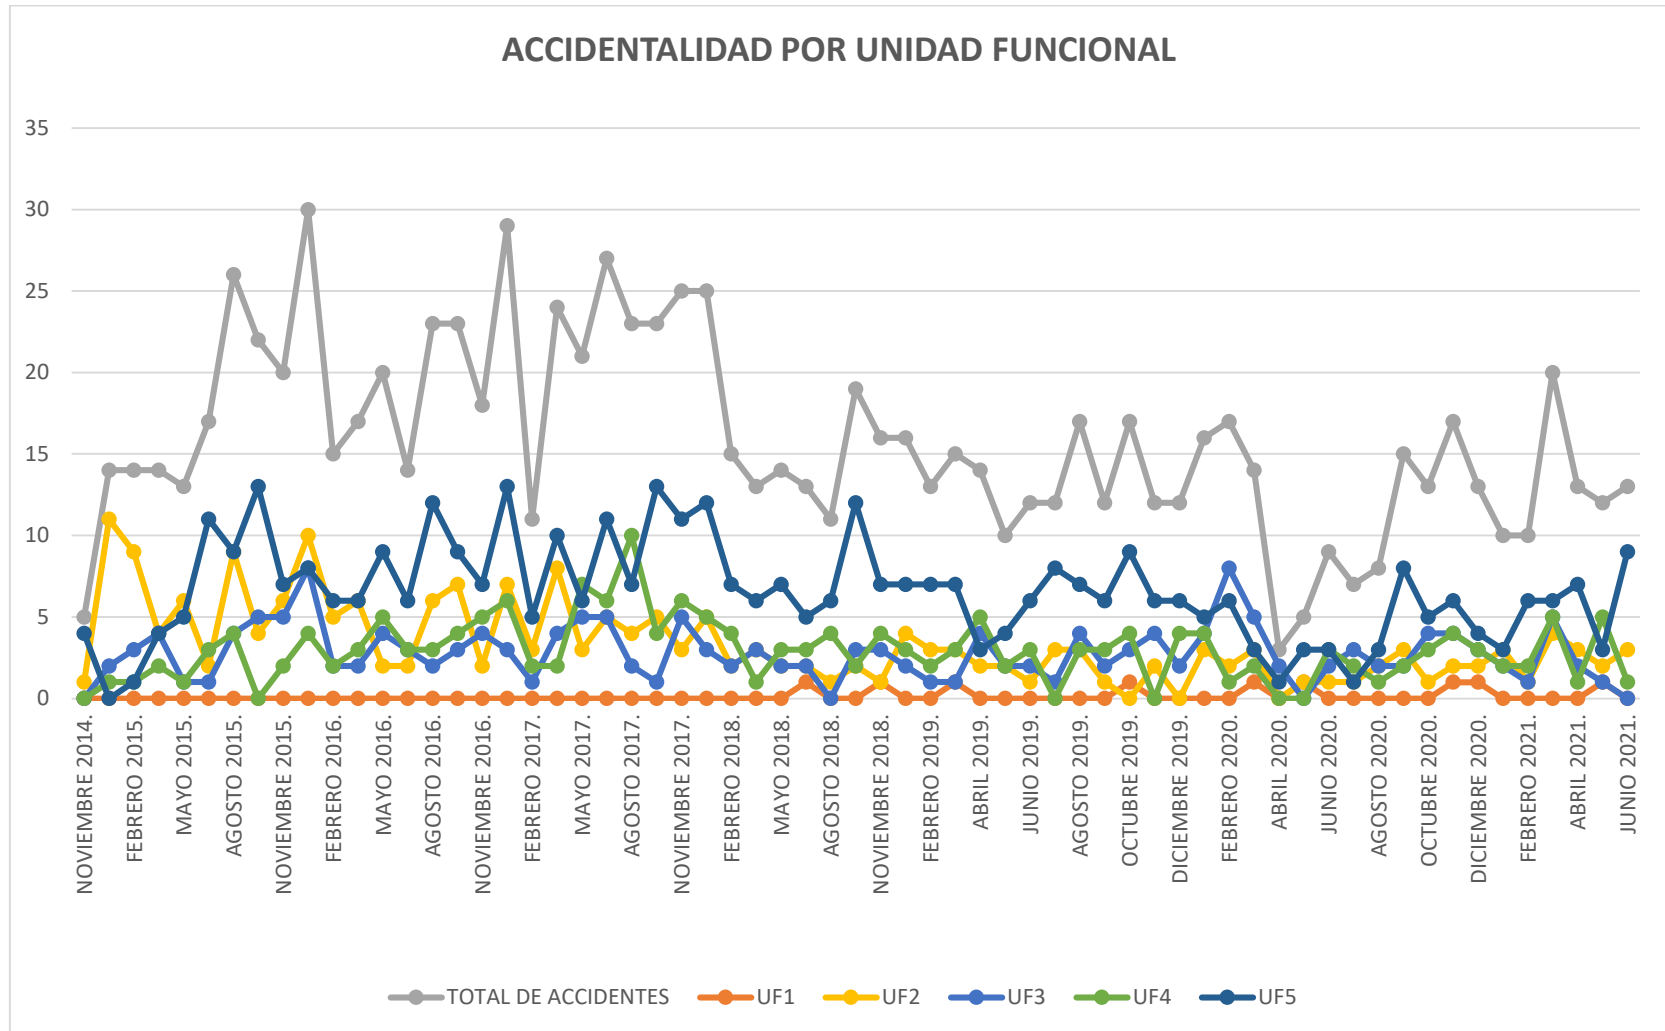

Gráfica 8 Accidentalidad Mensual por Unidad Funcional acumulada a junio de 2021


2.6.3 REGISTROS DE EVENTOS O INCIDENTES

Dentro del sistema de información se registran los datos que permiten verificar los sitios, recursos, tiempos y disponibilidad ante cualquier evento y articularlos desde la central de comunicaciones localizada en Cambao, San Juan de Rio Seco, para lograr una respuesta oportuna a cada uno de ellos con el personal y equipos necesarios.

En el mes de junio 2021 se no se presentaron cierres totales de la vía y tampoco se presentaron incidentes reportados a la sala de radiocomunicaciones para ser atendidas por el personal de la concesión.

2.6.4 SERVICIO DE GRUA

En el mes de junio 2021, se prestaron 93 servicios de grúa en el corredor Girardot - Honda - Puerto Salgar, trasladando a los usuarios a algún taller mecánico ubicado en las poblaciones cercanas con capacidad para arreglar averías básicas. Se observa el cumplimiento del indicador O4 para la atención de usuarios, en la casilla promedio de tiempos. En la siguiente gráfica se observa el comportamiento del servicio de grúa durante los últimos doce (12) meses.

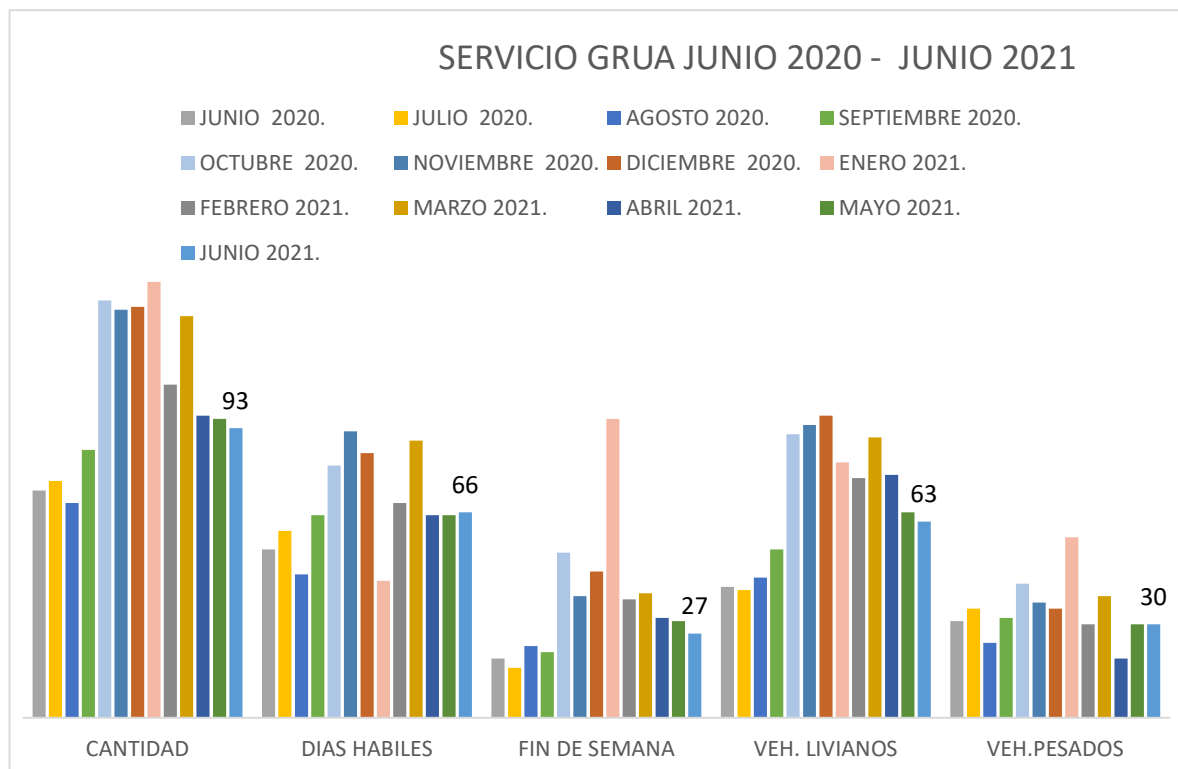

Grafica 9 Servicio Grúas acumulado a Mayo 2021

En la siguiente tabla se observa el registro histórico de los servicios de grúa en el corredor desde el inicio de la etapa Pre-operativa.

Tabla 128 Comportamiento de los servicios de Grúa a junio 2021

COMPORTAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE OPERACIÓN - GRUA									
MES	PROMEDIOS DE TIEMPO		SERVICIOS		PROMEDIO DESPLAZ.	DISTRIBUCION		TIPO VEHICULO	
	TIEMPOS DE RESPUESTA	TIEMPOS DE ATENCION	CANT.	%		DIAS HABILES	FIN DE SEMANA	VEHICULOS LIVIANOS	VEHICULOS PESADOS
NOVIEMBRE 2014.	00:15:00	01:06:00	17	47%	9.80	11	6	8	9
DICIEMBRE 2014.	00:20:00	09:10:00	63	46%	16.20	50	13	55	8
ENERO 2015.	00:22:00	01:52:00	81	46%	12.60	70	11	64	17
FEBRERO 2015.	00:20:23	03:47:34	70	51%	15.94	48	22	61	9
MARZO 2015.	00:40:18	01:11:31	73	53%	15.29	52	21	57	2
ABRIL 2015.	00:40:18	01:11:31	69	59%	20.80	51	18	45	24
MAYO 2015.	00:40:18	01:11:31	84	56%	18.13	57	27	62	22
JUNIO 2015.	00:40:18	01:11:31	112	63%	17.60	64	48	101	11
JULIO 2015.	00:40:18	01:11:31	124	67%	15.27	95	29	90	34
AGOSTO 2015.	00:40:18	01:11:31	154	68%	13.82	98	56	127	27
SEPTIEMBRE 2015.	00:40:18	01:11:31	125	70%	12.32	79	46	93	32
OCTUBRE 2015.	00:40:18	01:11:31	148	70%	18.17	105	43	107	41
NOVIEMBRE 2015.	00:40:18	01:11:31	165	76%	16.80	123	42	123	42
DICIEMBRE 2015.	00:40:18	01:11:31	159	68%	24.46	118	41	113	46
ENERO 2016.	00:40:18	01:11:31	211	70%	32.71	121	90	162	49
FEBRERO 2016.	00:24:15	01:05:54	158	76%	36.82	112	46	50	108
MARZO 2016.	00:39:40	01:02:01	206	73%	25.52	137	69	54	152
ABRIL 2016.	00:22:59	01:04:53	179	68%	13.14	120	59	103	76
MAYO 2016.	00:21:52	19:58:54	162	67%	14.94	100	62	102	60
JUNIO 2016.	00:23:17	01:07:45	150	64%	18.70	104	46	70	80
JULIO 2016.	00:27:29	01:18:15	151	67%	21.69	98	53	120	31
AGOSTO 2016.	00:22:42	01:09:42	176	72%	22.31	92	84	143	33
SEPTIEMBRE 2016.	00:27:54	01:08:11	159	65%	24.18	124	35	103	56
OCTUBRE 2016.	00:36:35	01:10:50	146	59%	25.31	90	56	103	43
NOVIEMBRE 2016.	00:24:58	01:03:37	152	65%	19.30	111	41	101	51
DICIEMBRE 2016.	00:23:25	01:11:11	156	68%	18.95	102	54	109	47
ENERO 2017.	00:26:38	01:14:35	182	63%	18.71	130	52	121	61
FEBRERO 2017.	00:25:04	01:04:17	134	68%	15.99	96	38	84	50
MARZO 2017.	00:35:41	01:09:44	143	72%	17.37	102	41	104	39
ABRIL 2017.	00:31:19	01:22:50	145	67%	19.43	52	93	93	52


COMPORTAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE OPERACIÓN - GRUA									
MES	PROMEDIOS DE TIEMPO		SERVICIOS		PROMEDIO DESPLAZ.	DISTRIBUCION		TIPO VEHICULO	
	TIEMPOS DE RESPUESTA	TIEMPOS DE ATENCION	CANT.	%		DIAS HABILES	FIN DE SEMANA	VEHICULOS LIVIANOS	VEHICULOS PESADOS
MAYO 2017.	00:34:15	01:10:36	146	74%	18.11	74	72	103	43
JUNIO 2017.	00:28:29	01:15:43	141	68%	18.07	88	53	91	50
JULIO 2017.	00:24:15	01:11:40	145	67%	20.80	90	55	106	39
AGOSTO 2017.	00:35:07	01:33:35	139	70%	17.14	95	44	82	57
SEPTIEMBRE 2017.	00:26:03	01:21:48	137	70%	20.27	95	42	90	47
OCTUBRE 2017.	00:24:03	01:14:52	127	64%	19.61	90	37	77	50
NOVIEMBRE 2017.	00:25:35	01:05:29	113	67%	21.29	80	33	74	39
DICIEMBRE 2017.	00:22:54	01:17:57	140	62%	14.72	88	52	93	47
ENERO 2018.	00:23:06	01:17:00	157	68%	14.01	129	28	113	44
FEBRERO 2018.	00:23:19	01:30:02	118	67%	12.39	88	30	58	60
MARZO 2018.	00:34:25	01:16:00	134	71%	17.24	88	46	59	75
ABRIL 2018.	00:16:28	01:05:33	122	67%	10.63	85	37	68	54
MAYO 2018.	00:24:32	01:21:03	146	71%	14.85	97	49	91	55
JUNIO 2018.	00:19:18	01:27:01	122	68%	12.05	82	40	66	56
JULIO 2018.	00:19:56	01:22:26	136	67%	14.42	91	45	91	45
AGOSTO 2018.	00:18:44	01:55:57	94	69%	16.83	59	35	60	34
SEPTIEMBRE 2018.	00:14:26	01:32:44	93	70%	14.00	60	33	52	41
OCTUBRE 2018.	00:16:46	01:08:48	117	74%	13.17	83	34	66	51
NOVIEMBRE 2018.	00:15:59	01:28:34	94	73%	12.07	59	35	46	48
DICIEMBRE 2018.	00:21:29	01:24:12	142	76%	12.16	106	36	87	55
ENERO 2019.	00:26:45	01:25:08	143	79%	13.07	92	51	99	44
FEBRERO 2019.	00:18:55	01:28:32	109	71%	13.20	85	24	57	52
MARZO 2019.	00:16:03	01:35:28	123	84%	9.82	81	42	70	53
ABRIL 2019.	00:17:28	01:21:37	117	85%	12.87	62	55	77	40
MAYO 2019.	00:18:26	01:15:33	98	83%	11.49	62	36	56	42
JUNIO 2019.	00:19:14	01:27:54	124	79%	13.16	83	41	73	51
JULIO 2019.	00:22:47	01:19:47	127	0%	14.96	90	37	86	41
AGOSTO 2019.	00:19:04	01:39:16	129	84%	17.74	77	52	85	44
SEPTIEMBRE 2019.	0:29:04	1:30:16	114	85%	14.89	88	26	64	50
OCTUBRE 2019.	0:23:17	1:44:13	133	85%	15.57	82	51	84	49
NOVIEMBRE 2019.	00:20:14	01:22:59	103	87%	12.41	75	28	64	39
DICIEMBRE 2019.	00:19:38	19:25:24	147	91%	14.70	105	42	107	40
ENERO 2020.	00:20:24	01:25:20	128	85%	18.46	76	52	96	32
FEBRERO 2020.	00:18:54	01:17:40	95	79%	14.79	63	32	4	91

COMPORTAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE OPERACIÓN - GRUA									
MES	PROMEDIOS DE TIEMPO		SERVICIOS		PROMEDIO DESPLAZ.	DISTRIBUCION		TIPO VEHICULO	
	TIEMPOS DE RESPUESTA	TIEMPOS DE ATENCION	CANT.	%		DIAS HABILES	FIN DE SEMANA	VEHICULOS LIVIANOS	VEHICULOS PESADOS
MARZO 2020.	00:29:01	01:28:24	84	83%	12.22	68	16	43	41
ABRIL 2020.	0:19:41	1:58:49	38	79%	13,22	27	11	29	9
MAYO 2020.	00:16:56	01:55:23	48	74%	13.59	33	15	22	26
JUNIO 2020.	00:16:48	01:27:07	73	0%	16.32	54	19	42	31
JULIO 2020.	00:18:17	01:45:27	76	77%	12.89	60	16	41	35
AGOSTO 2020.	00:16:34	01:48:33	69	75%	17.61	46	23	45	24
SEPTIEMBRE 2020.	00:15:17	01:38:13	86	79%	13.77	65	21	54	32
OCTUBRE 2020.	00:17:20	02:31:36	134	85%	15.08	81	53	91	43
NOVIEMBRE 2020.	00:28:16	01:29:28	131	90%	16.31	92	39	94	37
DICIEMBRE 2020.	00:17:28	02:40:35	132	89%	12.90	85	47	97	35
ENERO 2021.	00:28:43	02:59:03	140	89%	14,82	44	96	82	58
FEBRERO 2021.	00:18:24	01:12:29	107	83%	12.49	69	38	77	30
MARZO 2021.	00:25:59	01:15:08	129	82%	13.44	89	40	90	39
ABRIL 2021.	0:22:17	0:48:43	97	0%	12,27	65	32	78	19
MAYO 2021.	00:17:59	00:54:36	96	86%	12.89	65	31	66	30
JUNIO 2021.	00:17:12	00:59:54	93	85%	13.05	66	27	63	30

2.6.5 SERVICIO DE CARRO TALLER

En el mes de junio 2021 los carro - talleres asistieron a 16 usuarios en la vía en temas de mecánica básica, señalización, acompañamiento y apoyo de usuarios de vehículos livianos y pesados dentro del corredor vial. En el cuadro se presenta el comportamiento del servicio, observándose un comportamiento estable en la cantidad de servicios prestados.

Se observa el cumplimiento del indicador O4 para la atención de usuarios, en la casilla promedio de tiempo. La siguiente gráfica muestra el comportamiento en la prestación del servicio de Carro taller durante los últimos doce (12) meses.

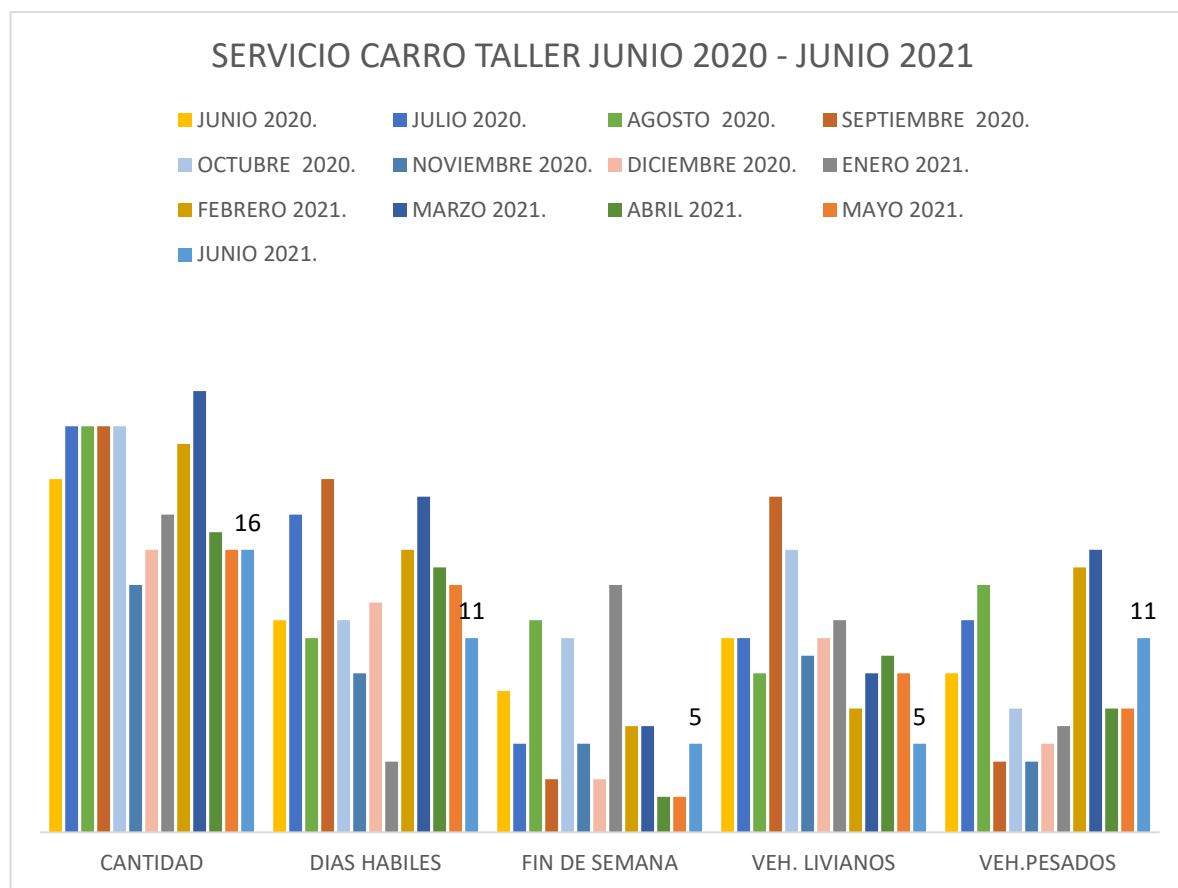

Grafica 10 Servicio Carro Taller acumulado a Junio de 2021

En la siguiente tabla se observa el registro histórico de los servicios de carro-taller en el corredor desde el inicio de la etapa Pre-operativa.


Tabla 129 Comportamiento de los servicios carro taller Junio 2021

COMPORTAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE OPERACIÓN - CARRO TALLER									
MES	PROMEDIOS DE TIEMPO		SERVICIOS		PROMEDIO DESPLAZ.	DISTRIBUCION		TIPO VEHICULO	
	TIEMPOS DE RESPUESTA	TIEMPOS DE ATENCION	CANT.	%		DIAS HABILES	FIN DE SEMANA	VEHICULOS LIVIANOS	VEHICULOS PESADOS
NOVIEMBRE 2014.	00:12:33	00:52:22	19	53%	11.35	14	5	13	6
DICIEMBRE 2014.	00:13:00	01:16:00	74	54%	15.26	60	14	58	16
ENERO 2015.	00:18:00	01:01:00	95	54%	17.24	77	18	68	27
FEBRERO 2015.	00:17:34	01:46:12	66	49%	12.55	46	20	51	15
MARZO 2015.	00:40:38	01:01:45	64	47%	13.06	45	19	55	9
ABRIL 2015.	00:40:38	01:01:45	48	41%	17.70	35	13	33	15
MAYO 2015.	00:40:38	01:01:45	65	44%	10.20	44	21	43	22

COMPORTAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE OPERACIÓN - CARRO TALLER									
MES	PROMEDIOS DE TIEMPO		SERVICIOS		PROMEDIO DESPLAZ.	DISTRIBUCION		TIPO VEHICULO	
	TIEMPOS DE RESPUESTA	TIEMPOS DE ATENCION	CANT.	%		DIAS HABILES	FIN DE SEMANA	VEHICULOS LIVIANOS	VEHICULOS PESADOS
JUNIO 2015.	00:40:38	01:01:45	65	37%	15.30	39	26	53	12
JULIO 2015.	00:40:38	01:01:45	62	33%	13.37	48	14	42	20
AGOSTO 2015.	00:40:38	01:01:45	73	32%	12.87	47	26	50	23
SEPTIEMBRE 2015.	00:40:38	01:01:45	54	30%	13.61	35	19	34	20
OCTUBRE 2015.	00:40:38	01:01:45	63	30%	12.01	41	22	41	22
NOVIEMBRE 2015.	00:40:38	01:01:45	51	24%	13.70	32	19	39	12
DICIEMBRE 2015.	00:40:38	01:01:45	75	32%	25.60	48	27	40	35
ENERO 2016.	00:40:38	01:01:45	89	30%	25.90	56	33	55	34
FEBRERO 2016.	00:25:59	01:11:58	51	24%	36.38	37	14	6	45
MARZO 2016.	00:16:25	01:04:42	75	27%	17.23	46	29	9	66
ABRIL 2016.	00:16:49	01:18:41	83	32%	9.88	59	24	50	33
MAYO 2016.	00:14:19	01:50:30	81	33%	8.62	49	32	39	42
JUNIO 2016.	00:16:47	01:21:18	83	36%	12.48	53	30	51	32
JULIO 2016.	00:15:33	01:15:21	75	33%	12.37	41	34	49	26
AGOSTO 2016.	00:16:16	01:10:25	70	28%	10.34	44	26	43	27
SEPTIEMBRE 2016.	00:14:43	01:06:13	86	35%	12.75	62	24	49	37
OCTUBRE 2016.	00:14:47	00:51:51	101	41%	15.42	67	34	61	40
NOVIEMBRE 2016.	00:14:34	01:03:48	82	35%	10.33	63	19	47	35
DICIEMBRE 2016.	00:18:35	01:06:13	74	32%	11.94	51	23	43	31
ENERO 2017.	00:33:57	01:12:52	106	37%	14.64	79	27	72	34
FEBRERO 2017.	00:15:44	01:05:13	64	32%	13.75	52	12	39	25
MARZO 2017.	00:15:22	01:26:34	56	28%	14.13	34	22	33	23
ABRIL 2017.	00:16:21	01:16:56	71	33%	10.43	25	46	31	40
MAYO 2017.	00:15:23	01:10:51	52	26%	7.72	36	16	30	22
JUNIO 2017.	00:15:57	01:11:32	66	32%	9.53	51	15	37	29
JULIO 2017.	00:18:17	01:26:41	71	33%	9.45	47	24	43	28
AGOSTO 2017.	00:40:48	01:12:21	60	30%	9.36	43	17	28	32
SEPTIEMBRE 2017.	02:19:50	01:13:05	58	30%	9.00	43	15	23	35
OCTUBRE 2017.	00:15:57	01:31:37	71	36%	13.64	55	16	35	36
NOVIEMBRE 2017.	00:14:57	00:56:58	55	33%	13.93	43	12	34	21
DICIEMBRE 2017.	00:12:15	01:47:52	86	38%	12.54	54	32	48	38
ENERO 2018.	00:09:54	01:19:03	74	32%	6.97	55	19	45	29
FEBRERO 2018.	00:13:38	01:33:02	57	33%	9.02	39	18	36	21
MARZO 2018.	00:08:44	01:12:43	54	29%	6.27	34	20	34	20

COMPORTAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE OPERACIÓN - CARRO TALLER									
MES	PROMEDIOS DE TIEMPO		SERVICIOS		PROMEDIO DESPLAZ.	DISTRIBUCION		TIPO VEHICULO	
	TIEMPOS DE RESPUESTA	TIEMPOS DE ATENCION	CANT.	%		DIAS HABILES	FIN DE SEMANA	VEHICULOS LIVIANOS	VEHICULOS PESADOS
ABRIL 2018.	00:10:56	01:22:24	60	33%	6.53	38	22	22	38
MAYO 2018.	00:12:18	01:27:40	60	29%	8.22	38	22	30	30
JUNIO 2018.	00:09:34	01:30:58	57	32%	5.61	46	11	30	27
JULIO 2018.	00:09:40	01:07:35	68	33%	5.38	44	24	41	27
AGOSTO 2018.	00:09:40	01:15:10	42	31%	6.25	31	11	23	19
SEPTIEMBRE 2018.	00:08:54	02:06:14	40	30%	6.52	30	10	25	15
OCTUBRE 2018.	00:10:44	01:31:27	42	26%	7.78	35	7	21	21
NOVIEMBRE 2018.	00:10:43	01:46:34	35	27%	11.82	24	11	13	22
DICIEMBRE 2018.	00:08:44	01:14:34	46	24%	12.26	36	10	18	28
ENERO 2019.	00:12:00	01:23:47	37	21%	14.00	19	18	22	15
FEBRERO 2019.	00:09:14	01:54:05	44	0%	7.80	32	12	21	23
MARZO 2019.	00:07:35	01:33:58	24	0%	9.69	17	7	10	14
ABRIL 2019.	00:06:31	01:16:37	21	15%	11.56	12	9	16	5
MAYO 2019.	00:11:00	01:19:33	20	17%	4.60	12	8	6	14
JUNIO 2019.	00:12:36	01:38:02	32	21%	8.39	22	10	12	20
JULIO 2019.	00:07:23	01:22:40	42	25%	11.99	28	14	22	20
AGOSTO 2019.	00:09:34	01:38:41	25	16%	6.50	18	7	15	10
SEPTIEMBRE 2019.	0:12:27	1:34:33	20	15%	0.47	16	4	11	9
OCTUBRE 2019.	0:09:57	2:21:55	24	15%	8.41	16	8	12	12
NOVIEMBRE 2019.	00:02:20	01:23:32	15	13%	1.54	12	3	6	9
DICIEMBRE 2019.	00:09:30	01:19:43	14	9%	11.94	8	6	6	8
ENERO 2020.	00:13:47	01:26:03	23	15%	14.45	17	6	18	5
FEBRERO 2020.	00:08:12	01:07:32	26	21%	6.83	15	11	2	24
MARZO 2020.	00:07:46	02:05:07	17	17%	6.74	15	2	6	11
ABRIL 2020.	1:40:00	3:17:48	10	21%	5,43	7	3	6	4
MAYO 2020.	00:07:04	01:45:11	17	0%	8.02	11	6	6	11
JUNIO 2020.	00:07:36	03:25:30	20	22%	9.44	12	8	11	9
JULIO 2020.	00:04:16	01:32:26	23	23%	21.04	18	5	11	12
AGOSTO 2020.	00:02:34	03:44:16	23	25%	25.88	11	12	9	14
SEPTIEMBRE 2020.	00:07:00	03:32:34	23	21%	3.13	20	3	19	4
OCTUBRE 2020.	00:04:03	01:40:18	23	15%	3.87	12	11	16	7
NOVIEMBRE 2020.	00:05:39	01:28:34	14	10%	7.01	9	5	10	4
DICIEMBRE 2020.	00:06:11	03:43:15	16	11%	6.48	13	3	11	5

COMPORTAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE OPERACIÓN - CARRO TALLER									
MES	PROMEDIOS DE TIEMPO		SERVICIOS		PROMEDIO DESPLAZ.	DISTRIBUCION		TIPO VEHICULO	
	TIEMPOS DE RESPUESTA	TIEMPOS DE ATENCION	CANT.	%		DIAS HABILES	FIN DE SEMANA	VEHICULOS LIVIANOS	VEHICULOS PESADOS
ENERO 2021.	00:09:30	01:52:53	18	11%	7,80	4	14	12	6
FEBRERO 2021.	00:08:25	03:12:55	22	17%	8.60	16	6	7	15
MARZO 2021.	00:05:29	02:21:00	25	18%	8.44	19	6	9	16
ABRIL 2021.	0:22:17	0:48:43	97	0%	12,27	65	32	78	19
MAYO 2021.	00:08:25	01:56:00	16	14%	5.85	14	2	9	7
JUNIO 2021.	00:06:53	02:47:07	16	15%	5.94	11	5	5	11

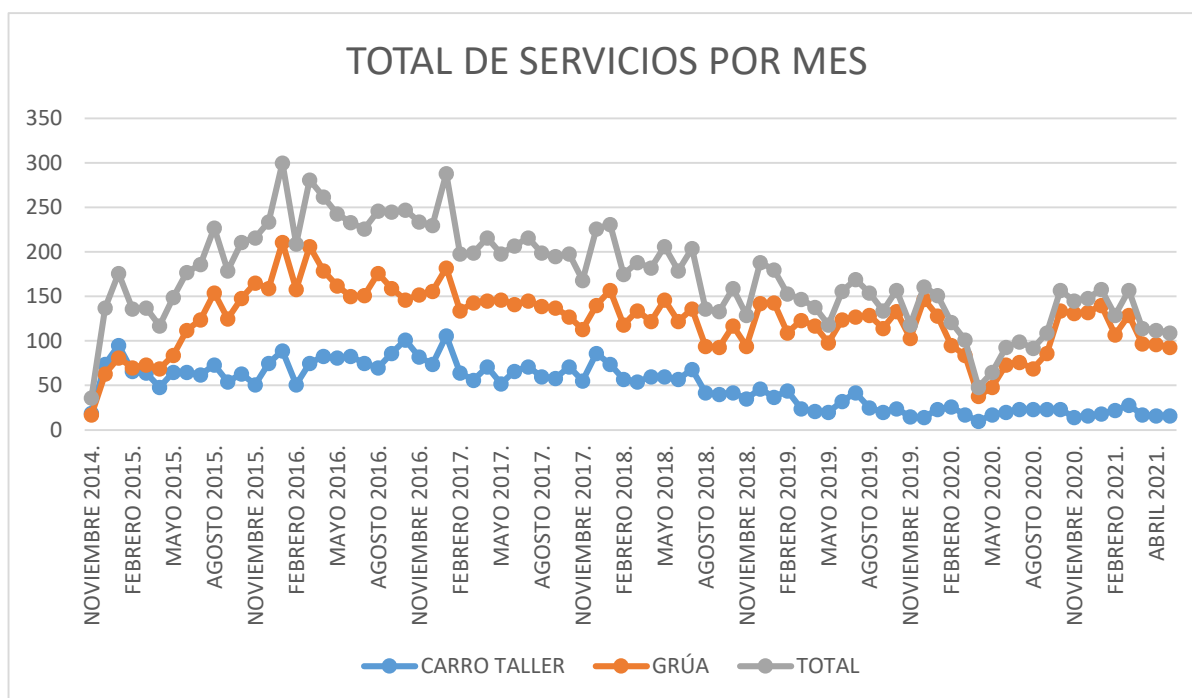

Grafica 11 Total de Servicios por Mes acumulado a Junio 2021

2.6.6 CARGAS EXTRA - DIMENSIONADAS Y/O EXTRA – PESADAS

Se han venido llevando a cabo controles en conjunto con la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, a las cargas extra-dimensionadas que transitan por el corredor vial, especialmente en el sector comprendido entre Puerto Salgar y Puerto Bogotá. Una vez es recibida la documentación enviada por las empresas transportadoras vía correo electrónico, se procede a verificar la información enviada y registrarla en la base de datos de paso de cargas extra-dimensionadas y extra-pesadas. Se verifica el tipo de carga y sus dimensiones y la documentación general de los vehículos. Una vez la carga ingresa al

corredor vial, se lleva a cabo la verificación documental en los puestos de control de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, así como la verificación de las medidas de la carga para corroborar lo expresado en los documentos recibidos.

Se advierte a las empresas transportadoras lo siguiente:

- ❖ Se deberá informar al CCO como mínimo con cuatro (4) horas hábiles de antelación al inicio del paso por el corredor vial concesionado asignado a la Concesión Alto Magdalena, el cual corresponde al paso por la ruta 4508 entre el PR00+000 (Girardot) al PR87+000 (Cambao), ruta 4509 entre el PR00+000 (Cambao) al PR38+400 (Cruce Río Seco), ruta 5008 entre el PR00+000 (Puerto Bogotá) y el PR05+800 (Cruce Río Seco), por la ruta 4510 entre el PR00+000 (Honda) y el PR30+000 (La Dorada) y ruta 45CLA entre el PR30+000 al PR33+400 (Puente Puerto Salgar – La Dorada costado sur, inicio Variante La Dorada) y viceversa.
- ❖ En ningún caso el personal encargado de controlar el tráfico, que se desplace con la carga podrá cerrar la vía, en caso de requerirlo por alguna maniobra especial del vehículo, deberá comunicarse con el CCO a los números 3219738507 o 3219740979, donde solicitará la asistencia de una patrulla de la policía y de un inspector vial, pues serán los encargados de evaluar y hacer seguimiento ante un posible cierre de la vía para realizar la maniobra requerida.

En la siguiente tabla se muestra el REGISTRO PASO CARGAS EXTRADIMENSIONADAS Y/O EXTRAPESADAS, se observa el seguimiento y registró realizado durante el mes de Junio 2021

Tabla 130 Registro de Cargas extra dimensionadas y extrapesadas.

EMPRESA	FECHA SOLICITUD	PLACAS VEHICULO	PLACAS REMOLQUE	RESOLUCIÓN	TIPO DE VEHICULO	DESCRIPCION CARGA	PESO TOTAL (KG)	DIMENSIONES CARGA			OBSERVACIONES
								ALTO (m)	ANCHO (m)	LONGITUD (m)	
MAQUIPETROL	31/05/2021	WFI015	S-51227	RESOLUCIÓN N° 003129 DE 11 DIC-2020	REMOLQUE	PILOTEADORA	62,350	4.30	3.85	11.00	FALTA POLIZA Y DOC CONDUCTOR PERO DICE APROBADA
ADDEC S.A.S	31/05/2021	YHK528	R-55491	RESOLUCIÓN N° 1537 DE 14 JUL-2020	REMOLQUE	BODEGA ELECTRICISTA	43,600	4.30	3.24		DOCUMENTACIÓN COMPLETA
ADDEC S.A.S	31/05/2021	YHK514	R-60131	RESOLUCIÓN N° 1537 DE 14 JUL-2020	REMOLQUE	TRABAJADERO TK DIÉSEL	39,000	4.40	3.00		DOCUMENTACIÓN COMPLETA
TRANSPORTES PRADA B S.A.S	31/05/2021	SXU684		PERMISO N° 0129199	CAMABAJA	EXCAVADORA	40,000	4.20	3.15	18.00	DOCUMENTACIÓN COMPLETA
MABA INVERSIONES	31/05/2021	SZW173		RESOLUCIÓN N° 003379 DE 23 DIC-2020		GENERADOR	50,000	4.70	3.10	12.60	DOCUMENTACIÓN COMPLETA
MABA INVERSIONES	02/06/2021	SZW173		RESOLUCIÓN N° 003379 DE 23 DIC-2020	CAMABAJA		50,000	4.40	3.10	12.60	DOCUMENTACIÓN COMPLETA

EMPRESA	FECHA SOLICITUD	PLACAS VEHICULO	PLACAS REMOLQUE	RESOLUCIÓN	TIPO DE VEHICULO	DESCRIPCION CARGA	PESO TOTAL (KG)	DIMENSIONES CARGA			OBSERVACIONES
								ALTO (m)	ANCHO (m)	LONGITUD (m)	
SERVIGRUAS DAVAL S.A.S	04/06/2021	EQO842		PERMISO N° 0129471			16,000	4.40	3.20	12.10	FALTA POLIZA, DOCUMENTOS CONDUCTOR Y DOCUMENTOS VEHICULO.
SERVIGRUAS DAVAL S.A.S	04/06/2021	EQO842		PERMISO N° 0129471, MANIFIESTO ELECTRÓNICO N° 80490	CAMIÓN GRÚA	FINISHER PAVIMENTADORA	16,000	4.40	3.20	12.10	FALTA POLIZA
GLOBAL DE LOGISTICA Y TRANSPORTES GLT S.A.S	11/06/2021	SXU925	S-50720	RESOLUCIÓN N° 000388 DE 18 FEB-2021	SEMIREMOLQUE	BANDAS TRANSPORTADORAS	40,000	4.40	3.25	20.00	FALTA MAPA
GLOBAL DE LOGISTICA Y TRANSPORTES GLT S.A.S	11/06/2021	XVN412	S-09016	RESOLUCIÓN N° 000388 DE 18 FEB-2021	SEMIREMOLQUE	ENGANCHE	49,000	4.20	3.60	24.5	FALTA MAPA
GLOBAL DE LOGISTICA Y TRANSPORTES GLT S.A.S	11/06/2021	WLR854	S-48985		CAMABAJA	SKID CON MOTOR Y GENERADOR	47,000	3.60	3.10	12.00	DOCUMENTACIÓN COMPLETA
JUAN JOSE FARFAN ALVAREZ	21/06/2021	SYS807	S-52371	PERMISO N° 0126998	CAMABAJA	RETROEXCAVADORA 340	52,000	4.35	3.20	12.00	DOCUMENTACIÓN COMPLETA

EMPRESA	FECHA SOLICITUD	PLACAS VEHICULO	PLACAS REMOLQUE	RESOLUCIÓN	TIPO DE VEHICULO	DESCRIPCION CARGA	PESO TOTAL (KG)	DIMENSIONES CARGA			OBSERVACIONES
								ALTO (m)	ANCHO (m)	LONGITUD (m)	
JUAN JOSE FARFAN ALVAREZ	21/06/2021	SYS807	S-52371	PERMISO N° 0129698	REMOLQUE	RETROEXCAVADORA 340	52,000	4.35	3.20	12.00	DOCUMENTACIÓN COMPLETA
CENTRAL	24/06/2021	T-3788	N.A	PERMISO N° 0125885	CAMIÓN GRÚA	N.A	48,100	3.99	2.75	15.00	FALTA DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR, DEL VEHÍCULO Y POLIZA.
CENTRAL	24/06/2021	WCU036	N.A	PERMISO N° 0125887	CAMIÓN GRÚA		36,300	3.65	2.55	13.50	FALTA DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR, DEL VEHÍCULO Y POLIZA.
JUAN JOSE FARFAN ALVAREZ	24/06/2021	SRN745	S-49305	PERMISO N° 0129695	REMOLQUE	DOS CASSETAS	39,000	4.20	3.55	10.00	DOCUMENTACIÓN COMPLETA
JUAN JOSE FARFAN ALVAREZ	24/06/2021	SIS180	R-00966	PERMISO N° 0129705	CAMABAJA	DOS CASSETAS	39,000	4.20	3.55	10	DOCUMENTACIÓN COMPLETA
JUAN JOSE FARFAN ALVAREZ	24/06/2021	SJP934	S-52333	PERMISO N° 0129697	REMOLQUE	DOS CASSETAS	39,000	4.20	3.55	10	DOCUMENTACIÓN COMPLETA
AGREGADOS TETUÁN	24/06/2021	WCO409	S-59621	RESOLUCIÓN N° 001451 DE 08 JUN-2021	SEMIREMOLQUE	BULDOCER D8T	60,488	4.40	3.10	21.40	DOCUMENTACIÓN COMPLETA

EMPRESA	FECHA SOLICITUD	PLACAS VEHICULO	PLACAS REMOLQUE	RESOLUCIÓN	TIPO DE VEHICULO	DESCRIPCION CARGA	PESO TOTAL (KG)	DIMENSIONES CARGA			OBSERVACIONES
								ALTO (m)	ANCHO (m)	LONGITUD (m)	
	28/06/2021	WCT715	R-61681	RESOLUCIÓN N° 001214 DEL 12 MAY-2021	TRÁILER	MAQUINARIA	40,000	4.20	3.30	6.0	DOCUMENTACIÓN COMPLETA
MOVIL PETROL	28/06/2021	WOM164	S-68425	PERMISO N° 0120245	REMOLQUE	EQUIPO PETROLERO	31,000	3.10	2.90	3.10	DOCUMENTACIÓN COMPLETA
MOVIL PETROL	28/06/2021	XJA151	S-07234		REMOLQUE	EQUIPO PETROLERO UNIDAD BÁSICA	50,000	4.10	2.90	16.00	DOCUMENTACIÓN COMPLETA
MOVIL PETROL	28/06/2021	SWN595	S-59767	PERMISO N° 0130267	TRÁILER	EQUIPO PETROLERO SUB-ESTRUCTURA	31,000	4.20	3.27	10.00	FALTA PÓLIZA

3 CONCLUSIONES

3.1 Ambito Social:

- A la fecha se vienen ejecutando actividades en cada uno de los programas del Plan de Gestión Social Contractual.
- A la fecha se viene implementado el protocolo de Atención al Usuario, a través de las oficinas de Atención al Usuario por medios virtuales.
- La atención a la comunidad se viene realizando a través de la oficina principal de atención al usuario, las oficinas satélites y las dos oficinas móviles en el horario establecido contractualmente. A mediados del mes se estableció sólo atención por medios virtuales con el objetivo de la prevención del virus COVID-19.
- Las oficinas móviles se han ubicado estratégicamente en cada uno de los municipios del área de influencia directa.
- Se lleva un control en la atención de las PQRS, logrando dar atención al 99% de las PQRS presentadas, el 1 % se encuentra dentro del plazo límite de atención.
- El 75% del personal vinculado al proyecto en junio pertenece al AID.
- La MONC contratada asciende a un 71%.
- Se ha venido cumpliendo con la publicación del boletín trimestral e igualmente Información de las novedades en el corredor vial a través de la página web.

3.2 Ambito Predial:

- El Concesionario continua trabajando en los ajustes de los insumos prediales impactados por ajustes en la línea de compra generados por modificaciones en el diseño, la modificación más reciente de la franja de utilidad pública, o por solicitudes de inclusión y/o exclusión de áreas remanentes entre otros; así mismo, sigue realizando reconocimientos de campo, consecución de información jurídico-catastral, certificados de uso de suelo, entre otros documentos que permitan avanzar en el proceso de gestión predial.
- Respecto a la estimación del costo de adquisición predial, el valor determinado con base en los datos registrados en la sábana predial, los cuales se vienen ajustando a medida que se van aprobado nuevos avalúos, se asume 20% en los valores totales de los avalúos comerciales, los cuales se discriminan mediante el cálculo del daño emergente y lucro cesante, total de construcciones, construcciones anexas, mejoras,

cultivos y especies y factores sociales el resultado de la proyección de costos de adquisición es de **COP \$ 51.573.399.311,77.**

- En atención a las observaciones de la interventoría el concesionario actualizo el costo estimado de la adquisición predial incluyendo la casilla de daño emergente (gastos notariales, beneficencia y registro) y se actualizo el valor de las compensaciones sociales
- Actualmente el concesionario está realizando el ejercicio de actualizar toda la información correspondiente a los predios adquiridos o folio ANI en OLYMPUS, se tiene destinado un personal para realizar estas funciones específicamente.

3.3 Ambito SST

- Durante el mes de junio de 2021, se desarrollan diferentes actividades encaminadas a la prevención de Accidentes y Enfermedades de Origen Laboral, especialmente a prevenir y mitigar el contagio del COVID-19.
- En el periodo, se presentó cuatro (4) eventos de accidentes laborales catalogados como leves que generaron 12 días de incapacidad.
- A cierre del mes de junio se presentó diecisiete casos por COVID-19.
- Se realizó implementación de tarjeta de reporte de actos y condiciones inseguras e impactos ambiental.
- Se continuó con la formación de la brigada de emergencia
- Se realizó simulacro en alturas.
- También es importante referir que en los diferentes frentes de obra se evidencia que se toman acciones correctivas y preventivas para mitigar y/o controlar los diferentes factores de riesgos que se puedan presentar en los procesos constructivos y para mitigar el contagio y la propagación del COVID-19. (Ver anexo 9)

4 ANEXOS

- ❖ *ANEXO 1 CERTIFICADOS DE CALIDAD JUNIO 2021*
- ❖ *ANEXO 2 INFORMES TECNICOS JUNIO 2021*
- ❖ *ANEXO 3 DESCRIPCION DE LOS ESTUDIOS REALIZADOS JUNIO 2021*
- ❖ *ANEXO 4 MATERIALES, ENSAYOS Y CONTROL DE CALIDAD JUNIO 2021*
- ❖ *ANEXO 5 ACCIDENTES JUNIO 2021*
